



COMUNE DI LIVORNO



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION

30 giugno 2026



DIREZIONE GENERALE
Ufficio Coordinamento e Monitoraggio Programmazioni Settoriali e PNRR

Sommario


Premessa	1
1. Gli interventi della Città.....	4
2. Stato di attuazione dei progetti al 30 giugno 2026	8
3. Andamento finanziario degli interventi PNRR.....	33
4. Interventi PNRR messi a terra nel Comune di Livorno e nel territorio provinciale e limitrofo tramite le società ed enti del G.A.P.	38
5. Dagli investimenti ai risultati: gli interventi conclusi e il valore pubblico prodotto.....	46
6. Attività di governance, monitoraggio e adeguamento finanziario	53
FATTI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2026	54

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1 – Suddivisione per Missioni</i>	<i>4</i>
<i>Tabella 2 – Suddivisione per Ministero titolare</i>	<i>5</i>
<i>Tabella 3 – Suddivisione per settore dell'Ente.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabella 4 – Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni</i>	<i>6</i>
<i>Tabella 5 – Andamento di cassa interventi - annualità 2021/2026</i>	<i>33</i>
 <i>Scheda – Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti.....</i>	 <i>32</i>

PREMESSA

Modello organizzativo del PNRR:

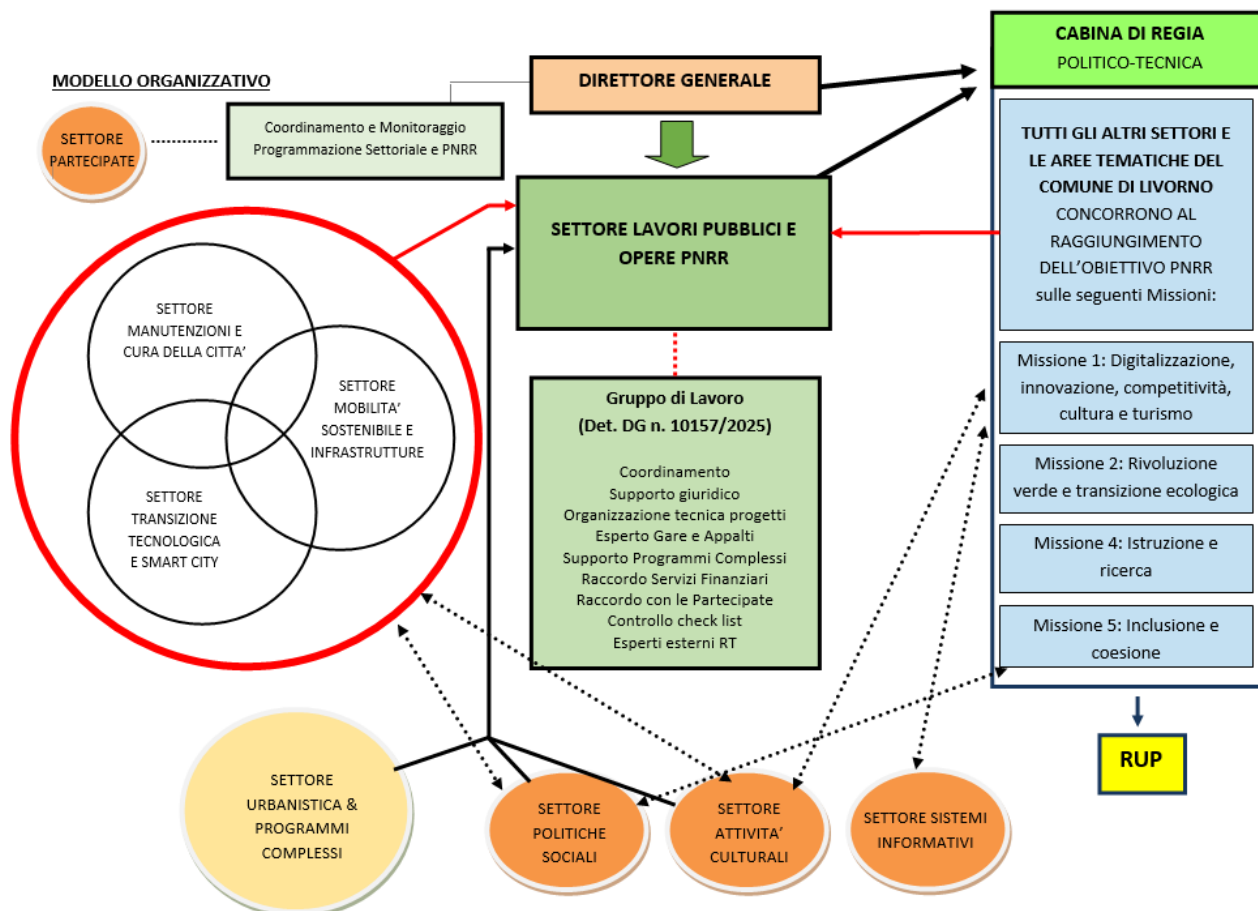

La relazione prende in considerazione gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Livorno sia in qualità di soggetto attuatore, e quindi direttamente beneficiario dei finanziamenti PNRR, sia come soggetto sub attuatore, aggiornandoli al **30 giugno 2026**.

I dati analizzati sono stati rilevati dal programma di contabilità dell'ente e dal sistema informativo "ReGiS" che rappresenta la piattaforma unica attraverso la quale le Amministrazioni devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal PNRR.

Si intende pertanto illustrare il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza per la città di Livorno e la sua attuazione, evidenziando i progressi compiuti nel suo complessivo avanzamento alla data del 30 giugno 2026, aggiornando anche la situazione finanziaria degli interventi PNRR, con riferimento alle risorse incassate in seguito all'erogazione da parte delle Amministrazioni titolari a titolo di anticipo e ai relativi pagamenti effettuati dall'ente.

Si ricorda infine che vi sono anche n. 16 interventi candidati dalle società e dagli enti appartenenti al Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) (in corso è subentrato un nuovo intervento di CASALP) che impattano sul territorio Comunale e provinciale, di cui è stata fatta specifica illustrazione nel precedente

numero di questa rivista e dei quali pubblichiamo qui un aggiornamento alla data del 30/06/2026. Il valore complessivo dei finanziamenti PNRR di tali opere ammonta ad € 42.806.328,11.

Il valore complessivo degli interventi nel territorio livornese, considerando sia quelli di cui il Comune è soggetto attuatore, che quelli del G.A.P., ammonta ad € 113.001.533,59.

.....

Legenda delle Misure PNRR aggiornata con l'aggiunta della Missione 7 (RePowerEU)

	LEGENDA	
PNRR	MISSIONE 1	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA
	MISSIONE 2	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
	MISSIONE 3	INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
	MISSIONE 4	ISTRUZIONE E RICERCA
	MISSIONE 5	COESIONE E INCLUSIONE
	MISSIONE 6	SALUTE
	MISSIONE 7	RePowerEU

Per far fronte alla crisi causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, l'Unione europea ha avviato un nuovo programma energetico. Si tratta del cosiddetto **RepowerEu**, entrato definitivamente in vigore con l'approvazione del regolamento 2023/435.

Il piano energetico europeo, da integrare nei Pnrr, prevede l'invio di risorse agli Stati membri per finanziare progetti sull'energia. Lo scopo, tra gli altri, è quello di ridurre al minimo la dipendenza europea dalle importazioni russe.

Per accedere ai fondi messi a disposizione, gli stati dovevano inserire un nuovo capitolo all'interno dei rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr).

La **Missione 7 RePowerEU** ha lo scopo di offrire un supporto al sistema produttivo per realizzare la transizione ecologica, per rafforzare le reti di distribuzione di energia, per accelerare la produzione da fonti rinnovabili, per aumentare l'efficienza energetica e creare competenze sul tema green nel settore pubblico e privato.

.....

Localizzazione interventi PNRR

Sul sito istituzionale della città di Livorno, all'interno della sezione PNRR-Next Generation, è possibile localizzare i vari interventi PNRR sul territorio della città sulla mappa pubblicata.

(Indirizzo web: https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/pnrr-next-generation-livorno-sintesi-e-stato-di-avanzamento)

30 GIUGNO 2026: DATA CONCLUSIVA DEL PNRR**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI: evidenza documentale richiesta per dimostrare il conseguimento del target**

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma PNRR del Comune di Livorno alla data del **30 giugno 2026**.

Il Programma si trova in una fase avanzata di attuazione: risultano conclusi gli interventi relativi alla trasformazione digitale, alla cultura e alla maggior parte delle misure sociali, mentre gli interventi infrastrutturali e di edilizia pubblica proseguono secondo i cronoprogrammi vigenti. Per alcuni investimenti le Amministrazioni titolari hanno disposto il differimento del termine di conclusione al mese di **agosto 2026**, mentre i più recenti interventi finanziati nel corso del 2025 seguono la naturale scadenza prevista al **31 dicembre 2026**. La relazione distingue pertanto gli interventi già conclusi da quelli ancora in corso di attuazione, rinviando al capitolo finale l'illustrazione dei risultati conseguiti e del Valore Pubblico generato dagli interventi completati.

<i>Area intervento</i>	<i>Interventi</i>	<i>Conclusi</i>	<i>In esecuzione</i>	<i>In progettazione</i>	<i>Note</i>
<i>Digitalizzazione</i>	15	14	1	-	Programma sostanzialmente concluso; un intervento in fase finale di completamento.
<i>Cultura</i>	1	1	-	-	Intervento concluso e operativo.
<i>Politiche sociali</i>	8	8	-	-	Interventi conclusi; per un investimento infrastrutturale collegato è prevista proroga al 24 agosto 2026.
<i>Istruzione</i>	8	-	6	2	Comprende interventi per cui è stata concessa la proroga del termine di conclusione e nuovi investimenti (n. 4) con termine dicembre 2026.
<i>Rigenerazione urbana</i>	1	-	1	-	Intervento in fase esecutiva; è stata concessa la proroga del termine di conclusione.
<i>Sport</i>	1	-	1	-	Intervento in fase esecutiva; è stata concessa la proroga del termine di conclusione.
<i>Qualità dell'abitare (PINQUA)</i>	5*	-	4	-	Interventi in fase esecutiva; per quattro opere è stata concessa la proroga del termine di conclusione.

* Comprende l'intervento del Parco Pertini per il quale è stata presentata e accettata la rinuncia di quota parte del finanziamento e dirottamento di quota parte delle risorse sul Pinqua Stazione

Interventi posticipati in seguito ad accoglimento dell'amministrazione titolare seguito delle istanze di proroga avanzata dagli enti attuatori o su iniziativa delle stesse amministrazioni titolari (MIT per PINQUA).

Ricostruzione Nido Pirandello **al 31/08/2026**

Nuovo impianto sportivo polivalente Scopaia al **31/08/2026**

Ampliamento Parco Baden Powell al **31/08/2026**

PINQUA riqualificazione isolato quartiere Stazione
 PINQUA Parcheggio del Corona
 PINQUA Rifunzionalizzazione Caserma Lamarmora
 PINQUA-CRAL e giochi d'acqua

al 14/08/2026

1. GLI INTERVENTI DELLA CITTÀ

La città di Livorno è attualmente soggetto attuatore di n. 39 interventi finanziati. Tali progetti sono suddivisi tra 3 Missioni, per un ammontare complessivo di risorse pari a **70.195.205,48 euro**.


Di questi:

€ 61.929.673,89 euro sono trasferimenti ministeriali PNRR (56.591.459,53 euro + 5.338.214,36 euro di FOI)
€ 8.265.531,59 costituiscono invece il cofinanziamento dell'ente.

Nella *Tabella 1* si riporta l'**ammontare complessivo delle opere, comprensivo sia dei finanziamenti ministeriali, sia delle risorse proprie dell'ente**, così come sono stati suddivisi su 3 missioni del PNRR. Come possiamo vedere, più della metà delle risorse, pari al 71,08% è allocato sulla Missione M5 "Inclusione e coesione", seguita dal 22,91% sulla Missione M4 "Istruzione e ricerca". La Missione M1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" riporta un incremento rispetto al precedente monitoraggio al 31 dicembre 2026, in quanto in tale Missione è stato ammesso a finanziamento un nuovo progetto.

Tabella 1 - Suddivisione per Missioni


Missione	Valore complessivo	Percentuale
M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'	4.222.065,56	6,01
M4 - ISTRUZIONE E RICERCA	16.080.000,00	22,91
M5 - INCLUSIONE E COESIONE	49.893.139,92	71,08
TOTALE	70.195.205,48	100,00

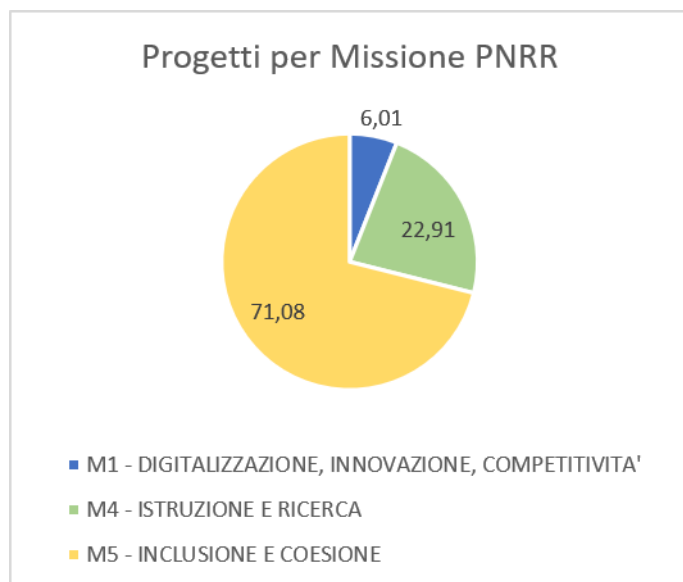

Nella *Tabella 2* si riporta l'**ammontare dei finanziamenti ministeriali PNRR**, suddiviso sulla base delle Amministrazioni titolari degli interventi. Possiamo vedere che il Comune di Livorno ha un maggior trasferimento di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 52,79%, seguito dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il 20,38% e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il 10,40%.

Tabella 2 - Suddivisione per Ministero titolare

Ministero	Finanziamenti PNRR	Percentuale
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	3.624.533,97	5,85
Cultura	500.000,00	0,81
Istruzione e del merito	12.621.000,00	20,38
Infrastrutture e Trasporti	32.692.663,11	52,79
PCM - Dipartimento Sport	3.850.000,00	6,22
Interno	2.200.000,00	3,55
Lavoro e Politiche sociali	6.441.476,81	10,40
Totale	61.929.673,89	100,00

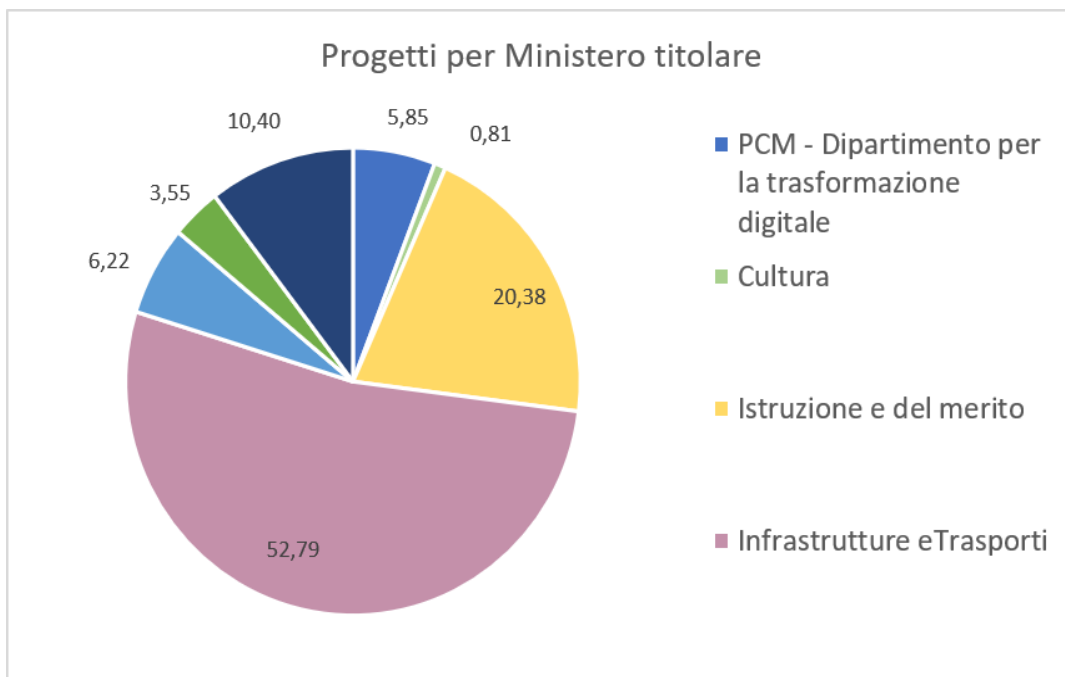

Nella *Tabella 3* si riporta l'ammontare del valore complessivo delle opere PNRR suddiviso sulla base dei settori dell'Ente, titolari degli interventi.

Tabella 3 - Suddivisione per settore dell'Ente

Settore	Risorse	Percentuale
Lavori pubblici e opere PNRR	59.361.663,11	84,54
Sistemi informativi	3.624.533,97	5,17
Attività culturali e musei	597.531,59	0,85
Politiche sociali e sociosanitarie	6.611.476,81	9,44
Transizione tecnologica e smart city	890.000,00	1,08
Totale	70.195.205,48	100,00

Settori comunali e PNRR

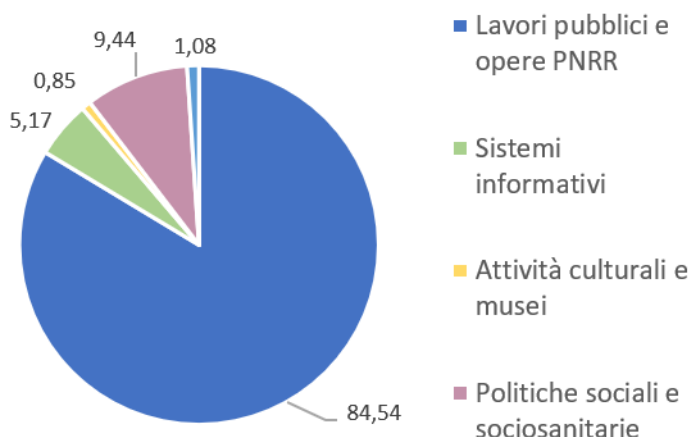


Tabella 4 – Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Dip. Trasformazione digitale	M1C1 I1.2	Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni	1.031.574,00	-	1.031.574,00	1,47
	M1C1 I1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni	203.435,00	-	203.435,00	0,29
	M1C1 I1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati - Archivio Nazionale dei Numeri	73.190,48	-	73.190,48	0,10
	M1C1 I1.4.1	Servizi e cittadinanza digitale	516.323,00	-	516.323,00	0,74
	M1C1 I1.4.3	Adozione piattaforma PAGOPA	112.627,00	-	112.627,00	0,16
	M1C1 I1.4.3	Adozione "App IO" Comuni	54.950,00	-	54.950,00	0,08
	M1C1 I1.4.5	Piattaforma notifiche digitali Comuni	69.000,00	-	69.000,00	0,10
	M1C1 I1.7.2	Centri di facilitazione digitale	30.000,00	-	30.000,00	0,04
	M1C1 I1.4.2	Citizen Inclusion - Miglioramento accessibilità servizi pubblici digitali	234.000,00	-	234.000,00	0,33
	M1C1 I1.5	Cybersecurity	978.000,00	-	978.000,00	1,39
	M1C1 I2.2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni	54.482,39	-	54.482,39	0,08
	M1C1 I2.2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Enti terzi - Comuni	53.011,00	-	53.011,00	0,08
	M1C1 I1.4.4	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)- Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	19.642,00	-	19.642,00	0,03
	M1C1 I2.2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni	65.467,10	-	65.467,10	0,09
	M1C1 I2.3.2	Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	128.832,00	-	128.832,00	0,18
Totale			3.624.533,97	-	3.624.533,97	5,16
CULTURA E TURISMO						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Cultura	M1C3 I1.2	Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori	500.000,00	97.531,59	597.531,59	0,85
ISTRUZIONE E RICERCA						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Istruzione e merito	M4C1 I1.1	Rifunionalizzazione Scuola infanzia Via Poerio come Centro polifunzionale per la famiglia	2.170.000,00	-	2.170.000,00	3,09
	M4C1 I1.1	Asilo nido Pirandello, Via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture	1.896.000,00	944.000,00	2.840.000,00	4,05
	M4C1 I3.3	Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino	5.280.000,00	-	5.280.000,00	7,52
	M4C1 I3.3	Nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero	2.520.000,00	2.380.000,00	4.900.000,00	6,98
	M4C1 I3.3	Scuola secondaria I° grado Michelangelo - Adeguamento palestra	185.000,00	-	185.000,00	0,26
	M4C1 I3.3	Scuola secondaria I° grado San Gaetano - Adeguamento antincendio	170.000,00	-	170.000,00	
	M4C1 I3.3	Adeguamento palestra scolastica Lambruschini	200.000,00	55.000,00	255.000,00	
	M4C1 I3.3	Adeguamento antincendio scuola primaria e secondaria Razzauti Gamerra	200.000,00	80.000,00	280.000,00	
	Totale		12.621.000,00	3.459.000,00	16.080.000,00	22,91

INCLUSIONE E COESIONE						
Ministero	Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA)					
Infrastrutture e trasporti	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
	MSC2 I2.3	Cisternone - riqualificazione quartiere Stazione	13.195.999,87	960.000,00	14.155.999,87	20,21
	MSC2 I2.3	Cisternone - riqualificazione parco Pertini	2.639.722,46	-	2.639.722,46	3,77
	MSC2 I2.3	Cisternone - parcheggio Del Corona	1.323.654,46	-	1.323.654,46	1,89
	MSC2 I2.3	Dogana d'Acqua - Caserma Lamarmora, recupero e rifunzionalizzazione	10.276.702,63	2.000.000,00	12.276.702,63	17,52
	MSC2 I2.3	Dogana d'Acqua - edificio polifunzionale CRAL e giochi d'acqua	5.256.583,69	400.000,00	5.656.583,69	8,07
		Totale PINQuA	32.692.663,11	3.360.000,00	36.052.663,11	51,46
Interno	Progetti di rigenerazione urbana					
	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse		
	MSC2 I2.1	Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell	2.200.000,00	-	2.200.000,00	3,14
	Sport e inclusione sociale					
PCM Dip. Sport	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
	MSC2 I3.1	Nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia	3.850.000,00	1.179.000,00	5.029.000,00	7,18
	Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore					
Lavoro e Politiche sociali	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
	MSC2 I1.1.1	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità	211.500,00	-	211.500,00	0,30
	MSC2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00	-	715.000,00	1,02
	MSC2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità A.U.S.L.	715.000,00	-	715.000,00	1,02
	MSC2 I1.1.2	Interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti	2.460.000,00	170.000,00	2.630.000,00	3,75
	MSC2 I1.1.3	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione A.U.S.L.	330.000,00	-	330.000,00	0,47
	MSC2 I1.1.4	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	209.976,81	-	209.976,81	0,30
	MSC2 I1.3.1	Povertà estrema - Housing first	710.000,00	-	710.000,00	1,01
	MSC2 I1.3	Povertà estrema – Stazioni di posta	1.090.000,00	-	1.090.000,00	1,56
		Totale Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore	6.441.476,81	170.000,00	6.611.476,81	9,44
	Totale	45.184.139,92	4.709.000,00	49.893.139,92	71,21	

Tabella di sintesi	Importo PNRR	Altre risorse	Valore complessivo	Percentuale
M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'	4.124.533,97	97.531,59	4.222.065,56	6,01
M4 - ISTRUZIONE E RICERCA	12.621.000,00	3.459.000,00	16.080.000,00	22,91
M5 - INCLUSIONE E COESIONE	45.184.139,92	4.709.000,00	49.893.139,92	71,08
di cui			-	
Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA)	32.692.663,11	3.360.000,00	36.052.663,11	51,46
Progetti di rigenerazione urbana	2.200.000,00	-	2.200.000,00	3,14
Sport e inclusione sociale	3.850.000,00	1.179.000,00	5.029.000,00	7,18
Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore	6.441.476,81	170.000,00	6.611.476,81	9,44
TOTALE	61.929.673,89	8.265.531,59	70.195.205,48	100,00

Come possiamo vedere la maggiore parte delle risorse PNRR è concentrata nella Missione dell'Inclusione e coesione, che incide per il 71,08% sul totale delle risorse PNRR; al suo interno la percentuale più alta è quella relativa al Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA), che incide per il 51,46% sull'importo totale delle risorse PNRR.

Il 22,91% delle risorse PNRR è invece utilizzato per il potenziamento dell'Offerta dei Servizi di Istruzione.

Si nota poi un incremento del totale degli interventi relativi alla Digitalizzazione (6,01%), in quanto in tale Missione è stato ammesso a finanziamento un nuovo progetto.

2. STATO ANALITICO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AL 30 GIUGNO 2026

M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

C1 – Digitalizzazione, innovazione, e sicurezza nella PA

Settore Sistemi Informativi

M1C1I1.4.3 Adozione "App IO" Comuni

CUP J41F22001020001

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 54.950,00

Scadenza del progetto prorogata al 1° ottobre 2024

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 253 del 16/01/2023) Ditta: Partners Associates advanced business solutions - P.A. ABS

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato **€ 54.950,00** ✓

M1C1I1.4.3 Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni

CUP J41C22000930006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.031.574,00

Scadenza progetto 25 febbraio 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 5900 del 03/08/2023) Ditta: Municipia Spa

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato **€1.031.574,00** ✓

M1C1I1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale

CUP J41F22004150006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 516.323,00

Scadenza progetto 1° aprile 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 9820 del 14/12/2023) Ditta: Ditta Maggioli

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato **€ 516.323,00** ✓

M1C1I1.4.5 Piattaforma notifiche digitali Comuni

CUP J41F22004350006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 69.000,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 1801 del 17/03/2023) Ditta: Maggioli Spa

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato **€ 69.000,00** ✓

M1C1I1.4.3 Adozione piattaforma PAGOPA**CUP J41F22002200006**

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 112.627,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di integrazione software (det. 8703 del 21/12/2022)

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 112.627,00 ✓

M1C1I1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni**CUP J51F22009470006**

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 203.435,00

Scadenza progetto 5 novembre 2024

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di implementazione di API (det. 3932 del 09/05/2024)

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 203.435,00 ✓

M1C1I1.7.2 Centri di facilitazione digitale**CUP J49I23000730006**

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 30.000,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento realizzazione attività mediante coprogettazione (det. n. 7857 del 17/10/2023) Ditta: Cooperativa sociale CESDI Onlus

Stato di attuazione

Progetto completato, in attesa della riscossione del saldo. Anticipo riscosso al momento € 12.000,00 ✓

M1C1I1.4.2 Citizen Inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali**CUP J54F24001460006**

Soggetto attuatore: Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

Soggetto sub attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 234.000,00

Scadenza progetto 30 aprile 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di formazione (det. 9099 del 24/10/2024) Ditta: Cooperativa Sociale Quid

Affidamento servizio di riduzione tipologie di errore servizio mense scolastiche (det. n. 10645 del 12/12/2024) Ditta: Maggioli SPA

Adesione del Comune di Livorno al "Accordo quadro per l'affidamento dei "Servizi e prestazioni inerenti la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SaaS tramite Sistema CloudToscana – SCT, del Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e WebApp, di Regione Toscana – Giunta Regionale e degli Enti del territorio regionale" (det. n. 11121 del 20/12/2024) Ditta: T.A.I. Software Solution S.r.l

Affidamento per fornitura di tecnologie assistive hardware (det. n. 2185 del 24/03/2025) Ditta: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

Stato di attuazione

Progetto completato, in attesa di riscossione contributo 

M1C1I1.5 Cybersecurity

CUP J46G24000020006

Soggetto attuatore: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

Soggetto sub attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 978.000,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di backup ambiente Microsoft O365 antispam e archiviazione mail (det. n. 10809 del 16/12/2024) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento della fornitura di apparecchiature informatiche per la realizzazione di un sito di Disaster Recovery (det. n. 10981 del 19/12/2024) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento del servizio di estensione della protezione mediante XDR/MDR Patching e Identity (det. n. 1382 del 24/02/2025) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento per la fornitura del servizio di segmentazione della rete e endpoint central manage engine (det. n. 2021 del 18/03/2025) Ditta: Sokom S.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio di formazione in ambito di sicurezza informatica (det. n. 2425 del 01/04/2025) Ditta: Omniconnect s.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio MFA, WAF, SIEM e IRT (det. n. 2426 del 01/04/2025) Ditta: Sokom srl

Affidamento per la fornitura del servizio di formazione del personale addetto alla gestione della sicurezza (det. n. 3215 del 28/04/2025) Ditta: Digital Thinks s.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio di formazione in ambito di sicurezza informatica (det. n. 3482 del 08/05/2025) Ditta: Pentaqo s.r.l.

Affidamento fornitura del "Servizio di formazione in sicurezza informatica relativamente al database PostgreSQL" (det. n. 5263 del 03/07/2025) Ditta Nobleprog Italia S.R.L.

Affidamento del servizio di Analisi e progettazione di un piano di Disaster Recovery e-Business Continuity Ditta Omniconnect srl (det. n. 7788 del 02/10/2025)

Affidamento della fornitura del servizio di formazione relativamente al Firewall Fortinet Ditta Sokom S.R.L. (det. n. 8190 del 16/10/2025)

Affidamento della fornitura del "servizio di formazione finalizzato allo sviluppo di competenze in Project Management e nella reingegnerizzazione dei processi con particolare attenzione agli aspetti di cybersecurity" (det. n. 8328 del 21/10/2025) Ditta Dgroove S.r.l.

Affidato servizio formazione per sviluppo di competenze in project management e nella reingegnerizzazione dei processi con particolare attenzione agli aspetti di cybersecurity (det. n. 8981 del 10/11/2025)

Stato di attuazione

Progetto completato, in attesa della riscossione del saldo. Anticipo riscosso al momento € 97.800,00 

M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni

CUP J41F24000280006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 54.482,39

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di adeguamento funzionale della componente backoffice della piattaforma tecnologica SUAP (det. n. 3952 del 21/05/2025) Ditta: PA ABS srl

Stato di attuazione

Progetto completato e asseverato. In attesa della riscossione contributo 

M1C1I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)

CUP J51F24003770006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 19.642,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio: determina n. 2927 del 15/04/2025. Ditta: Municipia spa

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato **€ 19.642,00** 

M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) – ENTI TERZI – Comuni

CUP J41F25000410006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 53.011,00

Scadenza progetto

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di Adeguamento funzionale delle componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche SUAP (det. n. 7098 del 11/09/2025) Ditta PA ABS srl

Stato di attuazione

Progetto completato e asseverato. In attesa della riscossione contributo 

M1C1I1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati – Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU)

CUP J51J25003190006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 73.190,48

Scadenza progetto 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidato la fornitura del servizio di georeferenziazione dei civici presenti in ANNCSU (det. n. 455 del 22/01/2026) Ditta LDP Progetti Gis S.r.l

Stato di attuazione

Progetto completato e asseverato. In attesa della riscossione contributo 

M1C1I2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - Adeguamento delle piattaforme SUE – Comuni

CUP J51F25002640006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 65.467,10

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di adeguamento funzionale delle componenti backoffice SUE (det. n. 1676 del 05/03/2026) Ditta PA ABS srl

Stato di attuazione

Progetto completato. In attesa della riscossione contributo 

M1C1I2.3.2 Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro

CUP J41C26000130006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 128.832,00

Scadenza progetto 27/07/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto dell'adeguamento funzionale per la gestione del personale, integrati nell'ecosistema Sicraweb/J-Pers con gli e-service PDND (det n. 4534 del 03/06/2026) Ditta Maggioli

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

Al 16/07/2026 il progetto si è concluso, con richiesta di liquidazione del contributo

C3 – Turismo e cultura

Settore Attività culturali, turismo, musei e fondazioni.

M1C3I1.2 Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori

CUP J47B23000000001

Settore: Attività culturali, biblioteche e musei

Importo totale del progetto: € 597.531,59

Importo totale del finanziamento PNRR: € 500.000,00

Importo autofinanziato: € 97.531,59

Inizio previsto: 19/05/2023

Fine prevista: 19/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto esecutivo lavori (del. GC n. 447 del 30/06/2023)

Aggiudicazione appalti

Affidamento diretto per lavori fibra ottica (det. n. 4704 del 22/06/2023) Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Affidamento diretto fornitura Sgabelli per incremento fruibilità Museo Civico G. Fattori (det. n. 4704 del 22/06/2023)

Ditta: Impresa DM Cultura S.r.l.

Affidamento diretto Implementazione piano di sicurezza ed emergenza del Museo Civico G. Fattori (det. n. 4780 del 23/06/2023) Ditta: Sokom S.r.l.

Affidamento diretto Lavori connettività di rete (det. n. 4909 del 28/06/2023) Ditta: Associazione Culturale Prisma

Realizzazione segnaletica esterna per Museo Civico G. Fattori (det. 4933 del 29/06/2023) Ditta: Impresa Nobili Pubblicità Sas

Affidamento diretto fornitura armadietti guardaroba accessibili (det. n. 4943 del 29/06/2023) Ditta: Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.

Affidamento diretto realizzazione del punto informativo presso il Museo Fattori (det. n. 4944 del 29/06/2023) Ditta: Secman Security Management S.r.l.

Affidamento diretto realizzazione di Fattori Activity Bag e realizzazione di iniziative inclusive presso il Museo Fattori (det. n. 4945 del 29/06/2023) Ditta: Sillabe S.r.l.

Affidamento diretto realizzazione di attività ed eventi volti a promuovere il tema dell'accessibilità presso il Museo Fattori (det. n. 4946 del 29/06/2023) - Acquisizione inbook (det. n. 4947 del 29/06/2023) Ditta: Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche Ditta: Promuseum S.r.l.

Lavori posa in opera fibra ottica al Museo Civico G. Fattori (det. n. 4969 del 29/06/2023) Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Aggiudicazione appalto per realizzazione percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. n. 8723 del 14/11/2023) Ditta: Betonterra Costruzioni S.r.l.


Collaudo lavori fibra ottica (det. n. 2085 del 13/03/2024)

Collaudo lavori percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. n. 5107 del 12/06/2024)

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 436.023,16

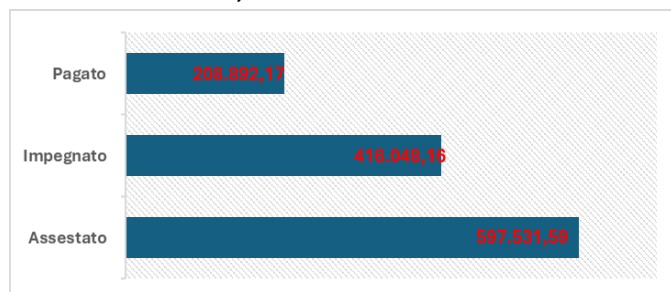

Su Regis non è presente il cofinanziamento dell'ente pari a € 97.531,59 impegnati e pagati. Totale pagato 594.242,55

M4 – Istruzione e Ricerca

C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzione

M4C1 I1.1 Rifunionalizzazione scuola infanzia via Poerio (scuola ex Ciro Menotti) come centro polifunzionale per la famiglia

CUP J44E21001030001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.170.000,00

Inizio previsto: 22/03/2021

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo in linea tecnica (Del. GC n. 247 del 20/05/2021)

Affidamento diretto servizio di verifica del progetto definitivo: Ing. Petrucci Simone (det. n. 1489 del 08/03/2023)

Approvazione progetto definitivo (det. n. 3303 del 11/05/2023)

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4581 del 20/06/2023)

(Ditta: Consorzio Italiano Costruzioni e Manutenzioni Società Cooperativa)

Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza per l'esecuzione (det. n. 5012 del 07/06/2024) Ditta: Ing. Soldati Marcello

Affidamento servizio taglio erba e pulizia dell'area (det. n. 5266 del 17/06/2024) Ditta: Garden Eco Poggiofiorito


Approvato progetto esecutivo (det. 6762 del 06/08/2024)

Autorizzazione subappalto (det. n. 9917 del 20/11/2024) Ditta subappaltatrice: CMS Soc. Coop.
Autorizzazione subappalto (det. n. 265 del 16/01/2025) Ditta subappaltatrice: Beco s.r.l.
Autorizzazione subappalto (Det. 5655 DEL 17/07/2025) Ditta subappaltatrice: SINTEC SOC. COOP. A.R.L
Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025
Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 651.000,00

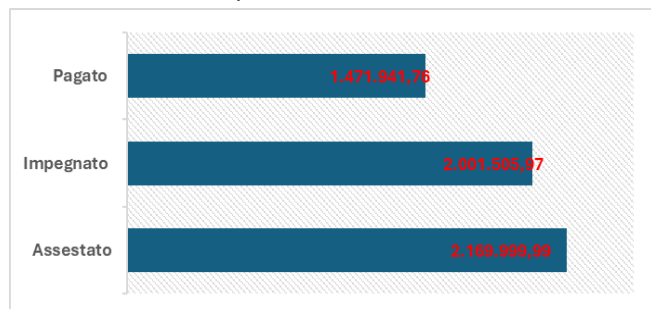

Pagamenti da bilancio comunale € 1.547.402,38

M4C1 I1.1 Asilo nido Pirandello, via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture

CUP J45E22000000006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 2.840.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.896.000,00

Cofinanziamento comunale: € 944.000,00

Inizio previsto: 01/12/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto redazione PFTE: RTP architetto Pietro Carlo Pellegrini, Studio Archimede Ingegneria S.r.l. e Dott. Francesco Saviozzi (det. n. 2317 del 05/04/2023)

Approvazione PFTE rafforzato (ord. n. 3325 del 11/05/2023)

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4577 del 20/06/2023) Ditta: Edil Fab S.r.l.

Affidamento servizio di campagna geognostica a supporto della realizzazione dell'asilo (det. n. 1065 del 12/02/2024)
Ditta: TECNA s.r.l.

Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura a Arch. Pietro Carlo Pellegrini (det. n. 2155 del 15/03/2024)

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine a Studio Geodelta di Dott. Benedetta Chiodini (det. n. 2870 del 08/04/2024)

Approvato progetto esecutivo (det. n. 3195 del 28/04/2025)

Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE) a Ing. Federico Bernardini (det. 3196 del 25/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3200 del 28/04/2025) Ditta subappaltatrice: Abate s.r.l.

Variante contrattuale ex art. 106 c.1 D.Lgs 50/2016 (det. n. 3199 del 28/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3200 del 28/04/2025) Ditta subappaltatrice: Abate s.r.l.

Approvato progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio (det. n. 6758 del 29/08/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 7000 del 10/09/2025) Ditta ABATE S.r.l.

Autorizzazione subappalto (det. n. 7675 del 30/09/2025) Ditta Edilizia Nuova srls

Autorizzazione subappalto (det. n. 7893 del 06/10/2025) Ditta Edil Fab s.r.l.

Affidamento servizio tecnico agronomo-forestale a Vegetalia studio agr. forestale di M. Demi (det n. 9127 del 13/11/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 10141 del 15/12/2025) Ditta Canducci Group srl in ati con l'impresa Best Roof srls
Affidamento servizio tecnico per la redazione dello studio dei valori di fondo naturale, per la matrice terreno (det. n. 1213 del 10/02/2026) Dott. Giorgio Bianchi

Autorizzazione subappalto (det. n. 1431 del 25/02/2026) Ditta Stil Società Tecno Impianti Livornese s.r.l.

Autorizzazione subappalto (det. n. 1436 del 25/02/2026) Ditta Emme Erre Impianti

Proroga contrattuale ultimazione lavori (det. n. 2720 del 08/04/2026)

Autorizzazione subappalto (det. n. 4317 del 26/05/2026) Ditta Cla coperture lavorazioni amianto srl

Affidamento servizio di prove su materiali e prove di carico (det. n. 4423 del 29/05/2026) Ditta Laboratorio delta s.r.l

Ridefinizione quadro economico tramite utilizzo di risorse aggiuntive al fine di approvare modifica contrattuale (GC. n. 496 del 25/06/2026)

Modifica contrattuale e proroga (det. n. 5397 del 30/06/2026)


Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026 – concessa proroga al 31/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 568.800,00

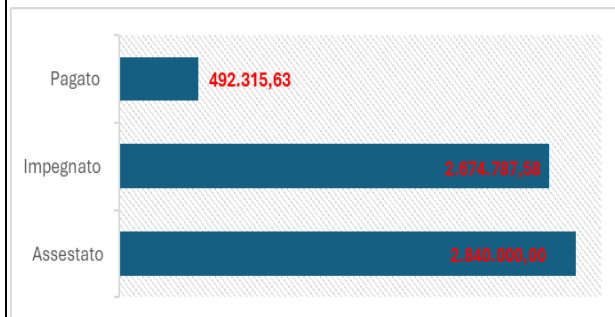

Pagamenti da bilancio comunale € 625.366,99

M4C1 I3.3 Realizzazione nuova scuola secondaria I grado Mazzini – via Sgarallino

CUP J41B22002240006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 5.280.000,00

Inizio previsto: 20/01/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE in linea tecnica (deliberazione GC n. 30 del 20/01/2023)

Approvazione DIP (delibera GC n. 527 del 18/08/2023)


Riapprovato il DIP con GC. n. 28 del 17/01/2025

Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/03/2026

Stato di attuazione

Riapprovato DIP

INCASSATI € 528.000,00

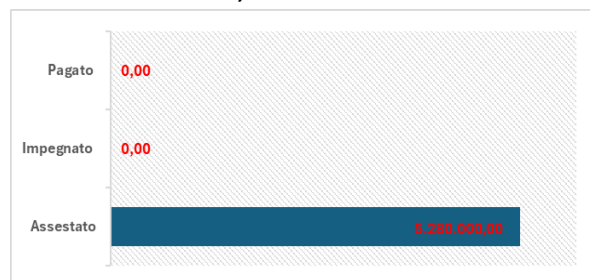

M4C1 I3.3 Polo scolastico di Montenero – realizzazione di un nuovo centro infanzia 0-6 anni

CUP J41B22001690006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.520.000,00

Inizio previsto: 18/05/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione DIP (delibera GC n. 541 del 18/08/2023)

Approvazione PFTE in linea tecnica


Riapprovato DIP con GC n. 154 del 04/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Stato di attuazione

Riapprovato DIP

INCASSATI € 252.000,00

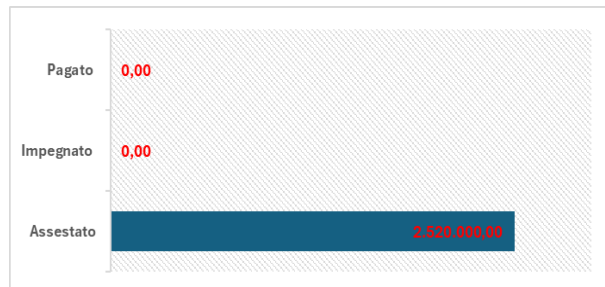

M4C1 I3.3 Scuola secondaria I grado Michelangelo, Via Dudley 3. Adeguamento della palestra

CUP J98H25001590001

Settore: Transizione tecnologica e smart city

Importo totale del finanziamento PNRR: € 185.000,00

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229

Inizio previsto: 18/05/2026

Fine prevista: 31/12/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (GC n. 129 del 24/02/2026)

Affidamento realizzazione progetto esecutivo lavori impiantistici (det. n. 2785 del 09/04/2026) ing. Ghettoni Simone

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 4748 del 09/06/2026)

Autorizzazione subappalto servizio di redazione della valutazione di impatto acustico (det. n. 5037 del 18/06/2026)

microimpresa dell'Ing. ERNESTO LOTTI

Affidamento lavori (det. n. 5153 del 22/06/2026) Engineering costruzioni gruppo Empoli Luce s.r.l

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

In fase di inserimento dati in Regis

M4C1 I3.3 Scuola secondaria I grado San Gaetano 19, lavori di adeguamento antincendio**CUP: J98H25001610001**

Settore: Transizione tecnologica e smart city

Importo totale del finanziamento PNRR: € 170.000,00

Inizio previsto: 18/05/2026

Fine prevista: 31/12/2026

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (GC n. 414 del 03/06/2025)

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 10238 del 16/12/2025) revisionato (det. n. 3640 del 07/05/2026)

Affidamento lavori (det. n. 4700 del 09/06/2026) Ediltec srl

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

*In fase di inserimento dati in Regis***M4C1 I3.3 Scuola primaria Razzauti e secondaria di I grado Gamerra****CUP: J98H25001580005**

Settore: Transizione tecnologica e smart city

Importo totale progetto: € 280.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 200.000,00

Importo cofinanziamento: € 80.000,00

Inizio previsto: 18/05/2026

Fine prevista: 31/12/2026

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (GC 8 del 13/01/2026)

Stato di attuazione

In progettazione

*Da inserire in Regis***M4C1 I3.3 Scuola primaria Lambruschini e materna Rosetta****CUP: J98H25001600005**

Settore: Transizione tecnologica e smart city

Importo totale progetto: € 255.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 200.000,00

Importo cofinanziamento: € 55.000,00

Inizio previsto: 18/05/2026

Fine prevista: 31/12/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori**Stato di attuazione**

In progettazione

Da inserire in Regis

M5 Inclusione e coesione
C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Lavori pubblici e opere PNRR

M5C2 I3.1 Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia, via San Martino

CUP J45B22000400006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 5.029.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.500.000,00

FOI: € 350.000,00

Cofinanziamento comunale: € 1.179.000,00

Inizio previsto: 07/11/2022

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto redazione della verifica preventiva di interesse archeologico (det. n. 7746 del 24/11/2022)

Approvazione PFTE (del. GC n. 819 del 23/12/2022) Ditta: Past in Progress S.r.l.

Affidamento diretto relazione geologica ed esecuzione indagini (det. n. 371 del 23/01/2023) Ditta: Geologica Toscana Snc

Affidamento servizio supporto al RUP per verifica PFTE a Prima Ingegneria STP S.s (det. n. 01/02/2023)

Approvazione PFTE rafforzato (det. n. 108 del 22/02/2023)

Affidamento diretto realizzazione render (det. n. 1867 del 21/03/2023) Ditta: VIR94 Lab. Archviz.

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 2205 del 30/03/2023)

Aggiudicazione efficace (det. n. 3840 del 29/05/2023) Ditta: Frangerini Impresa S.r.l.

Affidamento servizio di realizzazione nuovo inserimento fotografico impianto sportivo (det. n. 3301 del 11/05/2023)

Affidamento servizio per valutazione impatto acustico a Studio Tecnico Dott. Ing. Dario Gratta (det. n. 8454 del 07/11/2023)

Affidamento assistenza direzione lavori materia ambientale (det. n. 1223 del 16/02/2024) Ditta: Bios s.r.l.

Affidamento assistenza archeologica lavori di scavo (det. n. 1225 del 16/02/2024) Ditta: Past in progress s.r.l.

Affidamento servizio di realizzazione di 3 rendering a Studio VIR90 lab archviz” di Valerio Palandri (det. n. 2729 del 03/04/2024)

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 7833 del 18/09/2024)

Affidamento del servizio di espanto di piante e collocazione vasi (det. n. 9213 del 28/10/2024) Ditta: Giardiniera Italiana Società Cooperativa Sociale

Autorizzazione subappalto (det. n. 82 del 08/01/2025) Ditta subappaltatrice: Edil Nova srl

Affidamento per smontaggio di fornace (det. n. 1011 del 11/02/2025)

Affidamento del servizio di espanto piante (det. n. 1085 del 12/02/2025)

Approvazione variante suppletiva e affidamento maggiori lavori (det. 3794 del 16/05/2025) Ditta: Giardiniera Italiana Società Cooperativa Sociale

Autorizzazione subappalto (det. n. 9886 del 05/12/2025) Ditta: VASSALLO COSTRUZIONI SRL

Autorizzazione subappalto (det. n. 41 del 07/01/2026) Ditta: Siel srl

Autorizzazione subappalto (det. n. 393 del 20/01/2026) Ditta Tecnologia e Colore Design srl

Autorizzazione subappalto (det. n. 394 del 20/01/2026) Ditta Galligani M.

Proroga contrattuale ultimazione lavori (det. n. 1329 del 23/02/2026)


Variente suppletiva e maggiori lavori (det. n. 2913 del 14/04/2026)

Proroga contrattuale ultimazione lavori (det. n. 4316 del 26/05/2026)
 Autorizzazione subappalto (det. n. 4363 del 28/05/2026) Ditta Emmeti Service srl
 Autorizzazione subappalto (det. n. 4891 del 12/06/2026) Ditta Edil Sea Pavimenti srls
 Modifica contrattuale (det. n. 5362 del 29/06/2026)
 Proroga contrattuale ultimazione lavori (det. n. 5407 del 30/06/2026)
 Esecuzione lavori: dal 01/12/2023 al 30/10/2025
 Collaudo: dal 01/11/2025 al 31/01/2026 – concessa proroga al 31/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.050.000,00

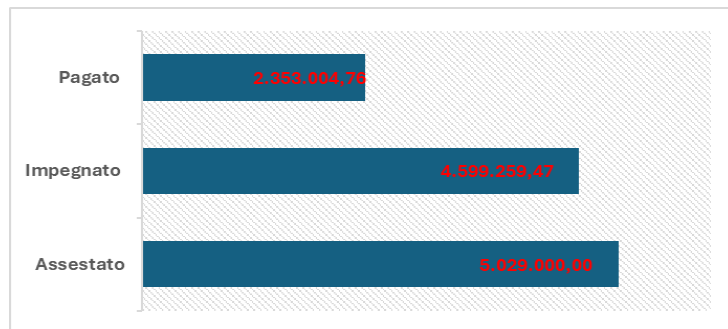

Nel mese di luglio sono stati effettuati ulteriori pagamenti per € 656.243,06 (totale pagamenti € 4.599.259,47)

M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana Baden Powell – Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell

CUP J44E21001000001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 2.200.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.000.000,00

FOI: € 200.000,00

Inizio previsto: 12/04/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (del. GC n. 272 del 01/06/2021)

Approvazione progetto definitivo (del. GC n. 300 del 12/05/2023)

Affidamento servizio supporto al RUP per verifica p.e. (det. n. 3626 del 19/05/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 4410 del 24/06/2023)

Affidamento servizio di taglio erba e taglio vegetazione e abbattimento essenze arboree e arbustive (det. n. 6244 del 17/08/2023) Ditta: Collecoop

Aggiudicazione appalto (det. n. 5785 del 28/07/2023) Procedura aperta Ditta: Euroambiente S.r.l.

Affidato servizio di taglio erba, vegetazione etc. (det. 8160 del 27/10/2023)

Autorizzazione subappalto (det. n. 6094 del 12/07/2024) Ditta subappaltatrice: Italian Garden S.r.l.

Variazione contrattuale art. 106 c.2 D.lgs 50/2016 (det. n. 6544 del 30/07/2024)

Approvata variante in corso d'opera 2 (det. n. 1173 del 17/02/2026)

Proroga ultimazione lavori (det. n. 3914 del 14/05/2026)

Autorizzazione subappalto (det. n. 4282 del 26/05/2026) Ditta Italian Garden

Modifica contrattuale e proroga ultimazione lavori (det. n. 5401 del 30/06/2026)


Esecuzione lavori: termine 31/03/2026

Collaudo: 30/06/2026 – proroga al 31/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.332.303,89

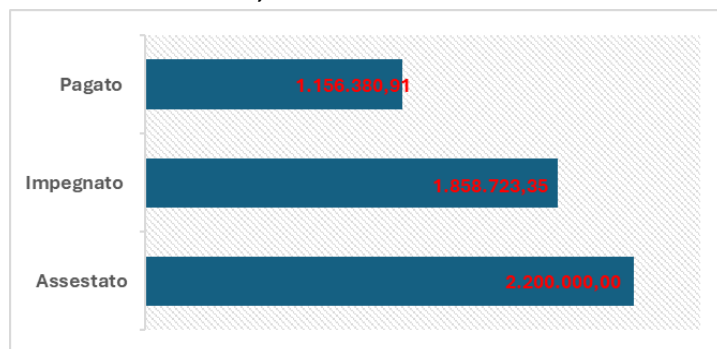

Pagamenti da bilancio comunale € 1.177.546,30

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero - riqualificazione immobili quartiere stazione e pavimentazione isolato quartiere Stazione

CUP J47B22000060001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 14.155.999,87

Importo totale del finanziamento PNRR: € 10.996.666,56

FOI: € 2.199.333,31

Cofinanziamento: € 960.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro; procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 1 (det. n. 2217 del 08/08/2022)

Affidamento servizi tecnici di integrazione della progettazione preliminare, della progettazione definitiva, della direzione dei lavori e del C.S.E. (det. n. 5750 del 27/07/2023) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Approvata bozza ODA per servizi di esecuzione di rilievi ed indagini, di progettazione definitiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (det. n. 7221 del 27/09/2023) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Affidamento supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 2 – servizi di verifica della progettazione Ditta: Planum S.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 5 – servizi di collaudo Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandatario) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Minutolo Ing. Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato Ditta: Apulia S.r.l. (mandataria), Pagano Spa (mandante)

Approvato progetto definitivo e bozza ODA (Delibera GC 849 del 05/12/2023)

Aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (det. n. 10331 del 28/12/2023) RTI APULIA S.R.L. mandataria - PAGANO S.P.A. mandante - DELTA LAVORI S.P.A. mandante

Approvato ODA per servizi di progettazione definitiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (det. n. 1080 del 12/02/2025) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 2995 del 17/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 6005 del 29/07/2025) Ditta: Aurora srl

Autorizzazione subappalto (det. n. 10649 del 29/12/2025) Ditta: Wood system Italia s.r.l.

Proroga contrattuale (det. n. 2466 e 2467 del 30/03/2026)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3904 del 14/05/2026) Ditta MKG costruzioni srls

Revoca subappalto (det. n. 4287 del 26/05/2026) Ditta Aurora srl

Autorizzazione subappalto (det. n. 5066 del 18/06/2026) Ditta Ebanisteria Caputo s.r.l.

Proroga contrattuale 2 (det. n. 5400 e 5404 del 30/06/2026)


Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026 – proroga al 14/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.099.666,66

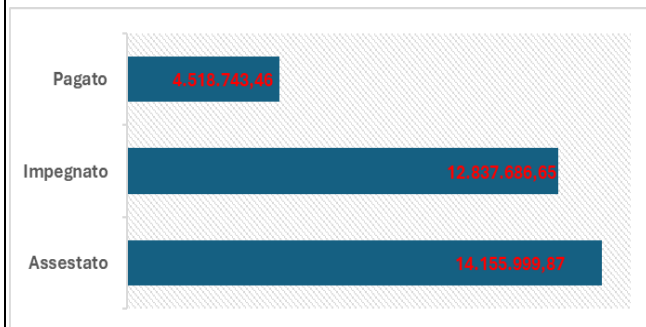

Pagamenti da bilancio comunale € 5.370.503,00

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – quartiere Stazione Parco Pertini

CUP J43D21002660001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.639.722,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l

Approvazione PFTE (Delibera GC n. 851 del 07/12/2023) Gara deserta

Nuova determina a contrarre procedura negoziata (det. n. 10403 del 29/12/2023)

Aggiudicato appalto integrato (det. n. 1688 del 01/03/2024) (Consorzio stabile toscana edilizia e ambiente, società consortile a s.r.l.)


Esecuzione lavori: entro il 30/06/2025

Collaudo: dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Stato di attuazione

Rinuncia a parte del finanziamento e dirottamento di quota parte delle risorse sul Pinqua Stazione

INCASSATI € 263.972,25

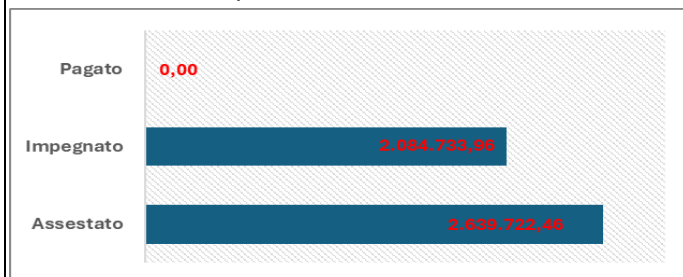

Pagamenti da bilancio comunale € 31.222,76

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – parcheggio Del Corona

CUP J47H21000370001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.323.654,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Servizio di indagini geognostiche e geofisiche (det. n. 8359 del 03/11/2023) Assogeo – studio di geologia di Antonio Esposito

Servizio di indagini strutturali e per l'esecuzione di prove di laboratorio (det. n. 8363 del 03/11/2023) Ditta: Laboratorio Delta S.r.l.

Affidamento servizio di studio geologico, sismico e geotecnico a supporto del progetto (det. n. 8361 del 03/11/2023)

Ditta: Assogeo – studio di geologia di Antonio Esposito

Approvazione progetto esecutivo (Del. GC n. 859 del 07/12/2023)

Aggiudicazione appalto lavori (det. n. 10402 del 29/12/2023) Ditta: Abate s.r.l.

Autorizzazione subappalto (det. n. 10242 del 16/12/2025) Ditta: DIFO COSTRUZIONI SRL

Modifica contrattuale (det. n. 5360 del 29/06/2026)


Esecuzione lavori: dal 01/04/2024 al 31/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2025 al 30/06/2025 proroga al 14/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 132.365,45

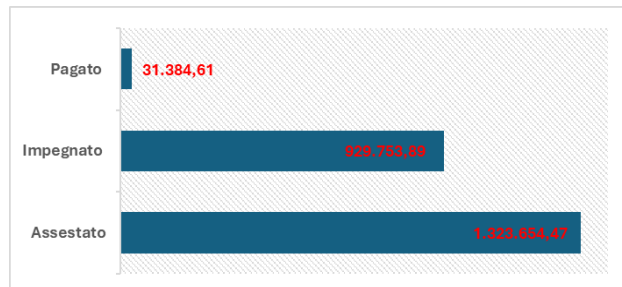

Pagamenti da bilancio comunale € 45.684,61

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Dogana D'Acqua completamento del recupero e rifunionalizzazione ex caserma Lamarmora

CUP J43D21002630001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 12.276.702,63

Importo totale del finanziamento PNRR: € 8.563.918,86

FOI: € 1.712.783,77

Importo autofinanziato: €2.000.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro 31/03/2023. Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria (det. n. 5744 del 27/07/2023)

Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Affidamento diretto a società in house servizio di rimozione rifiuti Ditta: AAMPS Spa

Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione (det. n. 7710 del 11/10/2023) Ditta: Conteco Check S.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandatario) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato Consorzio Stabile Medil Società consortile per azioni

Approvato progetto definitivo e approvata bozza ODA (Delibera GC n. 839 del 05/12/2023) Consorzio stabile Medil società consortile per azioni - CO.GE.PA. costruzioni generali Passarelli S.p.a. esecutrice- Nord costruzioni Generali s.r.l. esecutrice

Aggiudicazione appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (det. n. 10356 del 28/12/2023) Consorzio stabile Medil società consortile per azioni

Integrazione servizi tecnici. oda integrativo (det. n. 249 del 15/01/2025) RTI IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dott. Flavio Carlini

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 5208 del 02/07/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 9748 del 02/12/2025) Ditta: CONSORZIO ARTEMIDE

Presa d'atto affiancamento lavori società AMG GROUP srl (det. n. 1007 del 11/02/2026)

Proroga contrattuale 1 appalto integrato (det. n. 2463 del 30/03/2026) e del servizio tecnico di progettazione definitiva e direzione lavori (det. n. 2465 del 30/03/2026)


Proroga contrattuale 2 appalto integrato (det. n. 5395 del 30/06/2026) e del servizio tecnico di progettazione definitiva e direzione lavori (det. n. 5408 del 30/06/2026)

Esecuzione lavori: entro il 31/03/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/06/2026 - proroga al 14/08/2026

Stato di attuazione

INCASSATI € 856.391,89

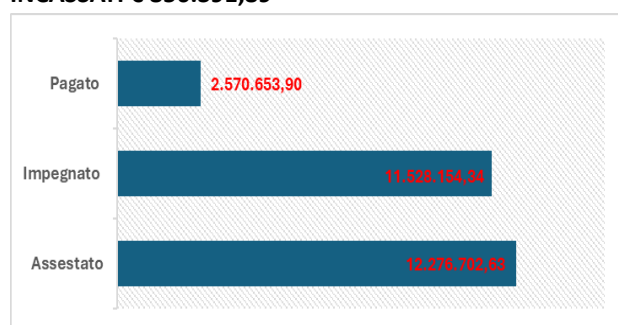

Pagamenti da bilancio comunale € 2.894.078,71

M5C212.3.1 PINQuA ambito Dogana D'Acqua realizzazione edificio polifunzionale Cral e realizzazione Piazza con giochi d'acqua

CUP J45I22000000001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 5.656.583,69

Importo totale del finanziamento PNRR: € 4.380.486,41

FOI: € 876.097,28

Importo autofinanziato: €400.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicazione accordo quadro 27/09/2022. Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria.

Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione (det. n. 6941 del 15/09/2023)

Affidamento servizio indagini geologiche (det. n. 7413 del 03/10/2023) Società So.Ge.T. s.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione (Ditta: CONTECO Check S.r.l.)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo (Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandataria) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 3. Lavori (Ditta: Edilcido S.r.l.)

Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) (Ditta: Avalon s.r.l.)

Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica e bozza ODA (Delibera GC n. 858 del 07/12/2023)

Aggiudicazione del contratto specifico di esecuzione lavori (det. n. 10371 del 29/12/2023) (Ditta: EDILCIDO S.R.L.)

Affidamento servizio di indagine tomografica (det. n. 5590 del 25/06/2024) CEA DEMINING S.r.l.

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 10195 del 28/11/2024)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3137 del 23/04/2025) Ditta: Trivel Pozzi di Calzone Salvatore

Autorizzazione subappalto (det. n. 7008 del 10/09/2025) Ditta: COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L

Proroga contrattuale 1 appalto (det. n. 10563 del 23/11/2025) e servizi tecnici progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (det. n. 2475 del 31/03/2026)

Proroga contrattuale 2 appalto (det. n. 4455 29/05/2026) e servizi tecnici progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza (det. n. 5405 del 30/06/2026)

Proroga contrattuale 3 (det. n. 5406 del 30/06/2026)


Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - proroga al 14/08/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 438.048,64

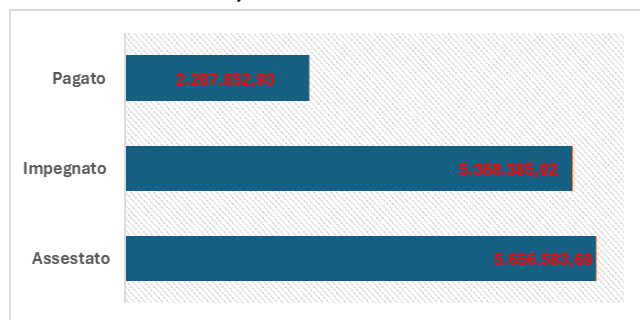

Pagamenti da bilancio comunale € 2.237.852,93

M5 Inclusione e coesione

C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

Settore Lavori pubblici e opere PNRR

M5C2I1.1.1 PIPPI Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e bambini

CUP J44H22000200006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 211.500,00

Inizio previsto: 09/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto servizio (det. n. 5009 del 30/06/2023) Ditta: Nuovo Futuro Cooperativa sociale

Approvazione avviso pubblico per individuazione soggetti terzi settore per avvio coprogettazione (det. n. 690 del 30/01/2024)


Approvato progetto esecutivo e avviata attività oggetto della co-progettazione a far data dal 01/03/2024

(det. n. 1511 del 27/02/2024) con Cuore Liburnia Sociale, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale e Associazione Il Sestante Solidarietà

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATO € 190.350,00

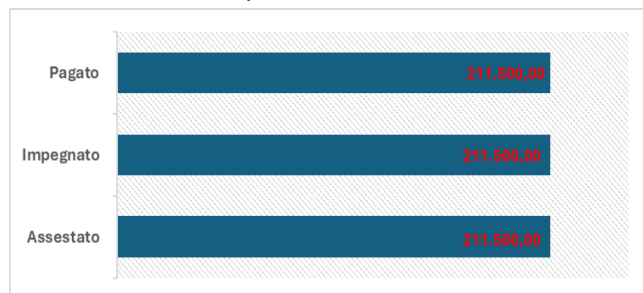

M5C2I1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (Palazzina Lah)

CUP J44H22000210006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del progetto: 2.630.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.460.000,00

Importo cofinanziamento: € 170.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026 – proroga al 24/08/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Approvato lo schema di convenzione tra Comune di Livorno e Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione dell'azione diffusa A.1. (det. n. 11136 del 23/12/2024)

Avviso pubblico per coprogettazione e gestione del potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità (det. 3526 del 09/05/2025)

Approvazione candidature e avvio tavolo di co-progettazione (det. n. 4432 del 06/06/2025)

Approvato progetto operativo (det. n. 5532 del 14/07/2025) A.T.S. Soc. Volontaria di Soccorso pubblica Assistenza;

Cuore Liburnia Sociale; G.DI Vittorio; Cooperativa soc. Humanitas Livorno; Coop. Soc. Senex.

Affidamento fornitura 100 abbonamenti supergigaunlimited (det n. 5533 del 14/07/2025) Wind Tre spa

Affidamento fornitura 100 Amazon echo show 5, n. 100 Starter kit: 4 lampadine connesse E27 (1100) + Hue Dimmer switch (WHITE)+ bridge, n. 100 HUE Smart plug EU (tipo F) x3, n. 200 Motion sensor philups hue, n. 100 Gas sensor, n. 100 Smoke sensor (det. n. 6045 del 31/07/2025) a Computer Shop snc

Affidamento fornitura di n. 100 Bracciali Seremy, n. 100 eSIM: Integrata, già attiva e inclusa con piano di minimo 36 mesi, n. 250 Sensori Seremy svenimento/presenza in stanza (det. n. 6226 del 06/08/2025) a Gruppo Selyon s.r.l.

Affidamento servizio di installazione e configurazione di dispositivi per la domotica e la sicurezza domestica, e assistenza per prodotti Smart (det. n. 8112 del 14/10/2025) ditta Elettro D S.r.l.

Approvazione addendum convenzione di Co-progettazione (det. n. 3894 del 14/05/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE per ristrutturazione immobile Villa Serena (Delibera GC n. 664 del 10/10/2023)

Approvazione capitolato servizio relazione geologica (det. n. 8163 del 27/10/2023) Dott. Geol. Sergio Crocetti

Affidamento servizi lavori di indagine dei terreni (det. n. 8245 del 30/10/2023) Ditta: Gaia Servizi S.r.l.

Servizio per redazione del PFTE e progettazione esecutiva a supporto della progettazione (det. n. 9381 del 04/12/2023) (Geom. Vasile Sebastian)

Affidamento servizio di rendering della palazzina (det. n. 5267 del 17/06/2024)

"Studio VIR90 lab archiviz" di Valerio Palandri

Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre procedura gara aperta (det. n. 9652 del 12/11/2024)

Aggiudicazione esecuzione lavori (det. n. 2847 del 14/04/2025) Ditta: (Consorzio innova Soc. Coop)

Affidamento servizio di contabilità dei lavori a supporto direzione lavori (det. n. 3141 del 23/04/2025) Geom. Sebastian Vasile

Autorizzazione al subappalto fornitura e posa di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonica e televisiva ditta Nuova Elettrotecnica s.r.l e fornitura e posa di impianto termico, di condizionamento e idro-sanitario ditta Boni e Scarpellini s.r.l. (det. n. 6762 del 29/08/2025)

Autorizzazione al subappalto fornitura e posa di struttura portante in acciaio (det. n. 8324 del 21/10/2025) ditta AB costruzioni metalliche srl

Autorizzazione subappalto (det. n. 3905 del 14/05/2026) ditta C.F. Costruzioni S.r.l.


Approvazione modifica contrattuale e ridefinizione quadro economico per l'utilizzo del ribasso di gara e di risorse aggiuntive (Gc n. 495 del 25/06/2026)

Approvazione modifica contrattuale, affidamento maggiori lavorazioni e proroga ultimazione lavori al 24/08/2026 (det. n. 5363 del 29/06/2026)

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 246.000,00

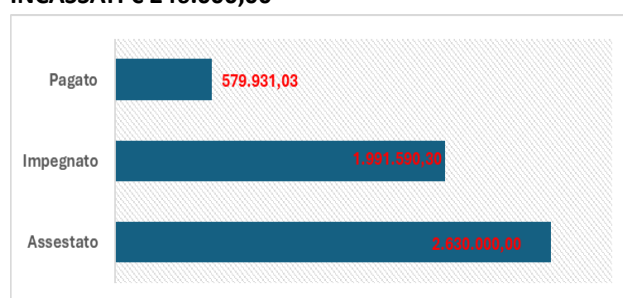

Pagamenti da bilancio comunale € 957.504,46

M5C2I1.1.2 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione

CUP J44H22000220006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 330.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026


Avanzamento fasi procedurali servizi

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione sociosanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in virtù dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del Sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" CUP J44H22000220006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" (Del. GC 455 del 07/07/23 e della Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.8 del 10 luglio 2023)

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 33.000,00

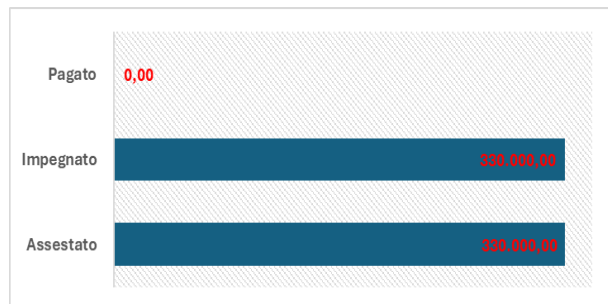

Pagamenti da bilancio comunale € 33.000,00

M5C2I1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali

CUP J44H22000230006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 209.976,80

Inizio previsto: 02/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio tecnico e di segreteria per la realizzazione dell'investimento (det. n. 9943 del 06/12/2023) (Ditta: CON TE Cooperativa Sociale ONLUS)

Affidamento del servizio tecnico e di segreteria (det. n. 3619 del 13/05/2025) Istituto di Terapia Familiare di Siena s.r.l.


Affidamento servizio tecnico e segreteria (det. n. 8746 del 03/11/2025) CON TE Cooperativa Sociale ONLUS

Affidamento realizzazione evento di restituzione delle attività realizzate (det. n. 2258 del 24/03/2026) ditta Circolo Ricreativo Lavoratori Del Porto

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 62.993,04

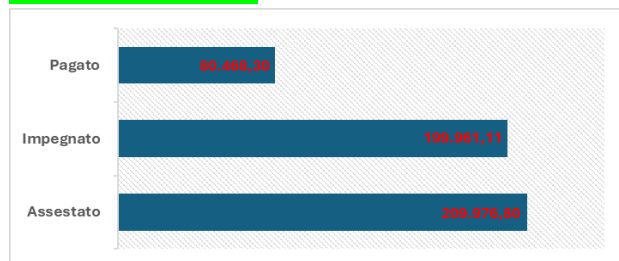

Pagamenti da bilancio comunale € 152.582,56

M5C2I1.1.4 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Via degli Asili 47 e Via Verdi)

CUP J44H22000240004

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto servizio supporto organizzativo (det. n. 8344 del 13/12/2022) (Ditta: Progetto A. Società Cooperativa Sociale)

Esecuzione servizi: da dicembre 2022 al 30/06/2023

Il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione.

Per l'azione di GESTIONE la prima procedura realizzata e conclusa concerneva l'avviamento sperimentale della gestione affidato a decorrere da dicembre 2022 fino al 30/06/2023 (det. n. 8344 del 13/12/2022 e n. 2884 del 27/04/2023)

Affidamento servizio contabilità dei lavori (det. n. 4796 del 19/06/2025)

Avvio procedura ad evidenza pubblica per individuare soggetti terzo settore per gestione attività (det. n. 4980 del 25/06/2025)

Approvato il progetto operativo (det. n. 10523 del 22/12/2025) A.T.I. Venerabile Arciconfraternita della Misericordia Livorno ODV; A.P.S. Comunico E.T.S.; in Associazione A.P.S., Nuovo Futuro Coop. Soc., La Ruzzoteca A.S.D. A.P.S.

Approvazione progetto operativo aggiornato (GC. n. 150 del 03/03/2026) ATS

Approvato addendum n. 1 convezione con l'ATS (GC n. 510 del 30/06/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Approvato DIP (del. GC 366 del 20/05/2025)

Approvazione progetto esecutivo (GC. n. 176 del 06/03/2026)

Affidamento diretto lavori (det. n. 2218 del 23/03/2026) Ditta F.Ili Colloca s.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca


Affidamento diretto fornitura, consegna e installazione arredi (det. n. 3596 del 06/05/2026) ditta HCH SPA

Approvata perizia modifica contrattuale (det. n. 5361 del 29/06/2026)

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 71.500,00

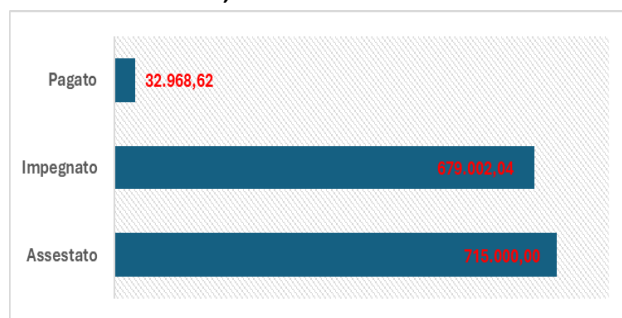

M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità AUSL (Via Piave 20)

CUP J44H22000320006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Aggiudicazione: accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 con Azienda USL Nord Ovest

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione sociosanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in forza dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP J44H22000320006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" approvato con Decreto Direttoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3853 del 2/12/2022, con Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.18 del 23/12/2022 e con Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 31/01/2023.

Nella sua esecuzione il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. La prima procedura avviata concerne la gestione per la realizzazione della quale è stato pubblicato in data 9/02/23 un avviso pubblico di manifestazione di interesse per una procedura di coprogettazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 approvato con decreto del Direttore di Zona USL n.531 del 9/02/23. Nell'ambito della procedura di coprogettazione con decreto n. 1427 del 3/05/2023 è stato approvato il verbale di ammissione dei candidati alla coprogettazione e convocato il tavolo di coprogettazione.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvato il DIP (GC n. 365 del 09/05/2024)

Approvato PFTE (GC 365 del 09/05/2024)

Aggiudicati i lavori (Decreto n. 2691 del 30/08/2024)

Stato di attuazione

concluso 

INCASSATI € 71.500,00



Pagamenti da bilancio comunale € 71.500,00

M5C2I1.3.1 Povertà estrema - Housing first – Via Bonomo

CUP J44H22000250006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 710.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Firmata della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo- invio Dichiarazione di inizio attività.

Procedura ad evidenza pubblica per coprogettazione relativa alla gestione del servizio (det. n. 6666 del 02/08/2024)

Approvata candidatura Soc. Cop Il Simbolo (det. n. 7703 del 13/09/2024)

Approvato progetto esecutivo per la gestione dell'attività di coprogettazione (det. n. 8293 del 3/10/2024)

In data 18.10.24 è stata sottoscritta la convenzione con il soggetto realizzatore Società coop. Sociale il Simbolo.

Affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo (det. n. 9215 del 28/10/2024) Ditta: Prima Ingegneria STP s.s.

Approvazione schema Addendum alla Convenzione per la co-progettazione (det. n. 4735 del 18/06/2025)

Approvazione addendum 2 e proroga fino al 30/06/2026 del termine di scadenza della Convenzione di Coprogettazione (det. n. 2411 del 27/03/2026)

Approvazione schema addendum 3 alla convenzione (det. n. 5300 del 26/06/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Approvazione PFTE (del. GC n. 267 del 02/05/2023)

Affidamento servizio di sgombero locali (det. n. 3157 del 08/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Affidamento servizio di rilevazione dimensionale tramite laser 3D ed elaborazione e consegna dati (det. n. 3841 del 29/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini

Affidamento servizio assistenza indagini strutturali (det. 5376 del 13/07/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Approvazione certificato regolare esecuzione e conto finale di sgombero (det. n. 5775 del 28/07/2023)

Affidamento servizio di aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati (det. n. 8161 del 27/10/2023) Ditta: Labromare srl

Affidamento servizio di realizzazione prova penetrometrica e masw (det. n. 3072 del 12/04/2024) Ditta: Geoluk

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine per ascensore (det. n. 3073 del 12/04/2024) Ditta: AssoGeo Studio di Geologia

Affidamento servizio per redazione computo metrico (det. n. 6635 del 01/08/2024) Geom. Vasile Sebastian

Affidamento servizi tecnici di architettura e ingegneria (det. n. 2503 DEL 31/03/2026) Tecno Ci-Emme Progetti

Affidamento diretto lavori (det. n. 3026 del 16/04/2026) ditta Programma Costruzioni srl

Affidamento della fornitura, consegna e installazione di arredi per spazi residenziali (det. n.3596 del 06/05/2026) ditta HCH SPA

Autorizzazione subappalto impianto idrico e climatizzazione (det. n. 5067 del 18/06/2026) ditta CAB sas


Autorizzazione subappalto impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e telefonici (det. n. 5107 del 19/06/2026) ditta Nuova STIL SRL

Approvazione variante in corso d'opera (det. n. 5155 del 22/06/2026)

Stato di attuazione

Concluso 

INCASSATI € 71.000,00

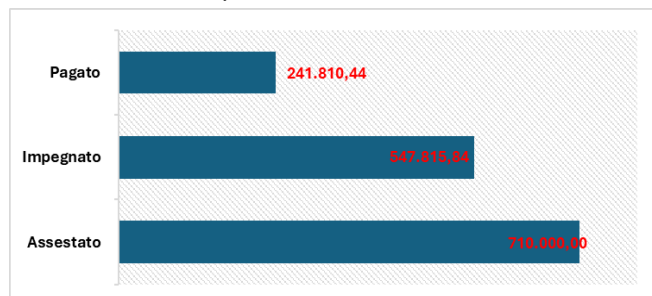

Pagamenti da bilancio comunale € 191.262,79

M5C2I1.3.1 Povertà estrema – Stazioni di posta - Via M. Terreni 9

CUP J44H22000260006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.090.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Aggiudicazione: entro il 31/12/2023

Firmata della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo- invio Dichiarazione di inizio attività.

Procedura ad evidenza pubblica per coprogettazione relativa alla gestione del servizio (det. n. 6665 del 02/08/2024)

Approvata candidatura Soc. Cop Il Simbolo (det. n. 7702 del 13/09/2024)

Approvato progetto esecutivo per la gestione dell'attività di coprogettazione (det. n. 8774 del 15/10/2024)

Preso atto dei lavori della commissione ed è stato approvato il progetto definitivo proposto dalla ATS tra Soc. Coop. Sociale Il Simbolo, in qualità di Ente capofila, insieme con Fondazione Caritas Livorno ETS e LINC SCS Det. n. 8774 del 15.10.24

Affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo (det. n. 9215 del 28/10/2024)

Approvazione schema addendum convenzione proroga termine conclusione attività (det. n. 2438 del 27/03/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Approvazione PFTE (GC n. 267 del 02/05/2023)

Affidamento servizio di sgombero locali (det. n. 3157 del 08/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Affidamento servizio di rilevazione dimensionale tramite laser 3D ed elaborazione e consegna dati (det. n. 3841 del 29/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini

Affidamento servizio assistenza indagini strutturali (det. 5376 del 13/07/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Approvazione certificato regolare esecuzione e conto finale di sgombero (det. n. 5775 del 28/07/2023)

Affidamento servizio di aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati (det. n. 8161 del 27/10/2023) Ditta: Labromare srl

Affidamento servizio di realizzazione prova penetrometrica e masw (det. n. 3072 del 12/04/2024) Ditta: Geoluk

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine per ascensore (det. n. 3073 del 12/04/2024)

Affidamento servizio per redazione computo metrico (det. n. 6635 del 01/08/2024) Geom. Vasile Sebastian

Approvato DIP (GC n. 266 del 07/04/2026)

Affidamento diretto del servizio di computo e contabilità lavori (det. n. 3051 del 16/04/2026) Geom. Sebastian Vasile

Approvato progetto esecutivo (GC n. 319 del 24/04/2026)

Affidamento diretto lavori (det. n. 3394 del 29/04/2026) Ditta Bartolozzi costruzioni edili srl

Affidamento diretto Fornitura, consegna e installazione di arredi per spazi residenziali, collettivi e di servizio (det. n. 3596 del 06/05/2026) ditta HCH spa


Approvazione variante in corso d'opera (GC n. 492 del 23/06/2026)

Approvazione variante in corso d'opera (det. n. 5318 del 26/06/2026)

Stato di attuazione

concluso 

INCASSATI € 109.000,00

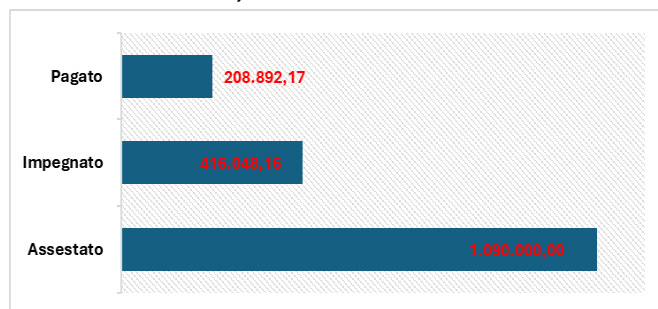


Si evidenzia che i dati finanziari riportati nelle singole schede sono desunti dal sistema ReGiS e rappresentano lo stato delle registrazioni disponibili sulla piattaforma alla data di estrazione. Eventuali differenze rispetto alle risultanze del bilancio comunale sono riconducibili sia ai fisiologici tempi di aggiornamento della piattaforma ReGiS rispetto alle registrazioni della contabilità dell'Ente, sia alle specifiche modalità di attuazione di alcuni interventi, per i quali i pagamenti sono effettuati direttamente dai soggetti co-progettanti o dai soggetti sub-attuatori e successivamente rimborsati dal Comune di Livorno. Tali disallineamenti hanno pertanto natura esclusivamente temporanea e non incidono sulla corretta rappresentazione dell'avanzamento finanziario degli interventi.

Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti

M1C1 --> n. 16 interventi	
n. 1 gestione in corso	(Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro)
n. 14 gestioni concluse	(PagoPA, Piattaforma notifiche digitali, piattaforma digitale nazionale dati, AppIO, cloud, serv e cittad digitale, Cyber Resilience, Citizen Inclusion, SUAP e SUE, ANPR e ANSC, Centri facilitaz, SUAP e SUE enti terzi, ANNSCU, Adeguamento delle piattaforme SUE)
M1C3 --> n. 1 intervento	
n. 1 concluso	(Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali Museo Civico Fattori)
M4C1 --> n. 8 interventi	
n. 4 in fase di progettazione	(Nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino e Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6, Scuola primaria Razzauti e secondaria di I grado Gamerra, Scuola primaria Lambruschini e materna Rosetta)
n. 3 appalti in fase di conclusione	(Demolizione e ricostruzione Asilo nido Pirandello, Scuola secondaria I grado Michelangelo, Via Dudley 3. Adeguamento della palestra, Scuola secondaria I grado San Gaetano 19, lavori di adeguamento antincendio)
n. 1 appalto concluso	(Rifunzionalizzazione scuola infanzia Via Poerio)
M5C2 --> N. 19 interventi*	
n. 4 appalti conclusi	(Immobile housing first, stazione di posta, immobile per percorsi di autonomia per persone con disabilità, percorsi di autonomia per persone con disabilità ausl)
n. 1 appalti aggiudicati	(Parco Pertini)
n. 6 appalti in fase di conclusione	(Realizzazione nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell, Pinqua quartiere stazione, Pinqua CRAL e giochi d'acqua, Parcheggio Via del Corona, ex caserma Lamarmora)
n. 8 gestioni concluse	(Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, autonomia degli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out, percorsi di autonomia per persone con disabilità e percorsi di autonomia per persone con disabilità ausl, housing first e stazioni di posta)

*(di cui 3 interventi del sociale riguardano solo gestione e altri 5 sia gestione che lavori)

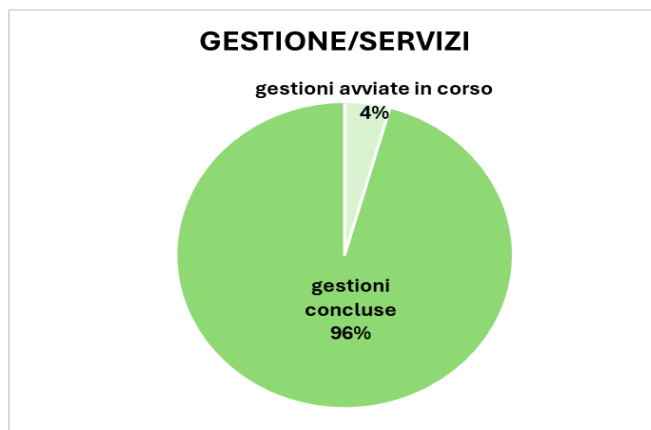


3. ANDAMENTO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PNRR

Nelle *Tabella 5* si illustra l'andamento di cassa relativo agli esercizi 2022/2026, Diversamente dai dati riportati nelle singole schede di intervento, desunti dal sistema ReGiS, l'analisi dell'andamento della cassa è elaborata sulla base delle risultanze della contabilità finanziaria del Comune di Livorno e rappresenta gli effettivi movimenti di incasso e pagamento registrati nel bilancio comunale. Tale scelta consente di rappresentare la reale esposizione finanziaria dell'Ente con riferimento all'attuazione degli interventi PNRR.

Andamento di cassa complessivo di tutti gli interventi (non vengono più considerati quelli fuoriusciti dal PNRR)

TOTALE INCASSATO QUADRIENNIO 2021/2026	TOTALE PAGATO QUADRIENNIO 2021/2026
10.798.141,76	19.912.921,70
SALDO -9.114.779,94	

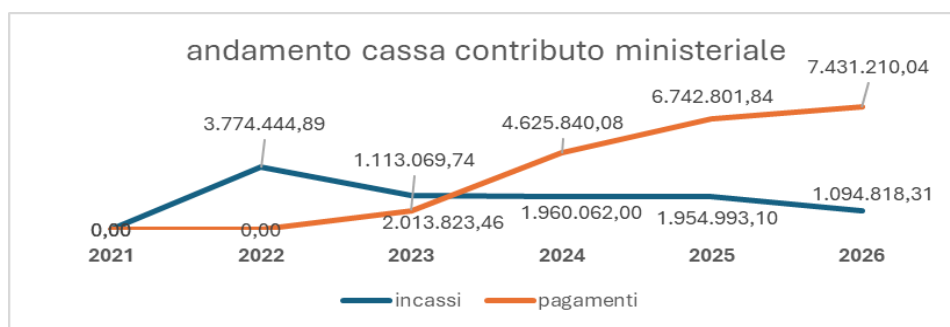

Il saldo negativo di cassa rappresenta un disallineamento temporaneo tra pagamenti effettuati e contributi ministeriali effettivamente incassati alla data della rilevazione.

Nel corso della fase conclusiva del PNRR l'Amministrazione ha accelerato l'esecuzione degli interventi e il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL), anticipando, come previsto dalle procedure di finanziamento, le risorse necessarie per garantire il rispetto delle milestone e dei target.

Alla data di riferimento risultano ancora in corso di istruttoria e rendicontazione ulteriori SAL già maturati o in fase di certificazione, che daranno diritto all'erogazione dei corrispondenti contributi ministeriali. Pertanto, il saldo negativo evidenziato costituisce un fenomeno esclusivamente finanziario e temporaneo, destinato a ridursi progressivamente con l'incasso delle quote di finanziamento spettanti a seguito della conclusione delle verifiche ministeriali e delle successive erogazioni.

Il differenziale negativo di cassa è quindi fisiologico nella fase finale di attuazione del PNRR, caratterizzata da un'intensa attività di liquidazione dei lavori e da un fisiologico scostamento temporale tra i pagamenti effettuati dall'Ente e il successivo rimborso da parte delle Amministrazioni titolari delle misure.

Nella **tabella n. 5** si illustra l'andamento di cassa delle annualità 2021/2026 relativo agli interventi che non sono fuori usciti dal PNRR.

Tabella n. 5

Interventi	ENTRATA - INCASSI						TOTALE INCASSI
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Baden Powell	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	732.303,89	0,00	1.332.303,89
PINQuA quartiere stazione	0,00	1.099.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.666,66
PINQuA Parco S. Pertini	0,00	263.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263.972,25
PINQuA parch. Via Del Corona	0,00	132.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	132.365,45
PINQuA ex Caserma Lamarmora	0,00	856.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	856.391,89
PINQuA CRAL	0,00	438.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	438.048,64
Impianto poliv. Scopaia	0,00	350.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Centro polif. Via Poerio	0,00	434.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	651.000,00
Asilo Pirandello	0,00	0,00	568.800,00	0,00	0,00	0,00	568.800,00
Scuola secondaria I grado Michelangelo, Via Dudley 3. Adeguamento della palestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scuola secondaria I grado San Gaetano 19, lavori di adeguamento antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scuola primaria Razzauti e secondaria di I grado Gamerra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scuola primaria Lambruschini e materna Rosetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno alle capacità genitoriali e pre- venzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini P.I.P.P.I.	0,00	0,00	21.150,00	0,00	169.200,00	0,00	190.350,00
Percorsi di auton. persone con disabilità	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Percorsi di auton. persone con disabilità AUSL	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Rafforzamento dei servizi sociali e preven- zione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	0,00	0,00	20.997,68	0,00	41.995,36	0,00	62.993,04
Rafforzamento dei servizi sociali domicilia- ri per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione AUSL	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Autonomia degli anziani non autosuffi- cienti	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
Housing first	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Stazioni di posta	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Museo civico Fattori	0,00	0,00	50.000,00	0,00	342.420,85	43.602,31	436.023,16
Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Mon- tenero ex via Curiel - nuovo centro infan- zia 0-6 Montenero	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Mon- tenero primaria e secondaria di 1° grado	0,00	0,00	216.875,78	0,00	0,00	0,00	216.875,78
Adozione "APP IO" Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950,00	0,00	54.950,00
Abilitazione al cloud per le PA locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.574,00	1.031.574,00

Servizi e cittadinanza digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	516.323,00	0,00	516.323,00
Piattaforma notifiche digitali Comuni	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Adozione piattaforma PAGOPA	0,00	0,00	0,00	112.627,00	0,00	0,00	112.627,00
Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni	0,00	0,00	0,00	203.435,00	0,00	0,00	203.435,00
Rete dei servizi di facilitazione digitale	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Cyber Resilience	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00
Citizen inclusion miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piattaforma digitale nazionale dati – Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNSCU) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti terzi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,00	19.642,00
“Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.774.444,89	2.013.823,46	1.960.062,00	1.954.993,10	1.094.818,31	10.798.141,76

Interventi	USCITA - PAGAMENTI						TOTALE PAGAMENTI
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Baden Powell	0,00	0,00	0,00	732.303,89	424.077,02	21.165,39	1.177.546,30
PINQuA quartiere stazione	0,00	0,00	355.384,22	289.414,04	3.350.694,39	1.375.010,35	5.370.503,00
PINQuA Parco S. Pertini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222,76	31.222,76
PINQuA parch. Via Del Corona	0,00	0,00	18.658,87	11.105,74	0,00	15.920,00	45.684,61
PINQuA ex Caserma Lamarmora	0,00	0,00	349.079,02	172.900,54	431,20	2.289.868,40	2.812.279,16
PINQuA CRAL	0,00	0,00	71.386,08	1.293.541,91	27.428,59	814.723,83	2.207.080,41
Impianto poliv. Scopaia	0,00	0,00	56.641,22	1.025.060,01	618.631,24	615.291,33	2.315.623,80
Centro polif. Via Poerio	0,00	0,00	15.861,70	407.598,79	697.824,90	426.116,99	1.547.402,38
Asilo Pirandello	0,00	0,00	45.763,10	17.376,83	196.609,12	346.957,86	606.706,91
Scuola secondaria I grado Michelangelo, Via Dudley 3. Adeguamento della palestra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38	401,38
Scuola secondaria I grado San Gaetano 19, lavori di adeguamento antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,35	3.676,35
Scuola primaria Razzauti e secondaria di I grado Gamerra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scuola primaria Lambruschini e materna Rosetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini P.I.P.I.	0,00	0,00	0,00	44.738,00	129.561,65	37.200,35	211.500,00
Percorsi di auton. persone con disabilità	0,00	0,00	31.496,62	0,00	0,00	1.472,00	32.968,62
Percorsi di auton. persone con disabilità AUSL	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	0,00	0,00	0,00	26.896,59	53.571,71	72.114,26	152.582,56
Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione AUSL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Autonomia degli anziani non autosufficienti	0,00	0,00	15.279,70	15.117,94	338.761,25	588.345,57	957.504,46
Housing first	0,00	0,00	33.981,26	2.789,54	97.772,14	56.719,85	191.262,79
Stazioni di posta	0,00	0,00	35.368,25	2.903,41	107.181,30	63.439,21	208.892,17
Museo civico Fattori	0,00	0,00	12.669,70	483.622,41	418,85	0,00	496.710,96
Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero primaria e secondaria di 1° grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adozione "APP IO" Comuni	0,00	0,00	0,00	15.372,00	5.673,00	0,00	21.045,00
Abilitazione al cloud per le PA locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.640,00	258.640,00
Servizi e cittadinanza digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.658,00	120.658,00
Piattaforma notifiche digitali Comuni	0,00	0,00	0,00	38.064,00	0,00	0,00	38.064,00
Adozione piattaforma PAGOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	13.770,75	50.370,75
Rete dei servizi di facilitazione digitale	0,00	0,00	0,00	10.434,44	0,00	19.565,56	30.000,00
Cyber Resilience	0,00	0,00	0,00	0,00	524.391,06	242.215,85	766.606,91
Citizen inclusion miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,42	0,00	136.774,42
Piattaforma digitale nazionale dati - Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNSCU) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti terzi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,00	16.714,00
“Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.113.069,74	4.625.840,08	6.742.801,84	7.431.210,04	19.912.921,70

4. INTERVENTI PNRR MESSI A TERRA NEL COMUNE DI LIVORNO E NEL TERRITORIO PROVINCIALE E LIMITROFO TRAMITE LE SOCIETÀ ED ENTI DEL G.A.P.

a) Interventi PNRR sul territorio comunale

Si elencano di seguito gli interventi PNRR candidati dalle società ed enti del Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) che impattano sul territorio Comunale, aggiornati alla data del 30/06/2026.

Società del Gruppo Pubblico Comunale: al 30 giugno 2026 l'importo complessivo dei contributi assegnati dal PNRR è di **€ 42.806.328,11**.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.**

M2C4I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

CUP I74E20001940008

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-22 Potenziamento e messa in sicurezza del sistema di adduzione dell'acquedotto di Livorno e Collesalveti, attualmente alimentato da un'unica condotta in fibrocemento lunga 45 Km, che presenta diverse criticità in parte sanate con l'attuale piano degli investimenti. Collegamento Stagno-Cisternone, ampliamento serbatoio Banditella, ampliamento serbatoio Cisternone, collegamento Parco Levante-Banditella, potenziamento impianto Mortaiolo con addolcitore.

Importo totale del finanziamento PNRR: € 9.380.465,00 (di cui FOI 3.070.000,00)

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Livorno-Collesalveti

Fine prevista: 31/03/2026 6 (rimodulata al 30/06/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

A2-22 Lotto 1

Importo finanziato PNRR: € 4.382.267,00 e FOI € 2.600.000,00 (importo QE progetto: € 14.922.079,84)

- Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Mortaiolo per il miglioramento della qualità e quantità dell'acqua prodotta: lavori in corso, consegna parziale 17/07/2024, ed in via definitiva in data 22/10/2024. Emesso il Certificato di Ultimazione lavori (CUL) in data 30/06/2026. Concessi n.60 giorni per il completamento di lavori marginali e di lieve entità in applicazione del Codice Appalti. In corso Collaudo Tecnico Amministrativo (Avanzamento lavori 90% - avanzamento contabile 83% - avanzamento finanziario 55%).

- Collegamento impianto Mortaiolo con serbatoio di Stagno: lavori in corso, avviati in data 08/01/2024 sono stati ultimati in data 15/01/2026, con Certificato di Ultimazione Lavori del 10/02/2026. Emesso anche il certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in data 16/07/2026. (Avanzamento lavori 100%).

A2-22 Lotto 2:

Importo finanziato PNRR: € 1.928.198,00 e FOI € 470.000,00 (importo QE progetto: € 3.582.000,69)

- Nuova condotta adduttrice Parco Levante-serbatoio Banditella e collegamento viale Boccaccio: lavori consegnati in data 19/08/2024 e terminati in data 30/06/2026. Emesso il Certificato di Ultimazione Lavori (CUL) in data 30/06/2026. In corso Collaudo Tecnico Amministrativo. (Avanzamento lavori 100% - avanzamento contabile 82% - avanzamento finanziario 59%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Autorità Idrica Toscana A.I.T**

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

CUP I45H22000040002

Oggetto: progetto HUB Livorno fanghi-forsu-biometano-upgrading della stabilizzazione anaerobica

Importo totale del finanziamento PNRR: € 10.000.000,00

Importo QE progetto: € 19.573.184,12

Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 30/06/2026 (rimodulata al 31/07/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Hub Livorno Fanghi-Forsu-Biometano: redatto e validato Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Aggiudicata in data 23/07/2024 la gara di appalto per l'affidamento di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture ed affiancamento e formazione post-intervento (contratto stipulato in data 21/10/2024).

Lavori avviati con consegna definitiva in data 10/02/2025. Emissione del Certificato ultimazione lavori al 31/07/2026, come da possibilità concessa dal MASE (Al 30/06 avanzamento lavori 90% - avanzamento contabile 80% - avanzamento finanziario 51%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Casa Livorno e Provincia s.p.a. CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045530002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 950.937,53

Ubicazione intervento: Via Passaponti 23/29 – Livorno

Ultimazione prevista: 31/03/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 06/03/2023

Proroga di 60 giorni concessa con prot. 2023/53930 del 3/11/23, seconda proroga di 45 giorni concessa con prot. 2024/2916 del 26/01/24, terza proroga di 34 giorni concessa con prot. 2024/8108 del 12/03/24 nuova scadenza prevista 31/03/24.

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 31/3/2024.

Collaudo

In data 06/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 224 del 18/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 3 del 10/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata attestata una economia di € 268.356,63 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0100346 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 950.937,53.

L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045540002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.644.827,69

Ubicazione intervento: Via Amendola 43 - Livorno

Ultimazione prevista: 19/04/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegna_ il 13/03/2024 – tempo assegnato gg 270

Proroga di 69 giorni concessa con Prot. 2023/61293 del 07/12/2023, seconda proroga di 64 giorni concessa con Prot. 2024/6664 del 21/02/24; nuova scadenza prevista 19/04/24. L'ultimazione effettiva dei lavori era prevista per la metà di luglio 2024.

Il cappotto è stato interamente realizzato, come le opere sulla terrazza di copertura. Sono state sostituite le caldaie, ma devono essere completate le linee gas e la successiva prova di tenuta. Sono iniziate e sono in fase di completamento le opere di sostituzione degli infissi.

Avanzamento Lavori: 100%

I lavori sono stati ultimati in data 12/7/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità.

I lavori sono stati completamente ultimati in data 11/9/2024.

Collaudo

Con Decisione CASALP n. 30 del 14/02/2025 A/T è stata nominata la Commissione per la redazione del Collaudo Tecnico/Amministrativo.

In data 27/1/2026 è stato emesso il collaudo Tecnico/Amministrativo. Il collaudo tecnico/amministrativo è stato approvato da CASA L.P. con Delibera del C.D.A. n. 6 del 12/3/2026.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045570002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 1.017.829,86

Ubicazione intervento: Via Passaponti 15/21- Livorno

Ultimazione prevista: 03/01/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 07/03/2023 - tempo assegnato gg 252

Proroga di 50 giorni concessa con Prot. 2024/380 del 09/01/2024. Nuova scadenza prevista 3/1/2024.

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 3/1/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità per i quali il D.L. ha concesso un maggior tempo di 50 gg.

In data 22/02/24 i lavori sono stati definitivamente conclusi.

Collaudo

In data 13/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 222 del 14/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 1 del 09/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata attestata una economia di € 201.464,30 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGRT_0100344 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 1.017.829,86.

L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045550002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 882.023,59

Ubicazione intervento: Via Passaponti 7/13 - Livorno

Ultimazione prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 01/03/2023 - tempo assegnato gg 252

Proroga di 53 giorni concessa con Prot. 2023/50228 del 27/10/23, nuova scadenza prevista 31/12/23.

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in data 2/1/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni per le quali il D.L. ha concesso un maggior tempo di 60 gg per il completamento. In data 29/02/24 i lavori sono definitivamente conclusi.

Collaudo

In data 21/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASAL.P. con Decisione n. 246 del 3/12/2024.

Con Decisione CASA L.P. n. 2 del 09/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata attestata una economia di € 337.270,57 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0099457 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASA L.P., con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l’elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l’importo complessivo di € 882.023,59.

L’economia è stata destinata ad altri interventi.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni**

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO. Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei Obiettivo 2: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private

CUP G44H22000050001

Oggetto: Intervento per l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nel Teatro C. Goldoni di Livorno

Importo totale del finanziamento PNRR: € 650.000,00

Importo cofinanziato dal Comune di Livorno: € 304.065,57

Importo autofinanziamento: € 65.608,64

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

I lavori si sono conclusi il 13/02/2024.

Le attività complessive per la realizzazione dell’intervento sono state concluse in data 22/02/2024, coerentemente alla autorizzazione ministeriale di differimento di fine lavori dal 31/12/2023 al 28/02/2024.

In data 7/8/24 è stata trasmessa la seconda rendicontazione al Ministero competente che, al 30/06/2025, risultava ancora in fase di controllo.

Il Comune ha provveduto, in data 12/3/2025, a saldare la fattura di quanto ancora residuava per il cofinanziamento di sua competenza.

Il Ministero in data 7/8/2025 ha provveduto ad effettuare il trasferimento relativo alla rendicontazione di agosto 2024 per un ammontare pari ad euro 165.344,28, raggiungendo in tal modo il 90% del contributo complessivamente trasferibile e dandoci la possibilità, il 2/9/25, di richiedere il saldo del 10% (euro 65.000).

Il 22/12/2025, dopo varie interlocuzioni con gli uffici del Ministero, è stata inoltrata la richiesta di saldo nella quale si dava evidenza che le spese finali, ivi incluse quelle ancora da saldare al realizzatore dell'intervento, alla predetta data del 22/12/2025, ammontavano a € 1.019.674,21 pari al 99,87% del costo ammesso al finanziamento PNRR. L'incasso del saldo (€ 65.000,00) è avvenuto in data 17/04/2026. .

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Accademia Tecnologica Edilizia ITS ATE**

Potenziamento offerta servizi istruzione. Investimento 1.5: sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS). Potenziamento dei laboratori per ITS Academy- Decreto 10 maggio 2023 n.84

CUP J44D23001220006

Oggetto: Laboratorio per ITS ATE

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.730.589,66

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Dicembre 2023: acquisizione CIG e avvio delle procedure degli affidamenti dei lotti previsti dai CIG.

Completamento procedure: entro 29/04/2024

Chiusura progetto LED: entro dicembre 2025

Potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy. Attività A.1 – Percorsi formativi di V livello EQF da 1.800 ore

CUP J44D23001220006

Oggetto: n.2 Corsi di Formazione

Importo totale del finanziamento PNRR: € 660.698,00

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 15/10/2026

Potenziamento di un ulteriore laboratorio per ITS Academy – Decreto del 26 maggio 2025 n. 82984

Manifestazione di interesse presentata il 9/06/2025

Oggetto: Laboratorio per ITS ATE "LED-2"

Importo totale del finanziamento PNRR: € 453.042,79

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/08/2026

b) Interventi PNRR con ricadute sul territorio provinciale e limitrofo

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **ASA SPA**

M2C4I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

CUP I24E20001140001

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-23: Sistema idrico Alta/Bassa Val di Cecina - Adduttrici, accumuli, risorse Val di Cecina (Lotti 1,2,3,4)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 782.224,76

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Cecina (LI)

Fine prevista: 30/06/2024 (rimodulata al 28/02/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lotto 2: Importo finanziato PNRR: € 782.224,76 (importo QE progetto: € 1.683.579,38)
Serbatoio del Paratino e annessa centrale di sollevamento: i lavori, avviati in data 09/10/2023, sono stati ultimati in data 28/02/2026, con Certificato di Ultimazione Lavori (C.U.L.) emesso il 10/03/2026. In corso Collaudo Tecnico Amministrativo. (Avanzamento lavori 100% - avanzamento contabile 100% - avanzamento finanziario 84%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese
Soggetto attuatore **A.I.T.**

M2C4I4.4 Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione Intervento "a regia MiTE – DG USSRI"

CUP I66D02000020008

Oggetto: Revamping e Riuso Irriguo del Depuratore di Campo alla Croce di Venturina (LI)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 6.632.313,49

Importo QE progetto: € 7.178.131,66 (rimodulato; stralci 1 e 2 oggetto di PNRR)

Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Venturina (LI)

Fine prevista: 31/03/2026 (rimodulata al 30/06/2026)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicato appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Validato progetto esecutivo. Avviati lavori in data 08/07/2024 (consegna parziale). Lavori consegnati in via definitiva in data 06/11/2024. Emesso il Certificato di Ultimazione Lavori (CUL) in data 30/06/2026 (stralcio 1 e stralcio 2 - costituenti intervento PNRR). In corso Collaudo Tecnico Amministrativo. (Avanzamento lavori 100% - avanzamento contabile 94% - avanzamento finanziario 88%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese
Soggetto attuatore **CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C92C21001860002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.245.024,46

Ubicazione intervento: Via Pertini 23/29 - Portoferraio (LI)

Ultimazione prevista: 31/10/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 15/05/2023 - tempo assegnato gg 210

Proroga di 150 giorni, nuova scadenza prevista 09/05/24 con Variante contrattuale approvata con Decisione n. 315 del 10/10/23 di importo netto € 96.785,85 per demolizione e rifacimento solaio e conseguenti in due appartamenti, utilizzo piattaforma elevatrice e conseguenti.

Proroga di 175 giorni concessa con prot. 2024/16842 del 10/05/24.

Ulteriore proroga di 120 giorni concessa con prot. 2024/46637 del 24/10/2024 – nuova scadenza prevista 28/2/2025.

Ultima proroga di 30 giorni concessa con prot. 2025/7418 del 28/02/2025 – nuova scadenza prevista 30/03/2025

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 30/03/2025 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità per i quali Il D.L. ha concesso un maggior tempo di 60 gg.

In data 26/05/2025 i lavori sono stati definitivamente conclusi.

Andamento lavori

Sono state ultimate le opere riguardanti il cemento armato. Sono terminate le opere del consolidamento

statico e riqualificazione energetica dell'edificio, tranne l'installazione delle pompe di calore.

Collaudo

In data 17/10/2025 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASAL.P. con Decisione n. 265 del 23/10/2025.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054490002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 535.801,25

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 466.693,11

Ubicazione intervento: Via C. Pisacane 66 - Piombino (LI)

Ultimazione prevista: 18/04/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 30/03/2023 - tempo assegnato gg 140

Proroga di 90 giorni concessa con Prot. 2023/36561 del 08/09/2023, sospensione di 77 giorni dal 26/9/2023 al 13/12/23, seconda proroga di 58 giorni concessa con Prot. 2024/4071 del 13/02/24 e terza proroga di 20 giorni concessa con Prot. 2024/15087 del 16/04/24. Nuova Scadenza prevista 18/04/24.

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 18/04/24

Collaudo

In data 13/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 223 del 14/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 41 del 04/03/2025 A/T è stato inoltra approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata a estata una economia di € 69.108,14 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGRT_0238242 del 09/04/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 466.693,11.

L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054500002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 426.161,14 + € 254.891,34 Decreto Regis 160 del 18/11/2022

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 587.812,86

Ubicazione intervento: Località Padreterno 2-4 - Rio (LI)

Ultimazione prevista: 22/11/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 29/03/2023 - tempo assegnato gg 120

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 23/11/2023 ad eccezione di alcune lavorazioni

In data 30/11/2023 è stato emesso il certificato di ultimazione definitiva dei lavori.

Collaudo

In data 29/4/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 86 del 6/5/2024

È stato predisposto il QTE di Collaudo per un importo complessivo di € 587.812,86.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie su altri interventi, è stato assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 587.812,86 a valere integralmente sul finanziamento PNRR PNC.

Con prot. 32017 del 8/8/2025 è stata inviata alla R.T. la rendicontazione a collaudo. A seguito richieste R.T. con prot. 40846 del 23/10/2025 e prot. 49839 del 18/12/2025 sono state inviate alcune integrazioni.

Al 31/12/2025 il QTE di collaudo risulta in attesa di Visto Regionale.
IL QTE di collaudo è stato approvato dalla R.T. con prot. AOOGR/2025/0992688 del 22/12/2025

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032790002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.528.936,00

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode

Ultimazione prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 26/06/2023 (primo alloggio)

Si prevede l'avvenuta realizzazione di tutti i lavori entro il 31/01/2026.

Avanzamento Lavori: 100%

Tutti i lavori nei 100 alloggi sono stati conclusi. Sono in corso di emissione i certificati di regolare esecuzione per le imprese appaltatrici dell'accordo quadro.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032800002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.730.468,55

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode

Ultimazione prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 14/06/2023 (primo alloggio)

Si prevede l'avvenuta realizzazione di tutti i lavori entro il 31/01/2026

Avanzamento Lavori: 100%

Tutti lavori nei 140 alloggi sono stati conclusi. Tutti i certificati di regolare esecuzione per le imprese appaltatrici dell'accordo quadro sono stati emessi nel mese di maggio 2026.

È in corso la quantificazione delle economie per la realizzazione di lavori in ulteriori alloggi previa approvazione della Regione Toscana.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP: C99J21054500002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto: € 576.181,55 (elenco B – intervento di riserva)

Ubicazione intervento: Via Togliatti 3/5

A seguito richiesta CASA L.P., con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie su altri interventi, è stato spostato il presente intervento dall'elenco B "intervento di riserva" all'elenco "A" assegnato al presente intervento l'importo complessivo di € 576.181,55.

A seguito della progettazione dell'intervento CASA L.P. pertanto ha indetto la procedura di gara per l'appalto dei lavori.

A seguito dello svolgimento della procedura di gara i lavori sono iniziati in data 28/10/2025

L'ultimazione dei lavori è prevista per il 12/4/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 28/10/2025

Proroga di 60 giorni concessa con prot. 2023/13208 del 2/4/2024.

Ultimazione dei Lavori: 11/06/2026 ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità per le quali è stato concesso un maggior tempo di giorni 25 (fine lavori definitiva prevista per il 6/7/2026).

5. DAGLI INVESTIMENTI AI RISULTATI: GLI INTERVENTI CONCLUSI E IL VALORE PUBBLICO PRODOTTO

M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La pianificazione e la gestione dei progetti PNRR per la transizione digitale

L'attuazione dei numerosi progetti PNRR in materia di digitalizzazione è stata preceduta e accompagnata da un'attività strutturata di pianificazione, che ha consentito di ricondurre i singoli interventi — pur eterogenei per avvisi di riferimento, requisiti tecnici e scadenze — a un unico disegno strategico. Tale impostazione ha permesso di coordinare in modo unitario la programmazione delle attività, l'allocazione delle risorse professionali e tecnologiche e il monitoraggio costante dell'avanzamento, assicurando il presidio degli adempimenti previsti e la coerenza complessiva degli interventi.

Obiettivi della pianificazione:

Raggiungere target e milestone

Condizione indispensabile per la regolare liquidazione dei finanziamenti di ciascun progetto.

Costruire basi tecnologiche abilitanti

Per sviluppare servizi digitali moderni, semplici, accessibili, integrati e sicuri.

Generare risorse residue

Da un impiego ottimale dei fondi, da destinare — oltre le scadenze PNRR — a evoluzione digitale, nuovi servizi e tecnologie come droni, IA e digital twin.

La gestione finanziaria e la costituzione delle risorse residue

La gestione finanziaria dei progetti è stata condotta secondo criteri di economicità e di efficienza, attraverso un'attenta programmazione degli acquisti e la piena valorizzazione delle competenze interne. Tale approccio ha consentito di realizzare integralmente gli obiettivi progettuali contenendo al tempo stesso la spesa effettiva entro valori inferiori agli importi finanziati.

Le economie così generate hanno permesso di costituire una dotazione finanziaria residua che assicura continuità al percorso di trasformazione digitale dell'Ente anche oltre l'orizzonte temporale del PNRR, superando la logica della progettualità straordinaria e a termine e consolidando la digitalizzazione come processo strutturale e permanente del Comune di Livorno.

Le linee di intervento del prossimo triennio

Nel prossimo triennio le risorse residue potranno essere destinate al sostegno delle seguenti linee di attività:

Cloud prosecuzione della migrazione in cloud degli applicativi critici, su infrastrutture qualificate e sicure.

Servizi digitali ammodernamento degli applicativi secondo i principi user-centric, once-only e digital & mobile first.

Accessibilità + IA chatbot informativi multimodali e multilingue per cittadini e imprese.

Produttività + IA intelligenza artificiale a supporto di procedimenti e decisioni amministrative.

Open data rafforzamento della data governance, con approccio open data by design e by default.

Nuove piattaforme acquisizione di nuovi software e piattaforme digitali.

Digital twin sviluppo del gemello digitale del Comune, a supporto di decisioni basate sui dati.

Droni prosecuzione delle sperimentazioni per il monitoraggio ambientale e architettonico.

Cybersecurity potenziamento della sicurezza informatica di infrastrutture e dati.

MESSAGGIO CHIAVE: L'insieme di tali linee di intervento configura una prospettiva di sviluppo continuativa, nella quale i risultati conseguiti con il PNRR non rappresentano un traguardo conclusivo, ma la base infrastrutturale e organizzativa su cui proseguire l'innovazione dei servizi al cittadino e dell'azione amministrativa.



PAGO PA

Risultato conseguito

Integrazione di 25 nuovi servizi con la piattaforma nazionale PagoPA.

Valore pubblico generato

- pagamenti più semplici e sicuri;
- riduzione dei tempi di incasso;
- maggiore trasparenza dei pagamenti verso la PA;
- minori attività manuali per gli uffici.
- Maggiore efficienza



PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI

Risultato conseguito

Integrato il sistema nazionale per la gestione delle notifiche digitali a valore legale. Attivate per la notifica delle violazioni al codice della strada.

Valore pubblico generato

- comunicazioni più rapide;
- riduzione dei costi di spedizione;
- maggiore certezza della notifica;
- semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese.
- Semplificazione per l'utente



SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

Risultato conseguito

Rinnovo del sito con riorganizzazione dei contenuti e rinnovati i servizi digitali comunali secondo gli standard nazionali, con la completa digitalizzazione di 6 nuovi servizi.

Valore pubblico generato

- servizi disponibili online 24 ore su 24;
- riduzione degli accessi agli sportelli;
- migliore esperienza d'uso;
- incremento dell'inclusione digitale.



CLOUD

Risultato conseguito

Migrazione delle infrastrutture digitali comunali finanziate dal bando verso il cloud qualificato. In particolare sono stati migrati in cloud su infrastruttura sicura 21 servizi.

Valore pubblico generato

- maggiore affidabilità dei servizi;
- continuità operativa;
- riduzione dei rischi tecnologici;
- infrastrutture più moderne e resilienti.



CYBERSECURITY

Risultato conseguito

Potenziato il sistema di sicurezza informatica dell'Ente.

Valore pubblico generato

- maggiore protezione dei dati personali;
- riduzione del rischio di attacchi informatici;
- continuità dei servizi essenziali;
- rafforzamento della fiducia dei cittadini.



CITIZEN INCLUSION – ACCESSIBILITÀ

Risultato conseguito

Migliorata l'accessibilità dei servizi digitali comunali e rafforzate le competenze interne finalizzate alla produzione di contenuti accessibili. Forniti nuovi ausili informatici al personale comunale con disabilità.

Valore pubblico generato

- servizi utilizzabili anche dalle persone con disabilità;
- riduzione delle barriere digitali;
- piena inclusione nell'accesso ai servizi pubblici.
- Maggiore capacità di produzione documentale accessibile



ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE E STATO CIVILE DIGITALE

Risultato conseguito

Integrazione con l'Anagrafe Nazionale per i servizi di Stato Civile.

Valore pubblico generato

- semplificazione amministrativa;
- riduzione della documentazione cartacea;
- maggiore interoperabilità con le altre amministrazioni.



APP IO

Risultato conseguito

Integrazione di 18 ulteriori servizi comunali con l'App IO.

Valore pubblico generato

- un unico punto di accesso ai servizi pubblici;
- maggiore prossimità tra Comune e cittadini;
- comunicazioni immediate;
- incremento dell'utilizzo dei servizi digitali.



PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Risultato conseguito

Attivata l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Sono stati pubblicati

Valore pubblico generato

- scambio automatico delle informazioni tra amministrazioni;
- riduzione delle richieste di documenti ai cittadini;
- procedimenti più rapidi.



FACILITAZIONE DIGITALE

Risultato conseguito

Attivati servizi di accompagnamento all'utilizzo dei servizi digitali.

Eroga circa 5800 attività di facilitazione digitale a circa 4000 cittadini.

Valore pubblico generato

- contrasto al digital divide;
- maggiore autonomia digitale dei cittadini;
- inclusione delle fasce più fragili della popolazione.
- Ampliamento del numero di cittadini che hanno utilizzato i servizi pubblici digitali



SUAP E SUE

Risultato conseguito

Adeguamento tecnologico (Interoperabilità) per la completa digitalizzazione delle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive e dell'Edilizia.

Valore pubblico generato

- pratiche completamente digitali;
- riduzione dei tempi procedurali;
- maggiore trasparenza;
- semplificazione per professionisti e imprese.



SUAP E SUE – ENTI TERZI

Risultato conseguito

Adeguamento tecnologico (Interoperabilità) per l'Integrazione degli enti coinvolti nei procedimenti SUAP.

Valore pubblico generato

- maggiore coordinamento istituzionale;
- riduzione dei passaggi amministrativi;
- procedimenti più rapidi e integrati.

M5C2 INCLUSIONE E AUTONOMIA: I RISULTATI DEI PROGETTI SOCIALI

Indicatore	Risultato	Output / infrastrutture
Famiglie sostenute	30	
Anziani accompagnati	100	
Pacchetti domiciliari	137	
Ore di supervisione	1.257	
Posti nei percorsi per la disabilità	24	Ristrutturati 4 appartamenti × 24 beneficiari
Beneficiari Housing First	27	Ristrutturati 2 appartamenti × 7 beneficiari
Persone raggiunte dalla Stazione di Posta	82	Ristrutturato 1 immobile

I progetti sociali del PNRR hanno trasformato risorse finanziarie in servizi, abitazioni, tecnologie assistive e percorsi personalizzati. I target sono stati raggiunti e, in alcuni casi, superati, rafforzando l'autonomia delle persone e la capacità del sistema territoriale di rispondere alle fragilità.

1.1.1. PIPPI, SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI

Raggiunte n. 30 famiglie beneficiarie completando così l'obiettivo target del progetto¹.

Valore Pubblico

-  tutela dei minori
-  famiglie più autonome
-  prevenzione del disagio

1.1.2. ANZIANI, AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

A mezzo dell'azione diffusa sono stati individuati n. 100 anziani (n. beneficiari target del progetto).²

- accompagnamento domiciliare
- installati dispositivi domotici presso i propri domicili
- assistenza personalizzata

Valore Pubblico

-  Più autonomia, maggiore sicurezza e permanenza nel proprio ambiente di vita.

1.1.3. DOMICILIARITA', RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE

Soggetto Sub Attuatore Azienda USL Toscana Nord Ovest. Entro il 30/06/2026 sono stati attivati e conclusi n. 137 pacchetti di prestazioni di servizio di assistenza domiciliare completando così l'obiettivo target del progetto (n.125 pacchetti) e realizzando ulteriori 12 pacchetti extra target.

¹ Raggiunte n. 30 famiglie vulnerabili che hanno preso parte alle edizioni 2023/2024- modulo start- e 2024/2025 modulo base- del progetto in oggetto e all'edizione 2025/2026 - modulo base 2 - del progetto.

² individuate dall'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, volte alla valorizzazione dell'autonomia residua.

Valore Pubblico

- meno ricoveri
- più assistenza a domicilio
- continuità delle cure

1.1.4. SUPERVISIONE, RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

1.257 ore complessive di cui:

- 475 ore supervisione di gruppo³
- 372 ore supervisione individuale
- 410 ore equipe integrate⁴

Valore Pubblico

- Operatori più preparati significano servizi migliori per i cittadini

1.2 DISABILITA', PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

12 persone disabili coinvolte⁵

- corsi di formazione sui dispositivi ICT e attività laboratoriali
- inserimento lavorativo
- dispositivi ICT per lavoro a distanza

Ristrutturato immobile (Via Verdi n. 55)

- 6 persone

Ristrutturato immobile (Via degli Asili n.47)

- 6 persone

Valore Pubblico

- Dal sostegno assistenziale al progetto di vita indipendente

1.2 DISABILITA', PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

Ristrutturati 2 appartamenti (Via Piave 20) Soggetto Sub Attuatore Azienda USL Toscana Nord Ovest⁶

- 12 posti, 6 persone ciascuno
- Installate dotazioni ICT

Inaugurazione ufficiale si è svolta in data 07/04/2026.

1.3.1. HOUSING FIRST

20 persone accolte⁷:

³ Avviato a partire da dicembre 2023 il percorso per la supervisione mono professionale di gruppo e individuale rivolto agli assistenti sociali e volto alla prevenzione del burn out. Per tutte le annualità interessate dal progetto è stato raggiunto e superato il livello essenziale della prestazione di cui al Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

⁴ Realizzate per la supervisione A3 di equipe che ha coinvolto anche il personale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

⁵ I beneficiari in ragione del proprio progetto personalizzato sono stati destinatari- nell'ambito della procedura di coprogettazione ai sensi del codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 avviata con Determinazione dirigenziale n. 4980 del 25/06/25- di corsi di formazione sui dispositivi ICT e attività laboratoriali volte ad implementare il grado di autonomia nonché di percorsi di orientamento e inserimento lavorativo. I medesimi beneficiari hanno ricevuto la dotazione di dispositivi per il lavoro a distanza e sono stati assegnati ai due gruppi appartamenti siti in Via Verdi n.55 e Via degli Asili n.47 la cui ristrutturazione è stata finanziata con risorse PNRR e si è conclusa nel mese di giugno 2026.

⁶ In data 14/11/2024 è stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario dei lavori. In data 09/12/2024 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori degli appartamenti. In data 27/03/2026 è stata presentata SCIA per servizi. In data 07/04/2026 è stata inaugurata la struttura fornita delle dotazioni ICT richieste e all'interno dei quali sono stati inseriti i beneficiari del progetto.

⁷ Realizzata la coprogettazione in linea con il cronoprogramma. Raggiunti n.15 beneficiari, individuati in persone in situazioni di grave marginalità sociale, presso le strutture ponte. L'obiettivo target di Progetto PNRR, che consiste nel dare accesso ad uno spazio abitativo per n.15 beneficiari per

- 15 Target PNRR
- 5 extra target

Ristrutturato immobile (Comune di Collesalveti via San Martino)⁸

- 5 posti

Ristrutturato immobile (Via Bonomo n. 10)

- 2 posti

Entrambe concluse entro la scadenza del 30/06/2026

Valore Pubblico

- La casa diventa il punto di partenza per il reinserimento sociale

1.3.2. STAZIONI DI POSTA

82 beneficiari raggiunti in situazioni di grave marginalità sociale

- Campagna sensibilizzazione dei servizi attraverso social, comunicati stampa e volantinaggio
- Accesso ad almeno un servizio essenziale

Ristrutturazione immobile (via Giuseppe Maria Terreni n. 9)⁹

Inaugurazione ufficiale si è svolta in data 16/07/2026.

Valore Pubblico

- Un presidio stabile contro l'emarginazione

Il risultato complessivo

I progetti hanno rafforzato il sistema sociale territoriale, trasformando gli investimenti PNRR in maggiore autonomia, sicurezza e dignità per le persone. Famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di marginalità hanno ricevuto risposte personalizzate, mentre la collaborazione tra Comune, Azienda USL, Terzo settore e ricerca ha reso i servizi più integrati e strutturali.



un periodo di almeno 6 mesi, è stato raggiunto. Sempre grazie alle strutture ponte sono stati individuati anche n. 5 utenti extratarget. L'obiettivo extra target è stato valorizzato In Regis.

⁸ Rif. N.C.E.U. Foglio 90- Particella 2026

⁹ Accessibile anche dal civico n. 7. La predetta struttura definitiva coincide con quella ponte.

M1C3 MUSEO CIVICO FATTORI – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI

Obiettivo raggiunto

Il progetto ha trasformato il Museo Civico "Giovanni Fattori" in uno spazio culturale più accessibile e inclusivo, ampliando le possibilità di fruizione del patrimonio artistico da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive.

Risultati conseguiti:

Nuovi percorsi accessibili

- realizzato un percorso privo di barriere dall'ingresso del parco al Museo;
- migliorata l'accessibilità della struttura anche in coerenza con il PEBA.

Accessibilità per persone non vedenti e ipovedenti

- installate mappe tattili;
- realizzate riproduzioni tattili di alcune opere simbolo del Museo;
- introdotte didascalie in Braille.

Innovazione digitale


- sviluppata l'App Visit Fattori per offrire un'esperienza museale anche a distanza e personalizzare la visita.

Migliore accoglienza

- nuova segnaletica esterna;
- percorsi di visita più semplici e inclusivi.

Valore pubblico generato

Il progetto ha reso il Museo Civico "Giovanni Fattori" un luogo più accessibile, inclusivo e digitale, consentendo a un numero sempre maggiore di cittadini e visitatori di vivere il patrimonio culturale della città senza barriere.

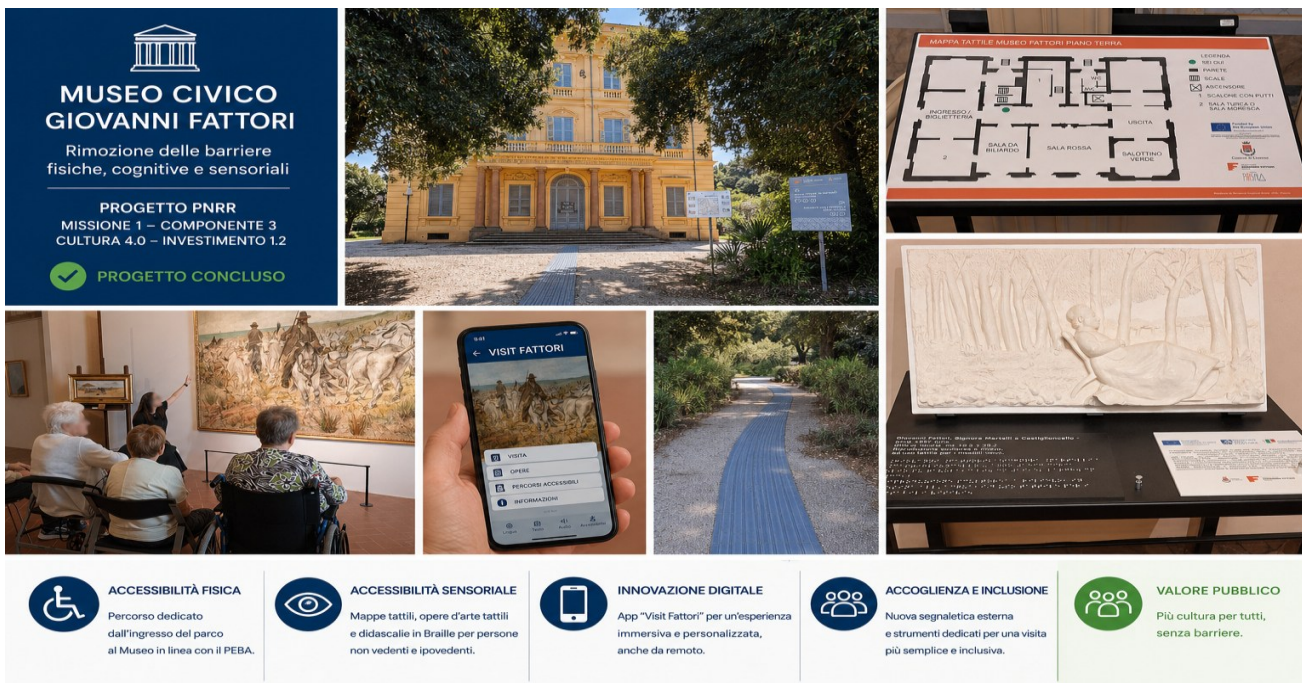

6. Attività di governance, monitoraggio e adeguamento finanziario

Alla data del **30 giugno 2026** è proseguita in modo continuativo l'attività di governance, monitoraggio e coordinamento degli interventi PNRR, con particolare attenzione ai progetti caratterizzati da maggiore complessità attuativa.

Nel corso del semestre, la **Cabina di Regia tecnico-politica** si è riunita nelle date del **10 febbraio 2026** e del **12 maggio 2026**. In tali sedi è stato esaminato lo stato di avanzamento degli appalti PNRR, con approfondimento delle principali criticità emerse e delle relative misure correttive, con specifico riferimento agli interventi **PINQuA**, che presentano i profili attuativi più complessi.

In data **13 maggio 2026** si è inoltre svolta, presso la **Prefettura di Livorno**, la Cabina di coordinamento dedicata al monitoraggio e al supporto degli enti territoriali, finalizzata a favorire un'efficace attuazione dei programmi e degli interventi PNRR in ambito provinciale.

Parallelamente, nel primo semestre 2026 si sono tenuti **n. 6 tavoli tecnici** del Gruppo di Lavoro "Staff Programmi e Progetti speciali legati al PNRR", nell'ambito dei quali sono stati puntualmente analizzati lo stato di attuazione dei singoli interventi e le principali problematiche operative, tecniche e amministrative.

Sul piano della programmazione finanziaria, sono state infine approvate **n. 2 variazioni al DUP** e **n. 4 variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028**, necessarie ad adeguare gli stanziamenti e ad assicurare la corretta contabilizzazione delle risorse connesse agli interventi PNRR.

FATTI INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2026

Interventi PINQuA - attività svolte in prossimità della scadenza del 14 agosto 2026

Successivamente al 30 giugno 2026 è proseguita con particolare intensità l'attività finalizzata al rispetto della scadenza ministeriale del 14 agosto 2026 per gli interventi PINQuA relativi a CRAL, ex Caserma Lamarmora, Parcheggio del Corona e Quartiere Stazione. Le attività si sono concentrate sul completamento degli adempimenti amministrativi, tecnici e finanziari necessari alla rendicontazione e all'attestazione del conseguimento dei target PNRR.

Ambito di attività	Attività svolta	Esito / finalità
Atti amministrativi	Completato l'iter delle determinazioni dirigenziali conseguenti alle deliberazioni di Giunta con oggetto varianti progettuali e divisione per stralci funzionali.	Chiusura degli adempimenti amministrativi propedeutici alla rendicontazione.
Avanzamento finanziario	Emessi i certificati di pagamento e aggiornati i dati finanziari sulla piattaforma ReGiS.	Incremento della spesa rendicontata e rappresentazione aggiornata dell'avanzamento finanziario.
Istruttoria tecnica	Completate le istruttorie della documentazione tecnica necessaria alla verifica del raggiungimento dei target.	Predisposizione del quadro documentale richiesto dal Ministero.
Ultimazione lavori - Stralci n. 1	Predisposti i Certificati di ultimazione lavori degli Stralci n. 1, sottoscritti da Impresa, Direttore dei lavori e RUP.	Attestazione del raggiungimento del target, anche parziale.
Documentazione PNRR	Predisposte dichiarazioni di completamento, attestazioni di tagging climatico, relazioni illustrative, checklist target, documentazione fotografica e documentazione DNSH.	Completamento del set documentale richiesto ai fini della verifica ministeriale.
Sottoscrizioni e validazioni	Acquisite le firme e le validazioni di competenza del RUP, del Direttore dei lavori, delle imprese e del Soggetto Attuatore di I livello.	Regolarizzazione formale della documentazione.
Caricamento su ReGiS	Caricata sulla piattaforma ReGiS la documentazione disponibile entro la scadenza ministeriale.	Adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
Coordinamento interno	Rafforzato il coordinamento tra strutture tecniche, amministrative e organi dell'Ente.	Presidio unitario della scadenza del 14 agosto 2026.
