



COMUNE DI LIVORNO



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION

31 dicembre 2025




DIREZIONE GENERALE
Ufficio Coordinamento e Monitoraggio Programmazioni Settoriali e PNRR

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. Gli interventi della Città.....	3
3. Stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre 20258
4. Andamento finanziario degli interventi PNRR.....	32
5. Interventi PNRR messi a terra nel Comune di Livorno e nel territorio provinciale e limitrofo tramite le società ed enti del G.A.P.	34
6. Conclusioni e aggiornamento normativo.....	43
Tabella 1 - Suddivisione per Missioni	3
Tabella 2 - Suddivisione per Ministero titolare	4
Tabella 3- Suddivisione per settore dell'Ente	5
Tabella 4 - Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni.....	5
Tabella 5 - Andamento di cassa interventi non fuori usciti dal PNRR - annualità 2021/2025.....	33
Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti	31

1. PREMESSA

Modello organizzativo del PNRR:

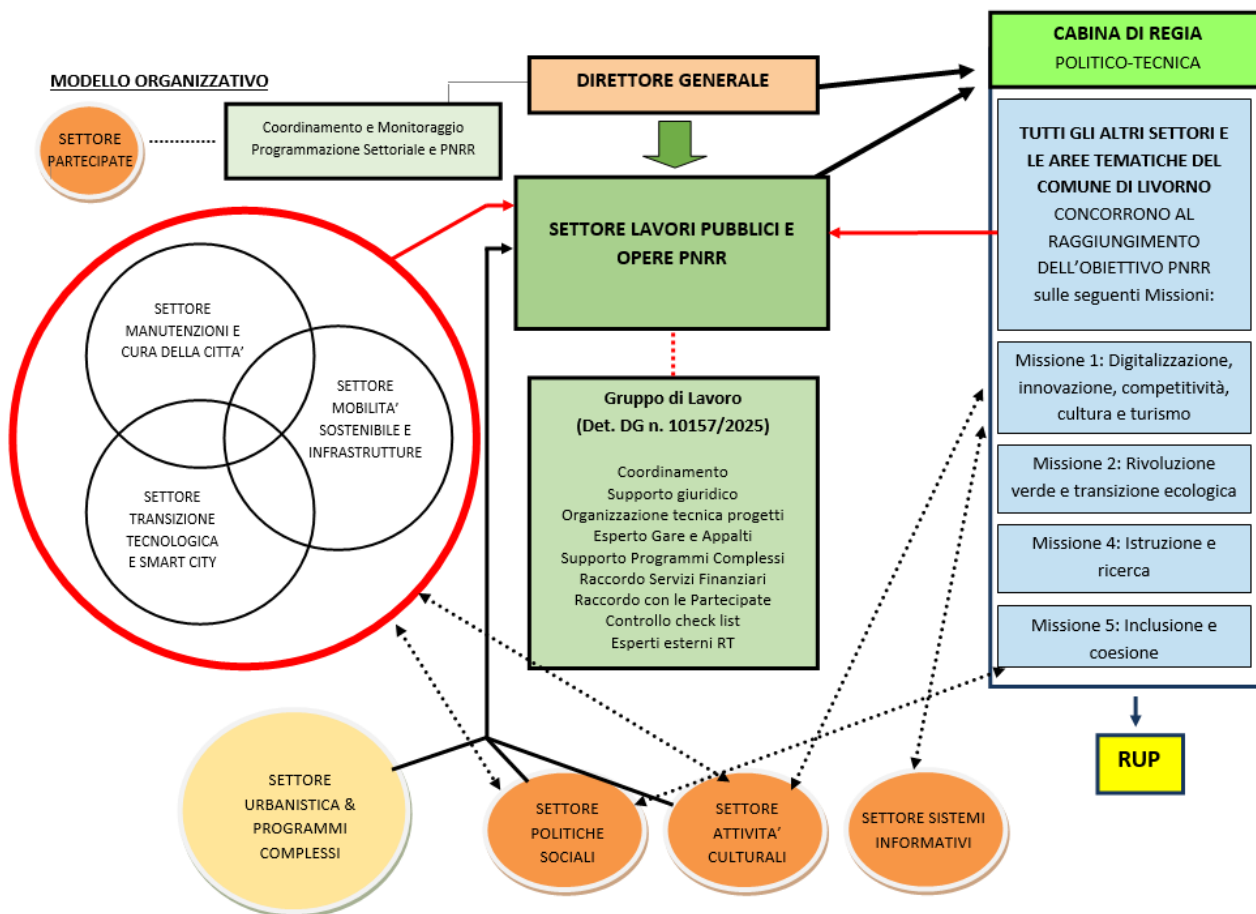

La relazione prende in considerazione gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Livorno sia in qualità di soggetto attuatore, e quindi direttamente beneficiario dei finanziamenti PNRR, sia come soggetto sub attuatore, aggiornandoli al **31 dicembre 2025**.

I dati analizzati sono stati rilevati dal programma di contabilità dell'ente e dal sistema informativo "ReGiS" che rappresenta la piattaforma unica attraverso la quale le Amministrazioni devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal PNRR.

Si intende pertanto illustrare il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza per la città di Livorno e la sua attuazione, evidenziando i progressi compiuti nel suo complessivo avanzamento alla data del 31 dicembre 2025, aggiornando anche la situazione finanziaria degli interventi PNRR, con riferimento alle risorse incassate in seguito all'erogazione da parte delle Amministrazioni titolari a titolo di anticipo e ai relativi pagamenti effettuati dall'ente.

Si ricorda infine che vi sono anche n. 16 interventi candidati dalle società e dagli enti appartenenti al Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) (in corso è subentrato un nuovo intervento di CASALP) che impattano sul territorio Comunale e provinciale, di cui è stata fatta specifica illustrazione nel precedente

numero di questa rivista e dei quali pubblichiamo qui un aggiornamento alla data del 31/12/2025. Il valore complessivo dei finanziamenti PNRR di tali opere ammonta ad € 42.806.328,11.

Il valore complessivo degli interventi nel territorio livornese, considerando sia quelli di cui il Comune è soggetto attuatore, che quelli del G.A.P., ammonta ad € 119.128.050,05.

.....

Legenda delle Misure PNRR aggiornata con l'aggiunta della Missione 7 (RePowerEU)

LEGENDA	
PNRR	MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA
	MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
	MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
	MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA
	MISSIONE 5 COESIONE E INCLUSIONE
	MISSIONE 6 SALUTE
	MISSIONE 7 RePowerEU

Per far fronte alla crisi causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, l'Unione europea ha avviato un nuovo programma energetico. Si tratta del cosiddetto **RepowerEu**, entrato definitivamente in vigore con l'approvazione del regolamento 2023/435.

Il piano energetico europeo, da integrare nei Pnrr, prevede l'invio di risorse agli Stati membri per finanziare progetti sull'energia. Lo scopo, tra gli altri, è quello di ridurre al minimo la dipendenza europea dalle importazioni russe.

Per accedere ai fondi messi a disposizione, gli stati dovevano inserire un nuovo capitolo all'interno dei rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr).

La **Missione 7 RePowerEU** ha lo scopo di offrire un supporto al sistema produttivo per realizzare la transizione ecologica, per rafforzare le reti di distribuzione di energia, per accelerare la produzione da fonti rinnovabili, per aumentare l'efficienza energetica e creare competenze sul tema green nel settore pubblico e privato.

.....

Localizzazione interventi PNRR

Sul sito istituzionale della città di Livorno, all'interno della sezione PNRR-Next Generation, è possibile localizzare i vari interventi PNRR sul territorio della città sulla mappa pubblicata.

(Indirizzo web: https://www.comune.livorno.it/it/documenti_publici/pnrr-next-generation-livorno-sintesi-e-stato-di-avanzamento)

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2025

In data **10/02/2026** è stata convocata la Cabina di Regia politico-tecnica, al fine di discutere dello stato di attuazione dei progetti PNRR alla luce anche del positivo incontro svoltosi a gennaio 2026 con il coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. GLI INTERVENTI DELLA CITTÀ

La città di Livorno è attualmente soggetto attuatore di n. 34 interventi finanziati. Tali progetti sono suddivisi tra 3 Missioni, per un ammontare complessivo di risorse pari a **76.321.721,94 euro**.


Di questi:

€ 63.149.132,54 euro sono trasferimenti ministeriali PNRR (57.810.918,18 euro + 5.338.214,36 euro di FOI)
€ 13.172.589,40 costituiscono invece il cofinanziamento dell'ente.

Nella *Tabella 1* si riporta l'**ammontare complessivo delle opere, comprensivo sia dei finanziamenti ministeriali, sia delle risorse proprie dell'ente**, così come sono stati suddivisi su 3 missioni del PNRR. Come possiamo vedere, più della metà delle risorse, pari al 64,35% è allocato sulla Missione M5 "Inclusione e coesione", seguita dal 30,33% sulla Missione M4 "Istruzione e ricerca". La Missione M1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" riporta un incremento rispetto al precedente monitoraggio al 30 giugno 2025, in quanto in tale Missione è stato ammesso a finanziamento un nuovo progetto.

Tabella 1 - Suddivisione per Missioni


Missione	Valore complessivo	Percentuale
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	4.057.582,07	5,32
M4 - Istruzione e ricerca	23.149.999,96	30,33
M5 - Inclusione e coesione	49.114.139,91	64,35
	76.321.721,94	100,00

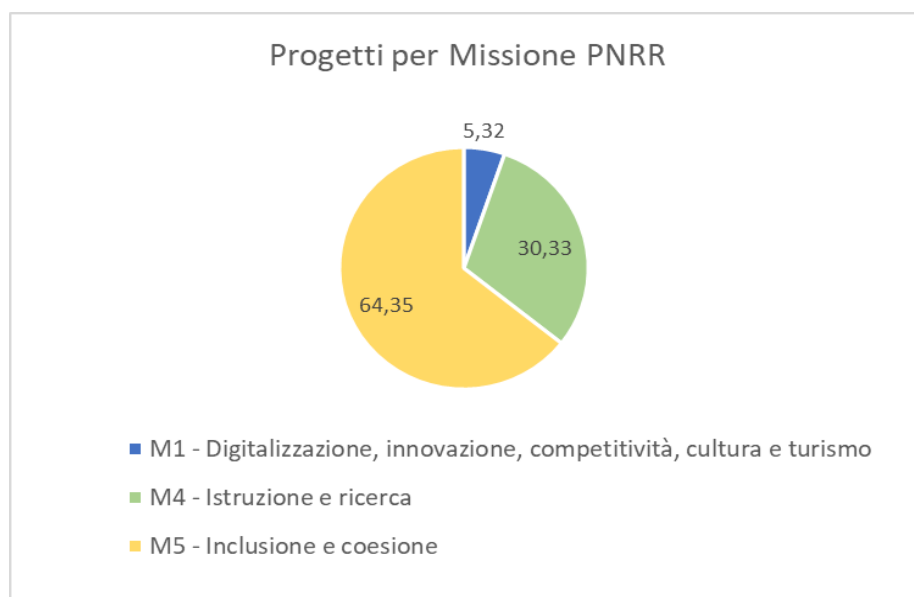

Nella *Tabella 2* si riporta l'ammontare dei finanziamenti ministeriali PNRR, suddiviso sulla base delle Amministrazioni titolari degli interventi. Possiamo vedere che il Comune di Livorno ha un maggior trasferimento di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 51,77%, seguito dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il 22,22% e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il 10,20%.

Tabella 2 - Suddivisione per Ministero titolare

Ministero	Finanziamenti PNRR	Percentuale
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	3.430.234,87	5,43
Cultura	500.000,00	0,79
Istruzione e del merito	14.034.757,76	22,22
Infrastrutture eTrasporti	32.692.663,11	51,77
PCM - Dipartimento Sport	3.850.000,00	6,10
Interno	2.200.000,00	3,48
Lavoro e Politiche sociali	6.441.476,80	10,20
Totale	63.149.132,54	100,00

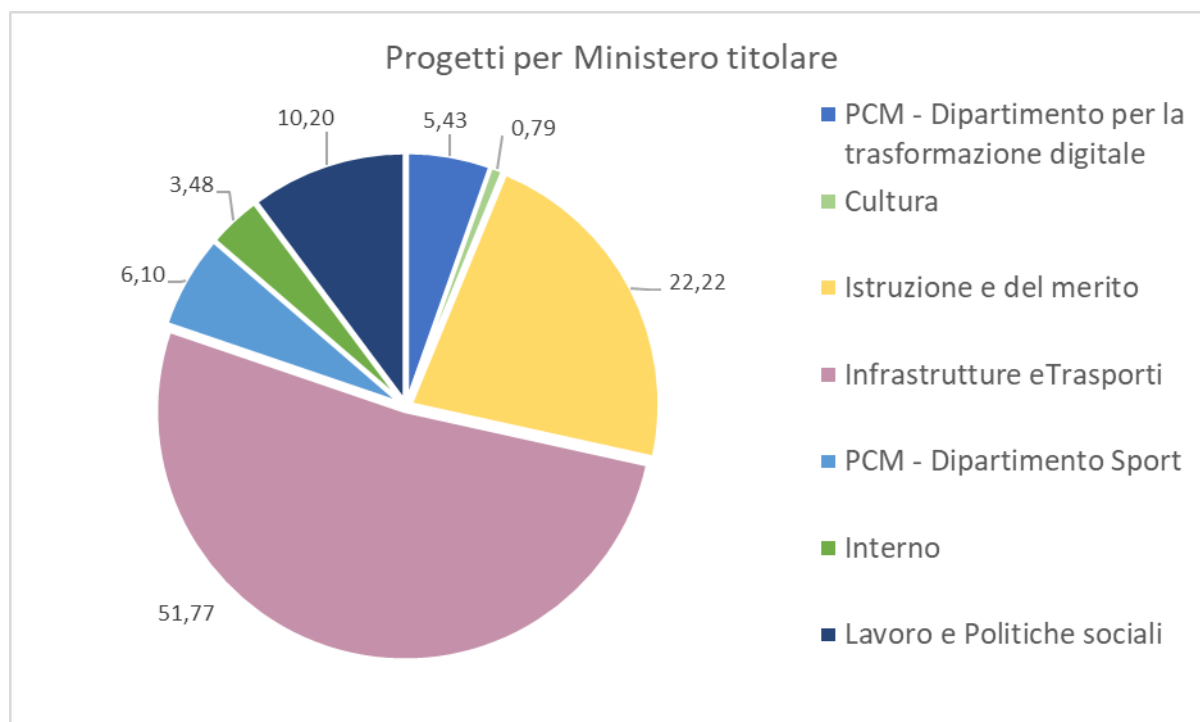

Nella *Tabella 3* si riporta l'ammontare del valore complessivo delle opere PNRR suddiviso sulla base dei settori dell'Ente, titolari degli interventi.

Tabella 3 - Suddivisione per settore dell'Ente

Settore	Risorse	Percentuale
Lavori pubblici e opere PNRR	65.092.663,07	85,29
Sistemi informativi	3.430.234,87	4,49
Attività culturali e musei	627.347,20	0,82
Politiche sociali e sociosanitarie	7.171.476,80	9,40
Totale	76.321.721,94	100,00

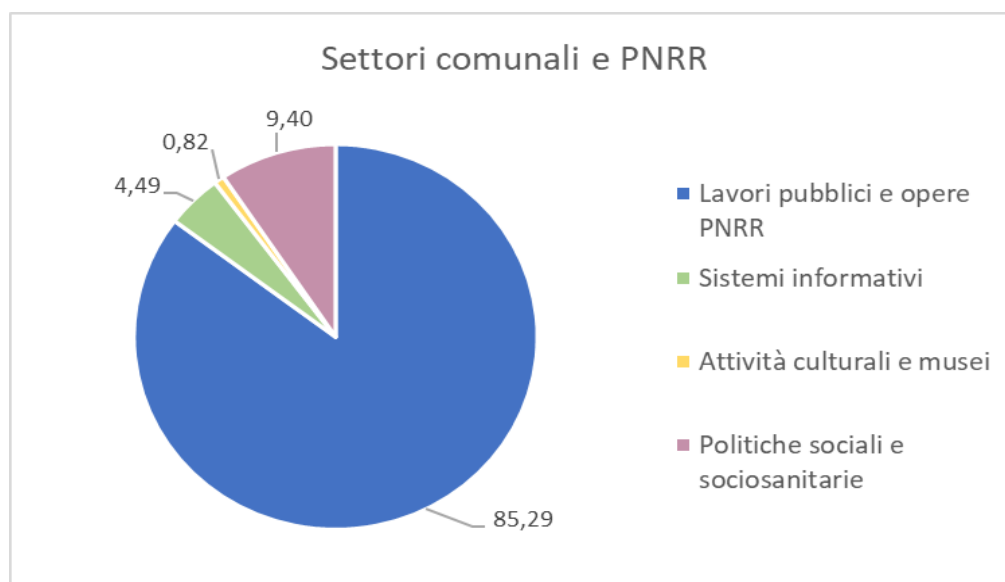


Tabella 4 – Oggetto dei progetti suddivisi per Missioni

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Dip. Trasformazione digitale	M1C1 I1.2	Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni	1.031.574,00	-	1.031.574,00	1,35
	M1C1 I1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni	203.435,00	-	203.435,00	0,27
	M1C1 I1.3.1	Piattaforma digitale nazionale dati - Archivio Nazionale dei Numeri Civici	73.190,48	-	73.190,48	0,10
	M1C1 I1.4.1	Servizi e cittadinanza digitale	516.323,00	-	516.323,00	0,68
	M1C1 I1.4.3	Adozione piattaforma PAGOPA	112.627,00	-	112.627,00	0,15
	M1C1 I1.4.3	Adozione "App IO" Comuni	54.950,00	-	54.950,00	0,07
	M1C1 I1.4.5	Piattaforma notifiche digitali Comuni	69.000,00	-	69.000,00	0,09
	M1C1 I1.7.2	Centri di facilitazione digitale	30.000,00	-	30.000,00	0,04
	M1C1 I1.4.2	Citizen Inclusion - Miglioramento accessibilità servizi pubblici digitali	234.000,00	-	234.000,00	0,31
	M1C1 I1.5	Cybersecurity	978.000,00	-	978.000,00	1,28
	M1C1 I2.2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni	54.482,39	-	54.482,39	0,07
	M1C1 I2.2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Enti terzi - Comuni	53.011,00	-	53.011,00	0,07
	M1C1 I1.4.4	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)- Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	19.642,00	-	19.642,00	0,03
		Totale		3.430.234,87	-	3.430.234,87

CULTURA E TURISMO						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Cultura	M1C3 I1.2	Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori	500.000,00	127.347,20	627.347,20	0,82

ISTRUZIONE E RICERCA						
Ministero	Interventi	Oggetto	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Istruzione e merito	M4C1 I1.1	Rifunzionalizzazione Scuola infanzia Via Poerio come Centro polifunzionale per la famiglia	2.170.000,00	-	2.170.000,00	2,84
	M4C1 I1.1	Asilo nido Pirandello, Via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture	1.896.000,00	844.000,00	2.740.000,00	3,59
	M4C1 I3.3	Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino	5.280.000,00	-	5.280.000,00	6,92
	M4C1 I3.3	Nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero	2.520.000,00	-	2.520.000,00	3,30
	M4C1 I3.3	Nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel – nuova scuola primaria e secondaria di 1° grado	2.168.757,76	8.271.242,20	10.439.999,96	13,68
		Totale		14.034.757,76	9.115.242,20	23.149.999,96

INCLUSIONE E COESIONE						
Ministero	Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA)		Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
Infrastrutture e trasporti	M5C2 I2.3	Cisternone - riqualificazione quartiere Stazione	13.195.999,87	-	13.195.999,87	17,29
	M5C2 I2.3	Cisternone - riqualificazione parco Pertini	2.639.722,46	-	2.639.722,46	3,46
	M5C2 I2.3	Cisternone - parcheggio Del Corona	1.323.654,46	-	1.323.654,46	1,73
	M5C2 I2.3	Dogana d'Acqua - Caserma Lamarmora, recupero e rifunzionalizzazione	10.276.702,63	2.000.000,00	12.276.702,63	16,09
	M5C2 I2.3	Dogana d'Acqua - edificio polifunzionale CRAL e giochi d'acqua	5.256.583,69	400.000,00	5.656.583,69	7,41
		Totale PINQuA		32.692.663,11	2.400.000,00	35.092.663,11
	Progetti di rigenerazione urbana					
Interno	M5C2 I2.1	Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2,88
		Sport e inclusione sociale				
PCM Dip. Sport	M5C2 I3.1	Nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia	3.850.000,00	800.000,00	4.650.000,00	6,09
		Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore				
Lavoro e Politiche sociali	M5C2 I1.1.1	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle	211.500,00	-	211.500,00	0,28
	M5C2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00	-	715.000,00	0,94
	M5C2 I1.1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità A.U.S.L.	715.000,00	-	715.000,00	0,94
	M5C2 I1.1.2	Interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti	2.460.000,00	-	2.460.000,00	3,22
	M5C2 I1.1.3	Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione	330.000,00	-	330.000,00	0,43
	M5C2 I1.1.4	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn	209.976,80	-	209.976,80	0,28
	M5C2 I1.3.1	Povertà estrema - Housing first	710.000,00	587.443,00	1.297.443,00	1,70
	M5C2 I1.3.2	Povertà estrema – Stazioni di posta	1.090.000,00	142.557,00	1.232.557,00	1,61
	Totale Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore		6.441.476,80	730.000,00	7.171.476,80	9,40
	Totale		45.184.139,91	3.930.000,00	49.114.139,91	64,35

Importo PNRR	Altre risorse	Valore opera	Percentuale
63.149.132,54	13.172.589,40	76.321.721,94	100,00

Tabella di sintesi	Importo PNRR	Altre risorse	Valore opere	Percentuale
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA'	3.430.234,87	-	3.430.234,87	4,49
CULTURA E TURISMO	500.000,00	127.347,20	627.347,20	0,82
ISTRUZIONE E RICERCA	14.034.757,76	9.115.242,20	23.149.999,96	30,33
INCLUSIONE E COESIONE	45.184.139,91	3.930.000,00	49.114.139,91	64,35
<i>di cui</i>				
<i>Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA)</i>	32.692.663,11	2.400.000,00	35.092.663,11	45,98
<i>Progetti di rigenerazione urbana</i>	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2,88
<i>Sport e inclusione sociale</i>	3.850.000,00	800.000,00	4.650.000,00	6,09
<i>Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore</i>	6.441.476,80	730.000,00	7.171.476,80	9,40
TOTALE	63.149.132,54	13.172.589,40	76.321.721,94	100,00

Come possiamo vedere la maggiore parte delle risorse PNRR è concentrata nella Missione dell'Inclusione e coesione, che incide per il 64,35% sul totale delle risorse PNRR; al suo interno la percentuale più alta è quella relativa al Piano Innovativo per la qualità abitativa (PINQuA), che incide per il 45,98% sull'importo totale delle risorse PNRR.

Il 30,33% delle risorse PNRR è invece utilizzato per il potenziamento dell'Offerta dei Servizi di Istruzione.

Si nota poi un incremento del totale degli interventi relativi alla Digitalizzazione (4,49%), in quanto in tale Missione è stato ammesso a finanziamento un nuovo progetto.

3. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2025

M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
C1 – Digitalizzazione, innovazione, e sicurezza nella PA
Settore Sistemi Informativi

M1C1I1.4.3 Adozione "App IO" Comuni

CUP J41F22001020001

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 54.950,00

Scadenza del progetto prorogata al 1° ottobre 2024

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 253 del 16/01/2023) Ditta: Partners Associates advanced business solutions - P.A. ABS

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 54.950,00

M1C1I1.4.3 Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni

CUP J41C22000930006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.031.574,00

Scadenza progetto 25 febbraio 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 5900 del 03/08/2023) Ditta: Municipia Spa

Stato di attuazione

Progetto completato, in fase di asseverazione

Nei primi mesi del 2026 il progetto è stato asseverato e il finanziamento è stato liquidato per € 1.031.574,00

M1C1I1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale

CUP J41F22004150006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 516.323,00

Scadenza progetto 1° aprile 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 9820 del 14/12/2023) Ditta: Ditta Maggioli

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 516.323,00

M1C1I1.4.5 Piattaforma notifiche digitali Comuni

CUP J41F22004350006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 69.000,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio (det. n. 1801 del 17/03/2023) Ditta: Maggioli Spa

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 69.000,00

M1C1I1.4.3 Adozione piattaforma PAGOPA

CUP J41F22002200006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 112.627,00

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di integrazione software (det. 8703 del 21/12/2022)

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 112.627,00

M1C1I1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni

CUP J51F22009470006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 203.435,00

Scadenza progetto 5 novembre 2024

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di implementazione di API (det. 3932 del 09/05/2024)

Stato di attuazione

Progetto completato e finanziamento liquidato € 203.435,00

M1C1I1.7.2 Centri di facilitazione digitale

CUP J49I23000730006

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 30.000,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento realizzazione attività mediante coprogettazione (det. n. 7857 del 17/10/2023) Ditta: Cooperativa sociale CESDI Onlus

Stato di attuazione

Progetto completato, in fase di rendicontazione. Anticipo riscosso al momento € 12.000,00

M1C1I1.4.2 Citizen Inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

CUP J54F24001460006

Soggetto attuatore: Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

Soggetto sub attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 234.000,00

Scadenza progetto 30 aprile 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio di formazione (det. 9099 del 24/10/2024) Ditta: Cooperativa Sociale Quid

Affidamento servizio di riduzione tipologie di errore servizio mense scolastiche (det. n. 10645 del 12/12/2024) Ditta: Maggioli SPA

Adesione del Comune di Livorno al "Accordo quadro per l'affidamento dei "Servizi e prestazioni inerenti la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SaaS tramite Sistema CloudToscana – SCT, del Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e WebApp, di Regione Toscana – Giunta Regionale e degli Enti del territorio regionale" (det. n. 11121 del 20/12/2024) Ditta: T.A.I. Software Solution S.r.l

Affidamento per fornitura di tecnologie assistive hardware (det. n. 2185 del 24/03/2025) Ditta: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

Stato di attuazione

Progetto completato, in fase di rendicontazione

M1C1I1.5 Cybersecurity

CUP J46G24000020006

Soggetto attuatore: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

Soggetto sub attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 978.000,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di backup ambiente Microsoft O365 antispam e archiviazione mail (det. n. 10809 del 16/12/2024) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento della fornitura di apparecchiature informatiche per la realizzazione di un sito di Disaster Recovery (det. n. 10981 del 19/12/2024) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento del servizio di estensione della protezione mediante XDR/MDR Patching e Identity (det. n. 1382 del 24/02/2025) Ditta: Omniconnect srl

Affidamento per la fornitura del servizio di segmentazione della rete e endpoint central manage engine (det. n. 2021 del 18/03/2025) Ditta: Sokom S.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio di formazione in ambito di sicurezza informatica (det. n. 2425 del 01/04/2025) Ditta: Omniconnect s.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio MFA, WAF, SIEM e IRT (det. n. 2426 del 01/04/2025) Ditta: Sokom srl

Affidamento per la fornitura del servizio di formazione del personale addetto alla gestione della sicurezza (det. n. 3215 del 28/04/2025) Ditta: Digital Thinks s.r.l.

Affidamento della fornitura del servizio di formazione in ambito di sicurezza informatica (det. n. 3482 del 08/05/2025) Ditta: Pentaqo s.r.l.

Affidamento fornitura del "Servizio di formazione in sicurezza informatica relativamente al database PostgreSQL" (det. n. 5263 del 03/07/2025) Ditta Nobleprog Italia S.R.L.

Affidamento del servizio di Analisi e progettazione di un piano di Disaster Recovery e-Business Continuity Ditta Omniconnect srl (det. n. 7788 del 02/10/2025)

Affidamento della fornitura del servizio di formazione relativamente al Firewall Fortinet Ditta Sokom S.R.L. (det. n. 8190 del 16/10/2025)

Affidamento della fornitura del "servizio di formazione finalizzato allo sviluppo di competenze in Project Management e nella reingegnerizzazione dei processi con particolare attenzione agli aspetti di cybersecurity" (det. n. 8328 del 21/10/2025) Ditta Dgroove S.r.l.

Stato di attuazione

Progetto completato, in fase di rendicontazione. Anticipo riscosso al momento € 97.800,00

M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni

CUP J41F24000280006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 54.482,39

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di adeguamento funzionale della componente backoffice della piattaforma tecnologica SUAP (det. n. 3952 del 21/05/2025) Ditta: PA ABS srl

Stato di attuazione

Progetto completato. In fase di asseverazione

Nei primi mesi del 2026 il progetto è stato asseverato

M1C1I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)

CUP J51F24003770006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 19.642,00

Scadenza progetto 31 dicembre 2025

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio: determina n. 2927 del 15/04/2025. Ditta: Municipia spa

Stato di attuazione

Progetto completato. In fase di asseverazione

M1C1I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) ENTI TERZI – Comuni

CUP J41F25000410006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 53.011,00

Scadenza progetto

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento del servizio di Adeguamento funzionale delle componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche SUAP (det. n. 7098 del 11/09/2025) Ditta PA ABS srl

Stato di attuazione

Progetto completato. In fase di asseverazione

Nei primi mesi del 2026 il progetto è stato asseverato

M1C1I1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati” – Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNSCU)

CUP J51J25003190006

Soggetto attuatore: Comune di Livorno

Settore: Sistemi Informativi

Importo totale del finanziamento PNRR: € 73.190,48

Scadenza progetto 31/03/2026

Stato di attuazione

Affidamento in corso

Nei primi mesi del 2026 il progetto è stato avviato

C3 – Turismo e cultura

Settore Attività culturali, turismo, musei e fondazioni.

M1C3I1.2 Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori

CUP J47B23000000001

Settore: Attività culturali, biblioteche e musei

Importo totale del progetto: € 627.347,20

Importo totale del finanziamento PNRR: € 500.000,00

Importo autofinanziato: € 127.347,20

Inizio previsto: 19/05/2023

Fine prevista: 19/02/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto esecutivo lavori (del. GC n. 447 del 30/06/2023)

Aggiudicazione appalti

Affidamento diretto per lavori fibra ottica (det. n. 4704 del 22/06/2023) Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Affidamento diretto fornitura Sgabelli per incremento fruibilità Museo Civico G. Fattori (det. n. 4704 del 22/06/2023) Ditta: Impresa DM Cultura S.r.l.

Affidamento diretto Implementazione piano di sicurezza ed emergenza del Museo Civico G. Fattori (det. n. 4780 del 23/06/2023) Ditta: Sokom S.r.l.

Affidamento diretto Lavori connettività di rete (det. n. 4909 del 28/06/2023) Ditta: Associazione Culturale Prisma

Realizzazione segnaletica esterna per Museo Civico G. Fattori (det. 4933 del 29/06/2023) Ditta: Impresa Nobili Pubblicità Sas

Affidamento diretto fornitura armadietti guardaroba accessibili (det. n. 4943 del 29/06/2023) Ditta: Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.

Affidamento diretto realizzazione del punto informativo presso il Museo Fattori (det. n. 4944 del 29/06/2023) Ditta: Secman Security Management S.r.l.

Affidamento diretto realizzazione di Fattori Activity Bag e realizzazione di iniziative inclusive presso il Museo Fattori (det. n. 4945 del 29/06/2023) Ditta: Sillabe S.r.l

Affidamento diretto realizzazione di attività ed eventi volti a promuovere il tema dell'accessibilità presso il Museo Fattori (det. n. 4946 del 29/06/2023) - Acquisizione inbook (det. n. 4947 del 29/06/2023) Ditta:

Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche Ditta: Promuseum S.r.l.

Lavori posa in opera fibra ottica al Museo Civico G. Fattori (det. n. 4969 del 29/06/2023) Ditta: Pantani e Conti S.r.l.

Aggiudicazione appalto per realizzazione percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. n. 8723 del 14/11/2023) Ditta: Betonterra Costruzioni S.r.l


Collaudo lavori fibra ottica (det. n. 2085 del 13/03/2024)

Collaudo lavori percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. n. 5107 del 12/06/2024)

Stato di attuazione

Concluso, in attesa del saldo (10%)

INCASSATI € 392.420,85

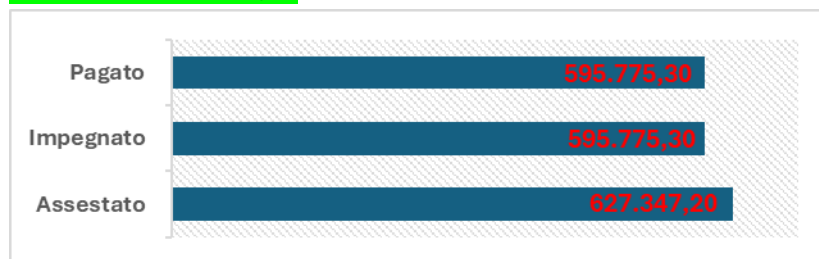

.....

M4 – Istruzione e Ricerca

C1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzione

M4C1 I1.1 Rifunzionalizzazione scuola infanzia via Poerio (scuola ex Ciro Menotti) come centro polifunzionale per la famiglia

CUP J44E21001030001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.170.000,00

Inizio previsto: 22/03/2021

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione progetto definitivo in linea tecnica (Del. GC n. 247 del 20/05/2021)

Affidamento diretto servizio di verifica del progetto definitivo: Ing. Petrucci Simone (det. n. 1489 del 08/03/2023)

Approvazione progetto definitivo (det. n. 3303 del 11/05/2023)

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4581 del 20/06/2023)

(Ditta: Consorzio Italiano Costruzioni e Manutenzioni Società Cooperativa)

Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza per l’esecuzione (det. n. 5012 del 07/06/2024)

Ditta: Ing. Soldati Marcello

Affidamento servizio taglio erba e pulizia dell’area (det. n. 5266 del 17/06/2024) Ditta: Garden Eco Poggiofiorito

Approvato progetto esecutivo (det. 6762 del 06/08/2024)

Autorizzazione subappalto (det. n. 9917 del 20/11/2024) Ditta subappaltatrice: CMS Soc. Coop.


Autorizzazione subappalto (det. n. 265 del 16/01/2025) Ditta subappaltatrice: Beco s.r.l.

Autorizzazione subappalto (Det. 5655 DEL 17/07/2025) Ditta subappaltatrice: SINTEC SOC. COOP. A.R.L.
Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025
Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/06/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 651.000,00

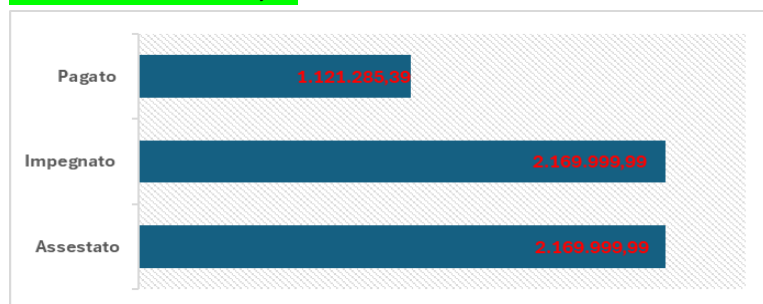

M4C1 I1.1 Asilo nido Pirandello, via Bracco 2, demolizione e ricostruzione delle attuali strutture

CUP J45E22000000006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 2.740.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.896.000,00

Cofinanziamento comunale: € 844.000,00

Inizio previsto: 01/12/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto redazione PFTE: RTP architetto Pietro Carlo Pellegrini, Studio Archimede Ingegneria S.r.l. e Dott. Francesco Saviozzi (det. n. 2317 del 05/04/2023)

Approvazione PFTE rafforzato (ord. n. 3325 del 11/05/2023)

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 4577 del 20/06/2023) Ditta: Edil Fab S.r.l.

Affidamento servizio di campagna geognostica a supporto della realizzazione dell'asilo (det. n. 1065 del 12/02/2024) Ditta: TECNA s.r.l.

Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura a Arch. Pietro Carlo Pellegrini (det. n. 2155 del 15/03/2024)

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine a Studio Geodelta di Dott. Benedetta Chiodini (det. n. 2870 del 08/04/2024)

Approvato progetto esecutivo (det. n. 3195 del 28/04/2025)

Affidamento servizio di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE) a Ing. Federico Bernardini (det. 3196 del 25/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3200 del 28/04/2025) Ditta subappaltatrice: Abate s.r.l.

Variante contrattuale ex art. 106 c.1 D.Lgs 50/2016 (det. n. 3199 del 28/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3200 del 28/04/2025) Ditta subappaltatrice: Abate s.r.l.

Approvato progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio (det. n. 6758 del 29/08/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 7000 del 10/09/2025) Ditta ABATE S.r.l.

Autorizzazione subappalto (det. n. 7675 del 30/09/2025) Ditta EDILIZIA NUOVA srls


Esecuzione lavori: dal 29/12/2023 al 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 568.800,00

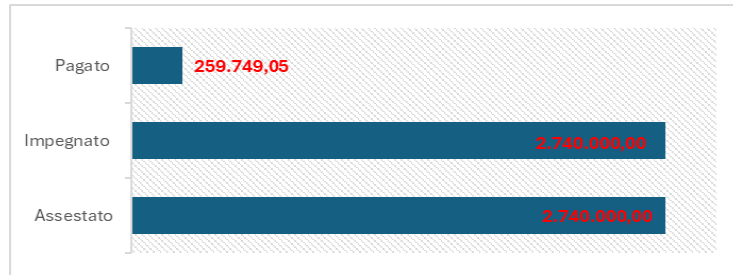

M4C1 I3.3 Realizzazione nuova scuola secondaria I grado Mazzini – via Sgarallino

CUP J41B22002240006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 5.280.000,00

Inizio previsto: 20/01/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE in linea tecnica (deliberazione GC n. 30 del 20/01/2023)

Approvazione DIP (delibera GC n. 527 del 18/08/2023)

Riapprovato il DIP con GC. n. 28 del 17/01/2025

Collaudo: dal 31/12/2025 al 30/03/2026

Stato di attuazione

Riapprovato DIP

INCASSATI € 528.000,00



M4C1 I3.3 Polo scolastico di Montenero – realizzazione di un nuovo centro infanzia 0-6 anni

CUP J41B22001690006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.520.000,00

Inizio previsto: 18/05/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione DIP (delibera GC n. 541 del 18/08/2023)

Approvazione PFTE in linea tecnica


Riapprovato DIP con GC n. 154 del 04/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Stato di attuazione

Riapprovato DIP

INCASSATI € 252.000,00

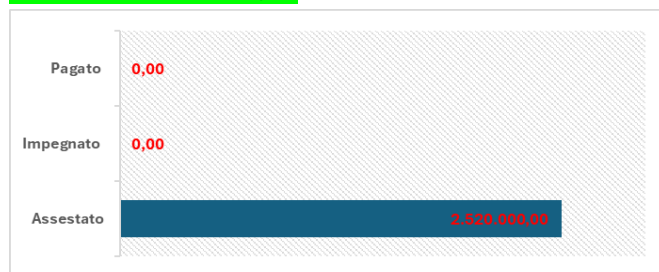

M4C1 I3.3 Polo scolastico di Montenero – nuova scuola primaria e secondaria di I grado

CUP J41B22001680006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 10.439.999,96

Importo finanziamento PNRR: € 2.168.757,76

Importo autofinanziato: € 8.271.242,20

Inizio previsto: 30/06/2023

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione DIP (delibera GC n. 541 del 18/08/2023)

Approvazione PFTE in linea tecnica

Riapprovato DIP con GC n. 154 del 04/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Stato di attuazione

Riapprovato DIP

INCASSATI € 216.875,78



.....

M5 Inclusione e coesione

C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Lavori pubblici e opere PNRR

M5C2 I3.1 Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente indoor Scopaia, quartiere Scopaia, via San Martino

CUP J45B22000400006

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 4.650.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.500.000,00

FOI: € 350.000,00

Cofinanziamento comunale: € 800.000,00

Inizio previsto: 07/11/2022

Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento diretto redazione della verifica preventiva di interesse archeologico (det. n. 7746 del 24/11/2022)

Approvazione PFTE (del. GC n. 819 del 23/12/2022) Ditta: Past in Progress S.r.l.

Affidamento diretto relazione geologica ed esecuzione indagini (det. n. 371 del 23/01/2023) Ditta: Geologica Toscana Snc

Affidamento servizio supporto al RUP per verifica PFTE a Prima Ingegneria STP S.s (det. n. 01/02/2023)

Approvazione PFTE rafforzato (det. n. 108 del 22/02/2023)

Affidamento diretto realizzazione render (det. n. 1867 del 21/03/2023) Ditta: VIR94 Lab. Archviz.

Aggiudicazione appalto integrato (det. n. 2205 del 30/03/2023)

Aggiudicazione efficace (det. n. 3840 del 29/05/2023) Ditta: Frangerini Impresa S.r.l.

Affidamento servizio di realizzazione nuovo inserimento fotografico impianto sportivo (det. n. 3301 del 11/05/2023)

Affidamento servizio per valutazione impatto acustico a Studio Tecnico Dott. Ing. Dario Gratta (det. n. 8454 del 07/11/2023)

Affidamento assistenza direzione lavori materia ambientale (det. n. 1223 del 16/02/2024) Ditta: Bios s.r.l

Affidamento assistenza archeologica lavori di scavo (det. n. 1225 del 16/02/2024) Ditta: Past in progress s.r.l.

Affidamento servizio di realizzazione di 3 rendering a Studio VIR90 lab archviz" di Valerio Palandri (det. n. 2729 del 03/04/2024)

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 7833 del 18/09/2024)

Affidamento del servizio di espianto di piante e collocazione vasi (det. n. 9213 del 28/10/2024) Ditta: Giardineria Italiana Società Cooperativa Sociale

Autorizzazione subappalto (det. n. 82 del 08/01/2025) Ditta subappaltatrice: Edil Nova srl

Affidamento per smontaggio di fornace (det. n. 1011 del 11/02/2025)

Affidamento del servizio di espianto piante (det. n. 1085 del 12/02/2025)

Approvazione variante suppletiva e affidamento maggiori lavori (det. 3794 del 16/05/2025) Ditta: Giardineria Italiana Società Cooperativa Sociale

Autorizzazione subappalto (det. n. 9886 del 05/12/2025) Ditta: VASSALLO COSTRUZIONI SRL


Esecuzione lavori: dal 01/12/2023 al 30/10/2025

Collaudo: dal 01/11/2025 al 31/01/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.050.000,00

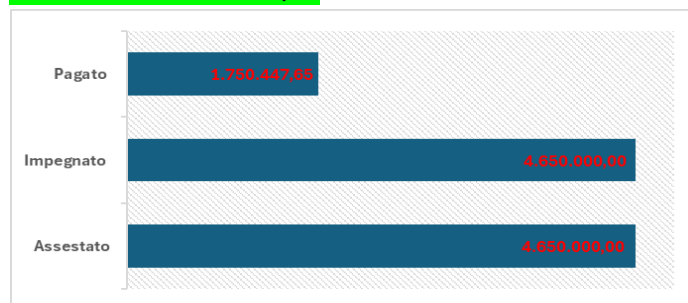

M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana Baden Powell – Riqualficazione e ampliamento Parco Baden Powell

CUP J44E21001000001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 2.200.000,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.000.000,00

FOI: € 200.000,00

Inizio previsto: 12/04/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE (del. GC n. 272 del 01/06/2021)

Approvazione progetto definitivo (del. GC n. 300 del 12/05/2023)

Affidamento servizio supporto al RUP per verifica p.e. (det. n. 3626 del 19/05/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 4410 del 24/06/2023)

Affidamento servizio di taglio erba e taglio vegetazione e abbattimento essenze arboree e arbustive (det n. 6244 del 17/08/2023) Ditta: Collecoop

Aggiudicazione appalto (det. n. 5785 del 28/07/2023) Procedura aperta Ditta: Euroambiente S.r.l.

Affidato servizio di taglio erba, vegetazione etc. (det. 8160 del 27/10/2023)

Autorizzazione subappalto (det. n. 6094 del 12/07/2024) Ditta subappaltatrice: Italian Garden S.r.l.

Variante contrattuale art. 106 c.2 D.lgs 50/2016 (det. n. 6544 del 30/07/2024)


Esecuzione lavori: termine 31/03/2026

Collaudo: 30/06/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.332.303,89

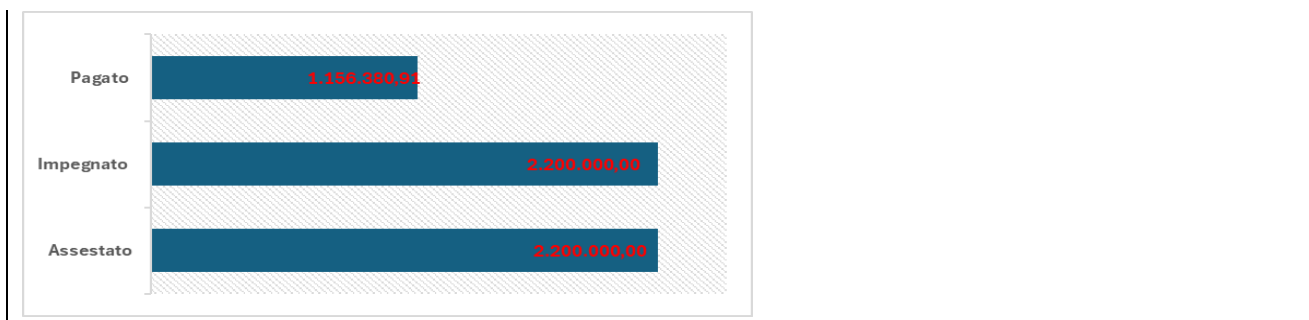

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero - riqualificazione immobili quartiere stazione e pavimentazione isolato quartiere Stazione
CUP J47B22000060001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 13.195.999,87

Importo totale del finanziamento PNRR: € 10.996.666,56

FOI: € 2.199.333,31

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro; procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 1 (det. n. 2217 del 08/08/2022)

Affidamento servizi tecnici di integrazione della progettazione preliminare, della progettazione definitiva, della direzione dei lavori e del C.S.E. (det. n. 5750 del 27/07/2023) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Approvata bozza ODA per servizi di esecuzione di rilievi ed indagini, di progettazione definitiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (det. n. 7221 del 27/09/2023) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Affidamento supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 2 – servizi di verifica della progettazione Ditta: Planum S.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria – lotto prestazionale 5 – servizi di collaudo Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandatario) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Minutolo Ing. Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato Ditta: Apulia S.r.l. (mandataria), Pagano Spa (mandante)

Approvato progetto definitivo e bozza ODA (Delibera GC 849 del 05/12/2023)

Aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (det. n. 10331 del 28/12/2023) RTI APULIA S.R.L mandataria - PAGANO S.P.A. mandante - DELTA LAVORI S.P.A. mandante

Approvato ODA per servizi di progettazione definitiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (det. n. 1080 del 12/02/2025) Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 2995 del 17/04/2025)

Autorizzazione subappalto (det. n. 6005 del 29/07/2025) Ditta: AURORA SRL

Autorizzazione subappalto (det. n. 10649 del 29/12/2025) Ditta: WOOD SYSTEM ITALIA S.R.L.


Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 1.099.666,66

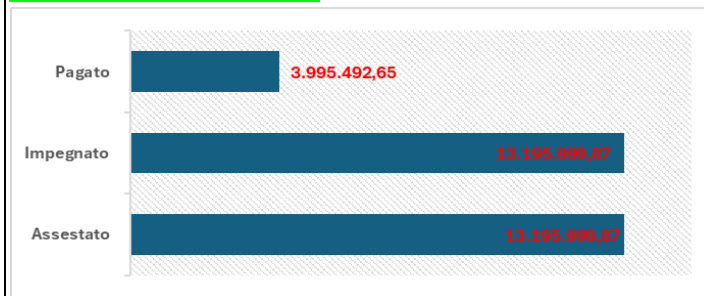

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – quartiere Stazione Parco Pertini

CUP J43D21002660001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.639.722,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l

Approvazione PFTE (Delibera GC n. 851 del 07/12/2023) Gara deserta

Nuova determina a contrarre procedura negoziata (det. n. 10403 del 29/12/2023)

Aggiudicato appalto integrato (det. n. 1688 del 01/03/2024) (Consorzio stabile toscana edilizia e ambiente, società consortile a s.r.l.)


Esecuzione lavori: entro il 30/06/2025

Collaudo: dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Stato di attuazione

Consegna dei lavori dopo la liberazione dell'area

INCASSATI € 263.972,25



M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero – parcheggio Del Corona

CUP J47H21000370001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.323.654,46

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.

Servizio di indagini geognostiche e geofisiche (det. n. 8359 del 03/11/2023) Assogeo – studio di geologia di Antonio Esposito

Servizio di indagini strutturali e per l'esecuzione di prove di laboratorio (det. n. 8363 del 03/11/2023) Ditta: Laboratorio Delta S.r.l.

Affidamento servizio di studio geologico, sismico e geotecnico a supporto del progetto (det. n. 8361 del 03/11/2023) Ditta: Assogeo – studio di geologia di Antonio Esposito

Approvazione progetto esecutivo (Del. GC n. 859 del 07/12/2023)

Aggiudicazione appalto lavori (det. n. 10402 del 29/12/2023) Ditta: Abate s.r.l.

Autorizzazione subappalto (det. n. 10242 del 16/12/2025) Ditta: DIFO COSTRUZIONI SRL


Esecuzione lavori: dal 01/04/2024 al 31/03/2025

Collaudo: dal 01/04/2025 al 30/06/2025

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 132.365,45

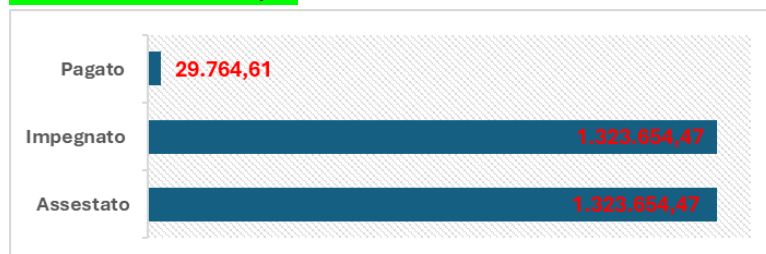

M5C2I2.3.1 PINQuA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Dogana D'Acqua completamento del recupero e rifunzionalizzazione ex caserma Lamarmora

CUP J43D21002630001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Importo totale del progetto: € 12.276.702,63

Importo totale del finanziamento PNRR: € 8.563.918,86

FOI: € 1.712.783,77

Importo autofinanziato: €2.000.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021


Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Affidamento accordo quadro 31/03/2023. Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria (det. n. 5744 del 27/07/2023)
 Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione Ditta: IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini
 Affidamento diretto a società in house servizio di rimozione rifiuti Ditta: AAMPS Spa
 Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) Ditta: Avalon s.r.l.
 Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione (det. n. 7710 del 11/10/2023) Ditta: Conteco Check S.r.l.
 Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandataria) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)
 Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato Consorzio Stabile Medil Società consortile per azioni
 Approvato progetto definitivo e approvata bozza ODA (Delibera GC n. 839 del 05/12/2023) Consorzio stabile Medil società consortile per azioni - CO.GE.PA. costruzioni generali Passarelli S.p.a. esecutrice- Nord costruzioni Generali s.r.l. esecutrice
 Aggiudicazione appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (det. n. 10356 del 28/12/2023) Consorzio stabile Medil società consortile per azioni
 Integrazione servizi tecnici. oda integrativo (det. n. 249 del 15/01/2025) RTI IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dott. Flavio Carlini
 Approvazione progetto esecutivo (det. n. 5208 del 02/07/2025)
 Autorizzazione subappalto (det. n. 9748 del 02/12/2025) Ditta: CONSORZIO ARTEMIDE
 Esecuzione lavori: entro il 31/03/2025
 Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/06/2026

Stato di attuazione

INCASSATI € 856.391,89

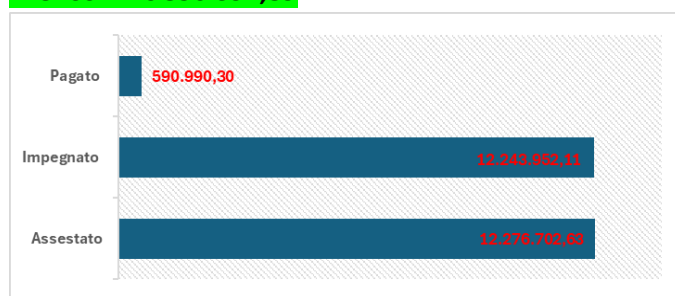

M5C2I2.3.1 PINQuA ambito Dogana D'Acqua realizzazione edificio polifunzionale Cral e realizzazione Piazza con giochi d'acqua

CUP J45I22000000001

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR
 Importo totale del progetto: € 5.656.583,69
 Importo totale del finanziamento PNRR: € 4.380.486,41
 FOI: € 876.097,28

Importo autofinanziato: €400.000,00

Inizio previsto: 12/03/2021

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicazione accordo quadro 27/09/2022. Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria.

Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione (det. n. 6941 del 15/09/2023)

Affidamento servizio indagini geologiche (det. n. 7413 del 03/10/2023) Società So.Ge.T. s.r.l.

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica della progettazione (Ditta: CONTECO Check S.r.l.)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo (Ditta: Ing. Felice Giordani (Mandataria) - Ing. Bottai & Associati (Mandante) – – Ing. Minutolo Vincenzo Francesco (Mandante) – Trendenergy Società tra professionisti S.r.l. (Mandante)

Procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 3. Lavori (Ditta: Edilcido S.r.l.)

Servizio supporto al RUP (det. n. 7546 del 06/10/2023) (Ditta: Avalon s.r.l.)

Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica e bozza ODA (Delibera GC n. 858 del 07/12/2023)

Aggiudicazione del contratto specifico di esecuzione lavori (det. n. 10371 del 29/12/2023) (Ditta: EDILCIDO S.R.L.)

Affidamento servizio di indagine tomografica (det. n. 5590 del 25/06/2024) CEA DEMINING S.r.l.

Approvazione progetto esecutivo (det. n. 10195 del 28/11/2024)

Autorizzazione subappalto (det. n. 3137 del 23/04/2025) Ditta: Trivel Pozzi di Calzone Salvatore

Autorizzazione subappalto (det. n. 7008 del 10/09/2025) Ditta: COSTRUZIONI & PROGETTI S.R.L


Esecuzione lavori: entro il 31/12/2025

Collaudo: dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Stato di attuazione

In fase di esecuzione

INCASSATI € 438.048,64

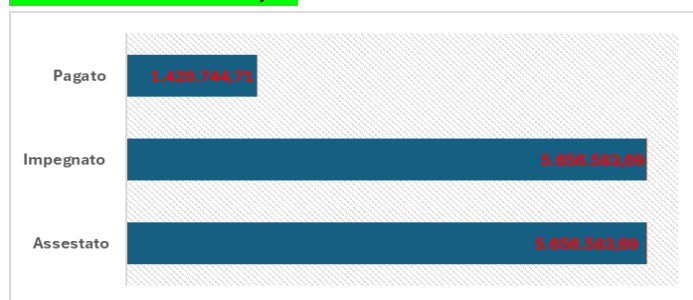

M5 Inclusione e coesione

C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Settore Politiche sociali e sociosanitarie

Settore Lavori pubblici e opere PNRR

M5C2I1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e bambini

CUP J44H22000200006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 211.500,00

Inizio previsto: 09/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto servizio (det. n. 5009 del 30/06/2023) Ditta: Nuovo Futuro Cooperativa sociale


Approvazione avviso pubblico per individuazione soggetti terzo settore per avvio coprogettazione (det. n. 690 del 30/01/2024)

Approvato progetto esecutivo e avviata attività oggetto della co-progettazione a far data dal 01/03/2024 (det. n. 1511 del 27/02/2024) con Cuore Liburnia Sociale, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale e Associazione Il Sestante Solidarietà

Stato di attuazione

In corso co-progettazione

INCASSATO € 190.350,00

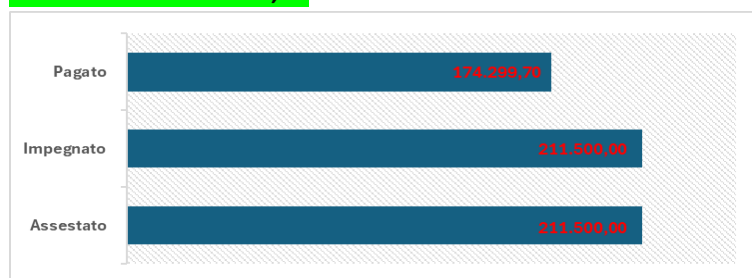

M5C2I1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (Palazzina Lah)

CUP J44H22000210006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.460.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Approvato lo schema di convenzione tra Comune di Livorno e Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione dell'azione diffusa A.1. (det. n. 11136 del 23/12/2024)

Avviso pubblico per coprogettazione e gestione del potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità (det. 3526 del 09/05/2025)

Approvazione candidature e avvio tavolo di co-progettazione (det. n. 4432 del 06/06/2025)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvazione PFTE per ristrutturazione immobile Villa Serena (Delibera GC n. 664 del 10/10/2023)

Approvazione capitolato servizio relazione geologica (det. n. 8163 del 27/10/2023) Dott. Geol. Sergio Crocetti

Affidamento servizi lavori di indagine dei terreni (det. n. 8245 del 30/10/2023) Ditta: Gaia Servizi S.r.l.
Servizio per redazione del PFTE e progettazione esecutiva a supporto della progettazione (det. n. 9381 del 04/12/2023) (Geom. Vasile Sebastian)

Affidamento servizio di rendering della palazzina (det. n. 5267 del 17/06/2024)
"Studio VIR90 lab archiviz" di Valerio Palandri

Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre procedura gara aperta (det. n. 9652 del 12/11/2024)

Aggiudicazione esecuzione lavori (det. n. 2847 del 14/04/2025) Ditta: (Consorzio innova Soc. Coop)

Affidamento servizio di contabilità dei lavori a supporto direzione lavori (det. n. 3141 del 23/04/2025)
Geom. Sebastian Vasile

Approvato progetto operativo (det. n. 5532 del 14/07/2025) A.T.S. Soc. Volontaria di Soccorso pubblica Assistenza; Cuore Liburnia Sociale; G.DI Vittorio; Cooperativa soc. Humanitas Livorno; Coop. Soc. Senex.

Altri affidamenti

Stato di attuazione

Gestione in corso e installazione dei dispositivi per domotica e sicurezza domestica

Lavori in corso

INCASSATI € 246.000,00



M5C2I1.1.2 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione

CUP J44H22000220006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 330.000,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione sociosanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in virtù dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del Sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" CUP J44H22000220006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" (Del. GC 455 del 07/07/23 e della Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.8 del 10 luglio 2023)

Stato di attuazione

In corso la co-progettazione per l'erogazione delle prestazioni di servizio di assistenza domiciliare.

INCASSATI € 33.000,00



M5C2I1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali

CUP J44H22000230006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 209.976,80

Inizio previsto: 02/01/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento servizio tecnico e di segreteria per la realizzazione dell'investimento (det. n. 9943 del 06/12/2023) (Ditta: CON TE Cooperativa Sociale ONLUS)


Affidamento del servizio tecnico e di segreteria (det. n. 3619 del 13/05/2025) Istituto di Terapia Familiare di Siena s.r.l.

Affidamento servizio tecnico e segreteria (det. n. 8746 del 03/11/2025) CON TE Cooperativa Sociale ONLUS

Stato di attuazione

Gestione in corso

INCASSATI € 62.993,04

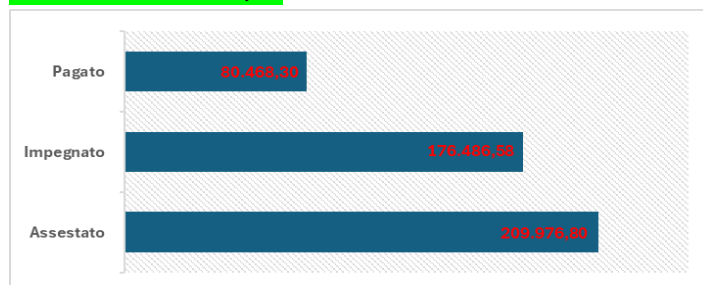

M5C2I1.1.4 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Via degli Asili 47)

CUP J44H22000240004

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Affidamento diretto servizio supporto organizzativo (det. n. 8344 del 13/12/2022) (Ditta: Progetto A. Società Cooperativa Sociale)

Esecuzione servizi: da dicembre 2022 al 30/06/2023

Il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione.

Per l'azione di GESTIONE la prima procedura realizzata e conclusa concerneva l'avviamento sperimentale della gestione affidato a decorrere da dicembre 2022 fino al 30/06/2023 (det. n. 8344 del 13/12/2022 e n. 2884 del 27/04/2023)

Affidamento servizio contabilità dei lavori (det. n. 4796 del 19/06/2025)

Avvio procedura ad evidenza pubblica per individuare soggetti terzo settore per gestione attività (det. n. 4980 del 25/06/2025)

Approvato il progetto operativo (det. n. 10523 del 22/12/2025) A.T.I. Venerabile Arciconfraternita della Misericordia Livorno ODV; A.P.S. Comunico E.T.S.; in Associazione A.P.S., Nuovo Futuro Coop. Soc., La Ruzzoteca A.S.D. A.P.S.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR


Approvato DIP (del. GC 366 del 20/05/2025)

Stato di attuazione

Avviso di coprogettazione in via di pubblicazione per proseguimento dell'attività

Approvato DIP

INCASSATI € 71.500,00

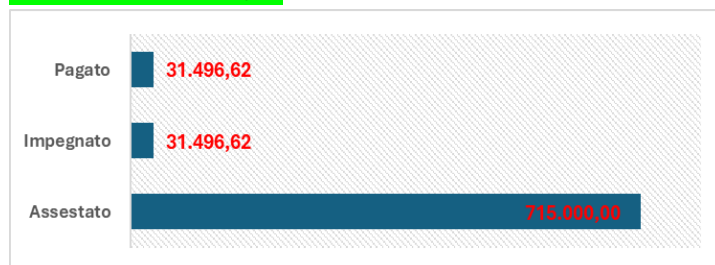

M5C2I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità AUSL (Via Piave 20)

CUP J44H22000320006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del finanziamento PNRR: € 715.000,00

Inizio previsto: 10/10/2022

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Aggiudicazione: accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 con Azienda USL Nord Ovest

Soggetto esecutore: Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione sociosanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in forza dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP J44H22000320006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese "soggetto attuatore" e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana "soggetto realizzatore o esecutore" approvato con Decreto Direttoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3853 del 2/12/2022, con Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.18 del 23/12/2022 e con Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 31/01/2023.

Nella sua esecuzione il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. La prima procedura avviata concerne la gestione per la realizzazione della quale è stato pubblicato in data 9/02/23 un avviso pubblico di manifestazione di interesse per una procedura di coprogettazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 approvato con decreto del Direttore di Zona USL n.531 del 9/02/23. Nell'ambito della procedura

di coprogettazione con decreto n. 1427 del 3/05/2023 è stato approvato il verbale di ammissione dei candidati alla coprogettazione e convocato il tavolo di coprogettazione.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Approvato il DIP (GC n. 365 del 09/05/2024)

Approvato PFTE (GC 365 del 09/05/2024)


Aggiudicati i lavori (Decreto n. 2691 del 30/08/2024)

Stato di attuazione

Servizio regolarmente avviato

In corso i lavori di ristrutturazione della Palazzina

INCASSATI € 71.500,00

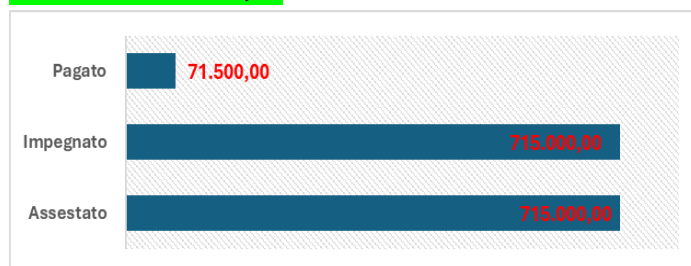

M5C2I1.3.1 Povertà estrema - Housing first

CUP J44H22000250006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del progetto: € 1.297.443,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 710.000,00

Cofinanziamento: € 587.443,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Firmata della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo- invio Dichiarazione di inizio attività.

Procedura ad evidenza pubblica per coprogettazione relativa alla gestione del servizio (det. n. 6666 del 02/08/2024)

Approvata candidatura Soc. Cop Il Simbolo (det. n. 7703 del 13/09/2024)

Approvato progetto esecutivo per la gestione dell'attività di coprogettazione (det. n. 8293 del 3/10/2024)

In data 18.10.24 è stata sottoscritta la convenzione con il soggetto realizzatore Società coop. Sociale il Simbolo.

Affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo (det. n. 9215 del 28/10/2024) Ditta: Prima Ingegneria STP s.s.

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Approvazione PFTE (del. GC n. 267 del 02/05/2023)

Affidamento servizio di sgombero locali (det. n. 3157 del 08/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Affidamento servizio di rilevazione dimensionale tramite laser 3D ed elaborazione e consegna dati (det. n. 3841 del 29/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini

Affidamento servizio assistenza indagini strutturali (det. 5376 del 13/07/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Approvazione certificato regolare esecuzione e conto finale di sgombero (det. n. 5775 del 28/07/2023)

Affidamento servizio di aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati (det. n. 8161 del 27/10/2023) Ditta: Labromare srl

Affidamento servizio di realizzazione prova penetrometrica e masw (det. n. 3072 del 12/04/2024) Ditta: Geoluk

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine per ascensore (det. n. 3073 del 12/04/2024) Ditta: AssoGeo Studio di Geologia


Affidamento servizio per redazione computo metrico (det. n. 6635 del 01/08/2024) Geom. Vasile Sebastian

Stato di attuazione

In corso la convenzione con soggetto realizzatore

Progettazione in corso

INCASSATI € 71.000,00

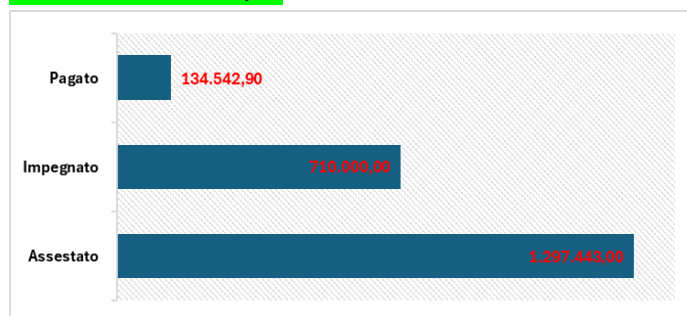

M5C2I1.3.1 Povertà estrema – Stazioni di posta

CUP J44H22000260006

Settore: Politiche sociali e sociosanitarie

Importo totale del progetto: € 1.232.557,00

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.090.000,00

Cofinanziamento: € 142.557,00

Inizio previsto: 03/04/2023

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali servizi

Aggiudicazione: entro il 31/12/2023

Firmata della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali- caricamento della convenzione su Multifondo-invio Dichiarazione di inizio attività.

Procedura ad evidenza pubblica per coprogettazione relativa alla gestione del servizio (det. n. 6665 del 02/08/2024)

Approvata candidatura Soc. Cop Il Simbolo (det. n. 7702 del 13/09/2024)

Approvato progetto esecutivo per la gestione dell'attività di coprogettazione (det. n. 8774 del 15/10/2024)

Preso atto dei lavori della commissione ed è stato approvato il progetto definitivo proposto dalla ATS tra Soc. Coop. Sociale Il Simbolo, in qualità di Ente capofila, insieme con Fondazione Caritas Livorno ETS e LINC SCS Det. n. 8774 del 15.10.24

Affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo (det. n. 9215 del 28/10/2024)

Avanzamento fasi procedurali lavori

Settore: Lavori pubblici e opere PNRR

Approvazione PFTE (GC n. 267 del 02/05/2023)

Affidamento servizio di sgombero locali (det. n. 3157 del 08/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Affidamento servizio di rilevazione dimensionale tramite laser 3D ed elaborazione e consegna dati (det. n. 3841 del 29/05/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc e Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini

Affidamento servizio assistenza indagini strutturali (det. 5376 del 13/07/2023) Ditta: F.Ili Colloca snc

Approvazione certificato regolare esecuzione e conto finale di sgombero (det. n. 5775 del 28/07/2023)

Affidamento servizio di aspirazione reflui contaminati da sversamenti e bonifica locali interrati (det. n. 8161 del 27/10/2023) Ditta: Labromare srl

Affidamento servizio di realizzazione prova penetrometrica e masw (det. n. 3072 del 12/04/2024) Ditta: Geoluk

Affidamento servizio di consulenza geologica e definizione campagna di indagine per ascensore (det. n. 3073 del 12/04/2024)


Affidamento servizio per redazione computo metrico (det. n. 6635 del 01/08/2024) Geom. Vasile Sebastian

Stato di attuazione

In corso la convenzione con soggetto realizzatore. Individuati 25 beneficiari

Progettazione in corso

INCASSATI € 109.000,00

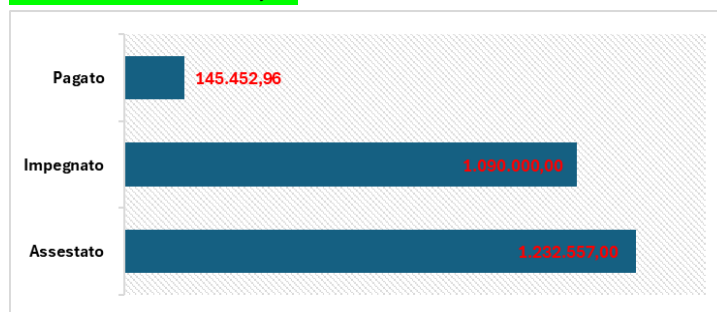


(I dati sono stati ricavati dal sistema informativo ReGiS alla data del 31 dicembre 2025 e dalle informazioni fornite dai Settori interessati)

Scheda riassuntiva dello stato di attuazione dei progetti

M1C1 --> n. 14 interventi	
n. 1 gestione da avviare	(ANNSCU)
n. 12 gestioni concluse	(PagoPA, Piattaforma notifiche digitali, piattaforma digitale nazionale dati, AppIO, cloud, serv e cittad digitale, Cyber Resilience, Citizen Inclusion, SUAP e SUE, ANPR e ANSC, Centri facilitaz, SUE enti terzi)
M1C3 --> n. 1 intervento	
n. 1 concluso	(Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali Museo Civico Fattori)
M4C1 --> n. 5 interventi	
n. 3 in fase di progettazione	(Nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino e Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero e 6-14)
n. 2 appalti aggiudicati in esecuzione	(Rifunionalizzazione scuola infanzia Via Poerio e demolizione e ricostruzione Asilo nido Pirandello)
M5C2 --> N. 15 interventi*	
n. 3 in fase di progettazione	(Immobile housing first, stazione di posta, immobile per percorsi di autonomia per persone con disabilità)
n. 1 appalti aggiudicati	(Parco Pertini)
n. 8 appalti aggiudicati in esecuzione	(Realizzazione nuovo Impianto sportivo polivalente indoor Scopai, riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell, immobile per autonomia degli anziani non autosufficienti, Pinqua quartiere stazione, Pinqua CRAL e giochi d'acqua, Parcheggio Via del Corona, ex caserma Lamarmora, percorsi di autonomia per persone con disabilità ausl)
n. 8 gestioni avviate in corso	(Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, autonomia degli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out, percorsi di autonomia per persone con disabilità e percorsi di autonomia per persone con disabilità ausl, housing first e stazioni di posta)

*(di cui 4 interventi del sociale riguardano solo gestione e altri 4 sia gestione che lavori)

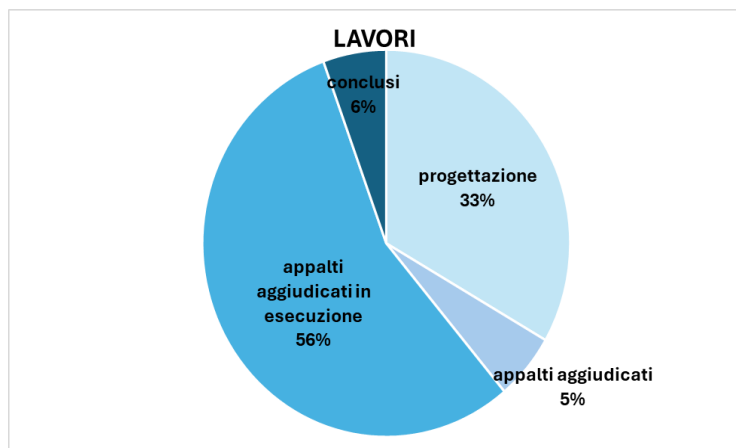

4. ANDAMENTO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PNRR

Nelle *Tabella 5* si illustra l'andamento di cassa relativo agli esercizi 2022/2025, inerente agli interventi non fuori usciti dal PNRR (in seguito al decreto - legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con Legge n. 56 del 29 aprile 2024 che ha defanziato interamente gli interventi dei Comuni relativi a piccole e medie opere). Si evidenzia che nel 2022 il Comune di Livorno ha ricevuto la quota maggiore dei trasferimenti PNRR, introitati sulla base del DM 11 ottobre 2021, il quale prevedeva che l'erogazione della prima quota di trasferimenti fosse anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento.


Con il decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, la quota è stata incrementata al 30% dell'importo del contributo concesso, previo il rispetto di alcune condizioni, quali:

- l'avvenuto avvio di operatività dell'intervento;
- l'implementazione del sistema informativo ReGiS, relativamente all'aggiornamento dei dati fisici, procedurali e finanziari dell'intervento;
- l'effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali dell'intervento in oggetto.

Con il decreto-legge n.113/2024(c.d. decreto omnibus), convertito dalla legge n. 143/2024, si configura un diverso approccio alle erogazioni PNRR, prevedendo che, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, le Amministrazioni centrali titolari delle misure "provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento". È fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente. L'ente attuatore dovrà attestare l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento e l'avvenuto espletamento dei controlli di propria competenza, nonché le 7 verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, con obbligo di conservazione della documentazione giustificativa che potrà essere richiesta in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure effettuano le erogazioni, riservandosi i controlli ad una fase successiva e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento.

Andamento di cassa complessivo di tutti gli interventi (non vengono più considerati quelli fuoriusciti dal PNRR)

TOTALE INCASSATO QUADRIENNIO 2021/2025	TOTALE PAGATO QUADRIENNIO 2021/2025
9.703.323,45	12.481.711,66
SALDO	
-2.778.388,21	

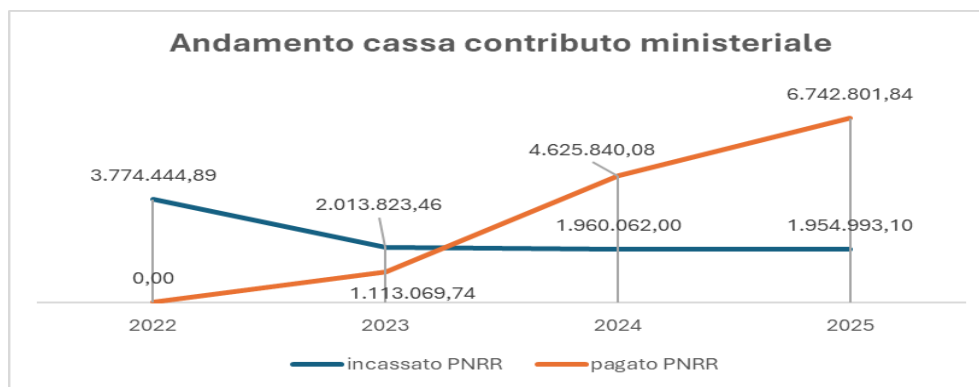

La situazione di cassa attuale registra un saldo negativo, in quanto si sta assistendo ad un incremento fisiologico della spesa dovuto al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), cui seguiranno erogazioni ministeriali attraverso la corretta e tempestiva implementazione del sistema Regis da parte dell'Ente.

Nella **tabella n. 5** si illustra l'andamento di cassa delle annualità 2021/2025 relativo agli interventi che non sono fuori usciti dal PNRR.

Tabella n. 5

Interventi	ENTRATA					USCITA				
	incassi					pagamenti				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Baden Powell CUP J44E21001000001	-	200.000,00	-	400.000,00	732.303,89	-	-	-	732.303,89	424.077,02
PINQuA quartiere stazione CUP J47B22000600001	-	1.099.666,66	-	-	-	-	-	355.384,22	289.414,04	3.350.694,39
PINQuA Parco S. Pertini CUP J43D21002660001	-	263.972,25	-	-	-	-	-	-	-	-
PINQuA parch. Via Del Corona CUP J47H21000370001	-	132.365,45	-	-	-	-	-	18.658,87	11.105,74	-
PINQuA ex Caserma Lamarmora CUP J43D21002630001	-	856.391,89	-	-	-	-	-	349.079,02	172.900,54	431,20
PINQuA CRAL CUP J45I22000000001	-	438.048,64	-	-	-	-	-	71.386,08	1.293.541,91	27.428,59
Impianto poliv. Scopaia CUP J45B22000400006	-	350.000,00	-	700.000,00	-	-	-	56.641,22	1.025.060,01	618.631,24
Centro polif. Via Poerio CUP J44E21001030001	-	434.000,00	-	217.000,00	-	-	-	15.861,70	407.598,79	697.824,90
Asilo Pirandello CUP J45E22000000006	-	-	568.800,00	-	-	-	-	45.763,10	17.376,83	196.609,12
Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini P.I.P.I. CUP J44H22000200006	-	-	21.150,00	-	169.200,00	-	-	-	44.738,00	129.561,65
Percorsi di auton. persone con disabilità CUP J44H22000240004	-	-	71.500,00	-	-	-	-	31.496,62	-	-
Percorsi di auton. persone con disabilità CUP J44H22000320006	-	-	71.500,00	-	-	-	-	71.500,00	-	-
Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali CUP J44H22000230006	-	-	20.997,68	-	41.995,36	-	-	-	26.896,59	53.571,71
Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione AUSL CUP J44H22000220006	-	-	33.000,00	-	-	-	-	-	-	33.000,00
Autonomia degli anziani non autosufficienti CUP J44H22000210006	-	-	-	246.000,00	-	-	-	15.279,70	15.117,94	338.761,25
Housing first CUP J44H22000250006	-	-	71.000,00	-	-	-	-	33.981,26	2.789,54	97.772,14
Stazioni di posta CUP J44H22000260006	-	-	109.000,00	-	-	-	-	35.368,25	2.903,41	107.181,30
Rimozione barriere fisiche cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori *Via San Jacopo in Acquaviva* rimozione barriere architettoniche e acquisizione di strumenti digitali per disabili CUP J47B23000000001	-	-	50.000,00	-	342.420,85	-	-	12.669,70	483.622,41	418,85
Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino CUP J41B22002240006	-	-	528.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero CUP J41B22001690006	-	-	252.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero primaria e secondaria di 1° grado CUP J41B22001680006	-	-	216.875,78	-	-	-	-	-	-	-
Adozione "APP IO" Comuni CUP J41F22001020001	-	-	-	-	54.950,00	-	-	-	15.372,00	5.673,00
Abilitazione al cloud per le PA locali J41C22000930006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi e cittadinanza digitale J41F22004150006	-	-	-	-	516.323,00	-	-	-	-	-
Piattaforma notifiche digitali Comuni J41F22004350006	-	-	-	69.000,00	-	-	-	-	38.064,00	-
Adozione piattaforma PAGOPA J41F22002200006	-	-	-	112.627,00	-	-	-	-	-	-
Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni J51F22009470006	-	-	-	203.435,00	-	-	-	-	36.600,00	-
Rete dei servizi di facilitazione digitale J49I23000730006	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	10.434,44	-
Cyber Resilience J46G24000020006	-	-	-	-	97.800,00	-	-	-	-	524.391,06
Citizen inclusion miglioramento accessibilità dei servizi pubblici digitali J54F24001460006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.774,42
Piattaforma digitale nazionale dati - Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNSCU) - J51J25003190006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni - J41F24000280006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti terzi - J41F25000410006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - J51F24003770006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3.774.444,89	2.013.823,46	1.960.062,00	1.954.993,10	0,00	0,00	1.113.069,74	4.625.840,08	6.742.801,84

5. INTERVENTI PNRR MESSI A TERRA NEL COMUNE DI LIVORNO E NEL TERRITORIO PROVINCIALE E LIMITROFO TRAMITE LE SOCIETÀ ED ENTI DEL G.A.P.

a) Interventi PNRR sul territorio comunale

Si elencano di seguito gli interventi PNRR candidati dalle società ed enti del Gruppo di Amministrazione pubblica (G.A.P.) che impattano sul territorio Comunale, aggiornati alla data del 31/12/2025.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Azienda Servizi Ambientali ASA s.p.a.**

M2C4I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” CUP I74E20001940008

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-22 Potenziamento e messa in sicurezza del sistema di adduzione dell'acquedotto di Livorno e Collesalvetti, attualmente alimentato da un'unica condotta in fibrocemento lunga 45 Km, che presenta diverse criticità in parte sanate con l'attuale piano degli investimenti. Collegamento Stagno-Cisternone, ampliamento serbatoio Banditella, ampliamento serbatoio Cisternone, collegamento Parco Levante-Banditella, potenziamento impianto Mortaiolo con addolcitore.

Importo totale del finanziamento PNRR: € 9.380.465,00 (di cui FOI 3.070.000,00)

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Livorno-Collesalvetti

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

A2-22 Lotto 1

Importo finanziato PNRR: € 4.382.267,00 e FOI € 2.600.000,00 (importo QE progetto: € 14.922.079,84)

- Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Mortaiolo per il miglioramento della qualità e quantità dell'acqua prodotta: lavori in corso, consegna parziale 17/07/2024, ed in via definitiva in data 22/10/2024 (avanzamento lavori 45%).

- Collegamento impianto Mortaiolo con serbatoio di Stagno: lavori in corso, avviati in data 08/01/2024 e sostanzialmente conclusi, previsto a breve certificato ultimazione lavori (avanzamento lavori 99%).

A2-22 Lotto 2:

Importo finanziato PNRR: € 1.928.198,00 e FOI € 470.000,00 (importo QE progetto: € 3.582.000,69)

- Nuova condotta adduttrice Parco Levante-serbatoio Banditella e collegamento viale Boccaccio: lavori in corso, consegnati in data 19/08/2024 (avanzamento lavori 84%)

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Autorità Idrica Toscana A.I.T**

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

CUP I45H22000040002

Oggetto: progetto HUB Livorno fanghi-forsu-biometano-upgrading della stabilizzazione anaerobica

Importo totale del finanziamento PNRR: € 10.000.000,00
Importo QE progetto: € 19.573.184,12
Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT
Soggetto realizzatore: ASA SPA
Ubicazione intervento: Comune di Livorno
Fine prevista: 30/06/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Hub Livorno Fanghi-Forsu-Biometano: redatto e validato Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Aggiudicata in data 23/07/2024 la gara di appalto per l'affidamento di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture ed affiancamento e formazione post-intervento (contratto stipulato in data 21/10/2024).
Lavori avviati con consegna definitiva in data 10/02/2025 (avanzamento lavori 28%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno
Soggetto attuatore **Casa Livorno e Provincia s.p.a. CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045530002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 950.937,53

Ubicazione intervento: Via Passaponti 23/29 – Livorno

Ultimazione prevista: 31/03/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 06/03/2023

Proroga di 60 giorni concessa con prot. 2023/53930 del 3/11/23, seconda proroga di 45 giorni concessa con prot. 2024/2916 del 26/01/24, terza proroga di 34 giorni concessa con prot. 2024/8108 del 12/03/24 nuova scadenza prevista 31/03/24.

Andamento lavori

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 31/3/2024.

Collaudo

In data 06/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 224 del 18/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 3 del 10/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata a estata una economia di € 268.356,63 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0100346 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 950.937,53.

L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045540002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.644.827,69

Ubicazione intervento: Via Amendola 43 - Livorno

Ultimazione prevista: 19/04/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegna_ il 13/03/2024 – tempo assegnato gg 270

Proroga di 69 giorni concessa con Prot. 2023/61293 del 07/12/2023, seconda proroga di 64 giorni concessa con Prot. 2024/6664 del 21/02/24; nuova scadenza prevista 19/04/24. L'ultimazione effettiva dei lavori era prevista per la metà di luglio 2024.

Andamento lavori

Il cappotto è stato interamente realizzato, come le opere sulla terrazza di copertura. Sono state sostituite le caldaie, ma devono essere completate le linee gas e la successiva prova di tenuta. Sono iniziate e sono in fase di completamento le opere di sostituzione degli infissi.

Avanzamento Lavori: 100%

I lavori sono stati ultimati in data 12/7/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità. I lavori sono stati completamente ultimati in data 11/9/2024.

Collaudo

Con Decisione CASALP n. 30 del 14/02/2025 A/T è stata nominata la Commissione per la redazione del Collaudo Tecnico/Amministrativo.

Alla data del 31/12/2025 il Collaudo Tecnico amministrativo risultava in corso di redazione (visita di collaudo fissata per il giorno 8/1/2026).

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045570002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 1.017.829,86

Ubicazione intervento: Via Passaponti 15/21- Livorno

Ultimazione prevista: 03/01/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 07/03/2023 - tempo assegnato gg 252

Proroga di 50 giorni concessa con Prot. 2024/380 del 09/01/2024. Nuova scadenza prevista 3/1/2024.

Andamento lavori

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 3/1/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità per i quali il D.L. ha concesso un maggior tempo di 50 gg.

In data 22/02/24 i lavori sono stati definitivamente conclusi.

Collaudo

In data 13/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 222 del 14/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 1 del 09/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata a estata una economia di € 201.464,30 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0100344 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 1.017.829,86.

L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica

CUP C49J21045550002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 1.219.294,16

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 882.023,59

Ubicazione intervento: Via Passaponti 7/13 - Livorno

Ultimazione prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 01/03/2023 - tempo assegnato gg 252

Proroga di 53 giorni concessa con Prot. 2023/50228 del 27/10/23, nuova scadenza prevista 31/12/23.

Andamento lavori

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in data 2/1/2024 ad eccezione di alcune lavorazioni per le quali il D.L. ha concesso un maggior tempo di 60 gg per il completamento. In data 29/02/24 i lavori sono definitivamente conclusi.

Collaudo

In data 21/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASAL.P. con Decisione n. 246 del 3/12/2024.

Con Decisione CASA L.P. n. 2 del 09/01/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata a estata una economia di € 337.270,57 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0099457 del 11/02/2025.

A seguito richiesta CASA L.P., con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l’elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l’importo complessivo di € 882.023,59.

L’economia è stata destinata ad altri interventi.

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni**

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO. Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei Obiettivo 2: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private

CUP G44H22000050001

Oggetto: Intervento per l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nel Teatro C. Goldoni di Livorno

Importo totale del finanziamento PNRR: € 650.000,00

Importo cofinanziato dal Comune di Livorno: € 304.065,57

Importo autofinanziamento: € 65.608,64

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

I lavori si sono conclusi il 13/02/2024.

Le attività complessive per la realizzazione dell’intervento sono state concluse in data 22/02/2024, coerentemente alla autorizzazione ministeriale di differimento di fine lavori dal 31/12/2023 al 28/02/2024.

In data 7/8/24 è stata trasmessa la seconda rendicontazione al Ministero competente che, al 30/06/2025, risultava ancora in fase di controllo.

Il Comune ha provveduto, in data 12/3/2025, a saldare la fattura di quanto ancora residuava per il cofinanziamento di sua competenza.

Il Ministero in data 7/8/2025 ha provveduto ad effettuare il trasferimento relativo alla rendicontazione di agosto 2024 per un ammontare pari ad euro 165.344,28, raggiungendo in tal modo il 90% del contributo complessivamente trasferibile e dandoci la possibilità, il 2/9/25, di richiedere il saldo del 10% (euro 65.000).

Il 22/12/2025, dopo varie interlocuzioni con gli uffici del Ministero, è stata inoltrata la richiesta di saldo nella quale si dava evidenza che le spese finali, ivi incluse quelle ancora da saldare al realizzatore dell'intervento, alla predetta data del 22/12/2025, ammontavano a € 1.019.674,21 pari al 99,87% del costo ammesso al finanziamento PNRR. In attesa dell'incasso del saldo (€ 65.000,00).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Comune di Livorno

Soggetto attuatore **Fondazione Istituto Tecnico Superiore – Accademia Tecnologica Edilizia ITS ATE**

Potenziamento offerta servizi istruzione. Investimento 1.5: sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS). Potenziamento dei laboratori per ITS Academy- Decreto 10 maggio 2023 n.84

CUP J44D23001220006

Oggetto: Laboratorio per ITS ATE

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.730.589,66

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Dicembre 2023: acquisizione CIG e avvio delle procedure degli affidamenti dei lotti previsti dai CIG.

Completamento procedure: entro 29/04/2024

Chiusura progetto LED: entro dicembre 2025

Potenziamento dell'offerta formativa ITS Academy. Attività A.1 – Percorsi formativi di V livello EQF da 1.800 ore

CUP J44D23001220006

Oggetto: n.2 Corsi di Formazione

Importo totale del finanziamento PNRR: € 660.698,00

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 30/06/2026

Potenziamento di un ulteriore laboratorio per ITS Academy – Decreto del 26 maggio 2025 n. 82984

Manifestazione di interesse presentata il 9/06/2025

Oggetto: Laboratorio per ITS ATE "LED-2"

Importo totale del finanziamento PNRR: € 453.042,79

Ubicazione intervento: Comune di Livorno

Fine prevista: 31/03/2026

b) Interventi PNRR con ricadute sul territorio provinciale e limitrofo

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **ASA SPA**

M2C4I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”

CUP I24E20001140001

Oggetto: PNRR-M2C4-I4.1-A2-23: Sistema idrico Alta/Bassa Val di Cecina - Adduttrici, accumuli, risorse Val di Cecina (Lotti 1,2,3,4)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 782.224,76

Soggetto attuatore: ASA SPA

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Cecina (LI)

Fine prevista: 30/06/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lotto 2: Importo finanziato PNRR: € 782.224,76 (importo QE progetto: € 1.683.579,38)

Serbatoio del Paratino e annessa centrale di sollevamento: lavori in corso, prossimi alla conclusione per l'intervento oggetto di rendicontazione (serbatoio), avviati i lavori in data 09/10/2023 (avanzamento lavori 94%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **A.I.T.**

M2C4I4.4 Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione Intervento “a regia MiTE – DG USSRI”

CUP I66D02000020008

Oggetto: Revamping e Riutilizzo Irriguo del Depuratore di Campo alla Croce di Venturina (LI)

Importo totale del finanziamento PNRR: € 6.632.313,49

Importo QE progetto: € 8.090.595,34

Soggetto attuatore: Autorità idrica Toscana AIT

Soggetto realizzatore: ASA SPA

Ubicazione intervento: Venturina (LI)

Fine prevista: 31/03/2026

Avanzamento fasi procedurali lavori

Aggiudicato appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Validato progetto esecutivo. Avviati lavori in data 08/07/2024 (consegna parziale). Lavori consegnati in via definitiva in data 06/11/2024 (avanzamento lavori 60%).

Interventi ammessi a finanziamento atterrati nel Territorio Livornese

Soggetto attuatore **CASALP**

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C92C21001860002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 1.245.024,46

Ubicazione intervento: Via Pertini 23/29 - Portoferraio (LI)

Ultimazione prevista: 31/10/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 15/05/2023 - tempo assegnato gg 210

Proroga di 150 giorni, nuova scadenza prevista 09/05/24 con Variante contrattuale approvata con Decisione n. 315 del 10/10/23 di importo netto € 96.785,85 per demolizione e rifacimento solaio e conseguenti in due appartamenti, utilizzo piattaforma elevatrice e conseguenti.

Proroga di 175 giorni concessa con prot. 2024/16842 del 10/05/24.

Ulteriore proroga di 120 giorni concessa con prot. 2024/46637 del 24/10/2024 – nuova scadenza prevista 28/2/2025.

Ultima proroga di 30 giorni concessa con prot. 2025/7418 del 28/02/2025 – nuova scadenza prevista 30/03/2025

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 30/03/2025 ad eccezione di alcune lavorazioni marginali e di piccola entità per i quali il D.L. ha concesso un maggior tempo di 60 gg.

In data 26/05/2025 i lavori sono stati definitivamente conclusi.

Andamento lavori

Sono state ultimate le opere riguardanti il cemento armato. Sono terminate le opere del consolidamento statico e riqualificazione energetica dell'edificio, tranne l'installazione delle pompe di calore.

Collaudo

In data 17/10/2025 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASAL.P. con Decisione n. 265 del 23/10/2025.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054490002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 535.801,25

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 466.693,11

Ubicazione intervento: Via C. Pisacane 66 - Piombino (LI)

Ultimazione prevista: 18/04/2024

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 30/03/2023 - tempo assegnato gg 140

Proroga di 90 giorni concessa con Prot. 2023/36561 del 08/09/2023, sospensione di 77 giorni dal 26/9/2023 al 13/12/23, seconda proroga di 58 giorni concessa con Prot. 2024/4071 del 13/02/24 e terza proroga di 20 giorni concessa con Prot. 2024/15087 del 16/04/24. Nuova Scadenza prevista 18/04/24.

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 18/04/24

Collaudo

In data 13/11/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 223 del 14/11/2024.

Con Decisione CASALP n. 41 del 04/03/2025 A/T è stato inoltre approvato il QTE di Collaudo.

Il QTE di collaudo con il quale è stata a estata una economia di € 69.108,14 è stato approvato dalla Regione Toscana con Visto R.T. AOOGR_0238242 del 09/04/2025.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie ed è stato così assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 466.693,11.
L'economia è stata destinata ad altri interventi.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C79J21054500002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto inizialmente: € 426.161,14 + € 254.891,34 Decreto Regis 160 del 18/11/2022

Importo totale del finanziamento PNRR **assegnato definitivamente**: € 587.812,86

Ubicazione intervento: Località Padreterno 2-4 - Rio (LI)

Ultimazione prevista: 22/11/2023

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati il 29/03/2023 - tempo assegnato gg 120

Andamento lavori

Avanzamento Lavori 100%

I lavori sono conclusi in tempo utile in data 23/11/2023 ad eccezione di alcune lavorazioni

In data 30/11/2023 è stato emesso il certificato di ultimazione definitiva dei lavori.

Collaudo

In data 29/4/2024 il Direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato da CASALP con Decisione n. 86 del 6/5/2024

È stato predisposto il QTE di Collaudo per un importo complessivo di € 587.812,86.

A seguito richiesta CASALP, con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie su altri interventi, è stato assegnato definitivamente al presente intervento l'importo complessivo di € 587.812,86 a valere integralmente sul finanziamento PNRR PNC.

Con prot. 32017 del 8/8/2025 è stata inviata alla R.T. la rendicontazione a collaudo. A seguito richieste R.T. con prot. 40846 del 23/10/2025 e prot. 49839 del 18/12/2025 sono state inviate alcune integrazioni.

Al 31/12/2025 il QTE di collaudo risulta in attesa di Visto Regionale.

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032790002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 3.528.936,00

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode

Ultimazione prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 26/06/2023 (primo alloggio)

Si prevede l'avvenuta realizzazione di tutti i lavori entro il 31/01/2026.

Avanzamento Lavori al 31/12/2025: 86%

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP C99J21032800002

Importo totale del finanziamento PNRR: € 2.730.468,55

Ubicazione intervento: Indirizzi vari, intero ambito Lode
Ultimazione prevista: 31/12/2025

Avanzamento fasi procedurali lavori

Lavori consegnati 14/06/2023 (primo alloggio)

Si prevede l'avvenuta realizzazione di tutti i lavori entro il 31/01/2026

Avanzamento Lavori al 31/12/2025: 91%

Fondo complementare PNRR – Piano Regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

CUP: C99J21054500002

Importo totale del finanziamento PNRR previsto: € 576.181,55 (elenco B – intervento di riserva)

Ubicazione intervento: Via Togliatti 3/5

A seguito richiesta CASA L.P., con D.D. della R.T. 11011 del 23/5/2025 è stato modificato l'elenco degli interventi, con il quale, tenuto conto delle economie su altri interventi, è stato spostato il presente intervento dall'elenco B "intervento di riserva" all'elenco "A" assegnato al presente intervento l'importo complessivo di € 576.181,55.

A seguito della progettazione dell'intervento CASA L.P. pertanto ha indetto la procedura di gara per l'appalto dei lavori.

A seguito dello svolgimento della procedura di gara i lavori sono iniziati in data 28/10/2025

L'ultimazione dei lavori è prevista per il 12/4/2026

Società del Gruppo Pubblico Comunale

A seguito di rimodulazioni dei progetti e delle economie verificatosi gli importi di alcuni interventi sono variati; pertanto, al 31 dicembre 2025 l'importo complessivo dei contributi assegnati dal PNRR è di

€ 42.806.328,11.

6. AGGIORNAMENTI E CONCLUSIONI

Opere PNRR concluse:

Le opere concluse sono:

- l'intervento di "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Civico G. Fattori";
- la maggior parte degli interventi delle Piccole e Medie Opere.

Nell'area della digitalizzazione ed innovazione, gli interventi conclusi sono: "Piattaforma notifiche digitali", "PagoPA", "Piattaforma digitale nazionale dati", "APP IO"; "Abilitazione al Cloud per le PA locali", "Citizen Inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali", "Servizi e cittadinanza digitale", "Rete dei servizi di facilitazione digitale", "Cyber Resilience: Potenziamento dell'Infrastruttura Cyber", "digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) Comuni", "estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)", "digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) enti terzi – Comuni".

Novità:

Nella Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo è stato finanziato l'intervento "piattaforma digitale nazionale dati" – Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNSCU) per il quale sono in corso le procedure di affidamento ed è stato ammesso a finanziamento l'intervento "digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – Adeguamento delle piattaforme SUE – Comuni".

Progetti del Sociale

Per quanto concerne i progetti di competenza del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, si segnala in particolare l'avanzamento dei progetti della Missione 5 Componente 2 a valere sulle linee di investimento:

-1.1.1. PIPPI, Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Raggiunte n. 30 famiglie vulnerabili che hanno preso parte alle edizioni 2023/2024- modulo start- e 2024/2025 modulo base- del progetto in oggetto e all'edizione 2025/2026 - modulo base 2 - del progetto. Raggiunte n. 30 famiglie beneficiarie completando così l'obiettivo target del progetto.

-1.1.2. ANZIANI, Autonomia degli anziani non autosufficienti. A mezzo dell'azione diffusa sono stati individuati n. 100 anziani con ridotta autonomia che stanno beneficiando di un servizio di accompagnamento domiciliare nonché dell'installazione presso i propri domicili di un sistema di apparecchiature domotiche, individuate dall'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, volte alla valorizzazione dell'autonomia residua. Ad oggi sono state completate 31 installazioni.

- 1.1.3. DOMICILIARITA', Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione. Soggetto Sub Attuatore Azienda USL Toscana Nord Ovest. È in corso l'erogazione delle prestazioni di servizio di assistenza domiciliare. Alla data del 10/02/2026 sono stati attivati e conclusi n. 119 pacchetti di assistenza domiciliare.

-1.1.4. SUPERVISIONE. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali. Avviato a partire da dicembre 2023 il percorso per la supervisione mono professionale di gruppo e individuale rivolto agli assistenti sociali e volto alla prevenzione del burn out. Nell'anno 2024 e 2025 è stato raggiunto e superato il livello essenziale della prestazione di cui al Piano nazionale degli

interventi e dei servizi sociali a mezzo della realizzazione al 31.01.2026 di n. 325 ore di supervisione di gruppo A.1. e 298 ore di supervisione individuale a.2. Si aggiungono 300 ore realizzate per la supervisione A3 di equipe che ha coinvolto anche il personale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

1.2 DISABILITA', Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Con Determinazione dirigenziale n. 4980 del 25/06/25 è stato approvato, e pubblicato in data 30/06/2025, l'avviso rivolto ai soggetti del Terzo Settore che ha dato avvio alla coprogettazione ai sensi del codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 per la realizzazione di un progetto volto all'autonomia lavorativa e abitativa di n. 12 persone disabili. A seguito dei tavoli di coprogettazione e della valutazione della proposta progettuale da parte della Commissione sono in corso di adozione gli atti di approvazione del progetto aggiornato.

-1.2 DISABILITA', Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Soggetto Sub Attuatore Azienda USL Toscana Nord Ovest. In data 14/11/2024 è stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile di via Piave n. 20 a Livorno di n2 appartamenti da 6 persone l'uno destinati all'autonomia di persone disabili. In data 09/12/2024 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori. I lavori di ristrutturazione della palazzina sono stati praticamente ultimati e sono stati consegnati e montati gli arredi. Prossimamente verrà effettuata l'inaugurazione ufficiale.

1.3.1. Housing First. Avviata la coprogettazione in linea con il cronoprogramma. Raggiunti n.15 beneficiari, individuati in persone in situazioni di grave marginalità sociale, presso le strutture ponte. L'obiettivo target di Progetto PNRR, che consiste nel dare accesso ad uno spazio abitativo per n.15 beneficiari per un periodo di almeno 6 mesi, è stato raggiunto.

-1.3.2. Stazioni di Posta. Avviata la coprogettazione in linea con il cronoprogramma. Campagna di sensibilizzazione dei servizi oggetto del progetto anche a mezzo di social, comunicati stampa e volantinaggio. Formalmente individuati 82 beneficiari, individuati in persone in situazioni di grave marginalità sociale, che avranno accesso ad almeno un servizio offerto dalla stazione di posta.

Alla data del 31/12/2025:

- in data 11 giugno 2025 si è riunita la Cabina di Regia tecnico – politica, in cui è stato illustrato lo stato di attuazione degli interventi PNRR e sono state evidenziate le criticità.
- durante l'esercizio finanziario 2025, si sono svolti n. 11 tavoli tecnici del Gruppo di Lavoro "Staff Programmi e Progetti speciali legati al PNRR", dove sono stati puntualmente analizzati lo stato di attuazione degli interventi e le principali problematiche emerse.
- sono state inoltre approvate n. 3 variazioni al DUP e n. 5 variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 per adeguare gli stanziamenti di bilancio ai fini della corretta contabilizzazione degli stessi.
- **Convocazione Cabina di Regia politico-tecnica**
In data 22/12/2025 è stata convocata la Cabina di Regia politico-tecnica, al fine di discutere dello stato di attuazione dei progetti PNRR, in considerazione delle stringenti tempistiche di ultimazione previste, rispetto alle quali non è attualmente contemplata alcuna proroga. La Cabina è stata aggiornata sia sugli aspetti contabili, che sugli sviluppi progettuali e più strettamente tecnici di ogni intervento PNRR, con specifico focus su quelli in capo al Settore "Lavori pubblici e opere PNRR.
